




**Műszaki és tervezési ütemterv**

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1
1	<b>ÉKMO2 Projekt várható ütemezése</b>	1096 nap	Sze 17.12.06.	Szo 20.12.05.	<b>1096 nap</b>															
2	<b>ÉKMO2 projekt lebonyolítás ütemezése</b>		<b>K 17.12.12.</b>	<b>Szo 20.12.05.</b>	<b>31%</b>															
3	<b>Munkaterület átadás tervezési munkákra</b>	1 nap	K 17.12.12.	K 17.12.12.	<b>1 nap</b>															
4	<b>Tervezési munkák</b>	<b>313 nap</b>	<b>Sze 17.12.13.</b>	<b>Cs 19.03.07.</b>	<b>83%</b>															
5	<b>Hálózat</b>	<b>283 nap</b>	<b>Sze 17.12.13.</b>	<b>Cs 19.01.24.</b>	<b>98%</b>															
6	Jánd	67 nap	K 18.01.23.	Sze 18.05.02.	<b>67 nap</b>															
7	Aranyosapáti	79 nap	Sze 18.01.17.	H 18.05.14.	<b>79 nap</b>															
8	Mándok	240 nap	H 18.02.12.	Cs 19.01.24.	<b>240 nap</b>															
9	Gávavencsellő	165 nap	Sze 17.12.13.	Sze 18.08.08.	<b>165 nap</b>															
10	Tiszatelek	220 nap	Sze 17.12.13.	P 18.10.26.	<b>220 nap</b>															
11	Beszterec	187 nap	Sze 17.12.13.	H 18.09.10.	<b>187 nap</b>															
12	Újdombrád	181 nap	Sze 17.12.13.	P 18.08.31.	<b>181 nap</b>															
13	<b>Telep</b>	<b>284 nap</b>	<b>K 18.01.23.</b>	<b>Cs 19.03.07.</b>	<b>67%</b>															
14	Cigánd	170 nap	K 18.07.10.	Cs 19.03.07.	<b>170 nap</b>															
15	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	188 nap	Cs 18.03.08.	P 18.12.07.	<b>188 nap</b>															
16	Aranyosapáti	225 nap	P 18.01.26.	Sze 18.12.19.	<b>225 nap</b>															
17	Mándok	101 nap	K 18.05.29.	H 18.10.29.	<b>101 nap</b>															
18	Gávavencsellő	185 nap	Sze 18.01.31.	H 18.10.29.	<b>185 nap</b>															
19	Tiszatelek	270 nap	K 18.01.23.	P 19.02.15.	<b>270 nap</b>															
20	<b>Kiviteli tervek jóváhagyása</b>	<b>223 nap</b>	<b>Sze 18.05.09.</b>	<b>Cs 19.03.21.</b>	<b>40%</b>															
21	<b>Hálózat</b>	<b>203 nap</b>	<b>Sze 18.05.09.</b>	<b>Cs 19.02.21.</b>	<b>53%</b>															
22	Jánd	3 nap	Sze 18.05.09.	P 18.05.11.	<b>3 nap</b>															
23	Aranyosapáti	4 nap	K 18.05.15.	P 18.05.18.	<b>4 nap</b>															
24	Mándok	10 nap	P 19.02.08.	Cs 19.02.21.	<b>10 nap</b>															
25	Gávavencsellő	1 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.	<b>1 nap</b>															
26	Tiszatelek	10 nap	H 18.10.29.	H 18.11.12.	<b>10 nap</b>															
27	Beszterec	10 nap	K 18.09.11.	P 18.09.21.	<b>10 nap</b>															
28	Újdombrád	10 nap	H 18.09.03.	P 18.09.14.	<b>10 nap</b>															
29	<b>Telep</b>	<b>110 nap</b>	<b>K 18.10.16.</b>	<b>Cs 19.03.21.</b>	<b>29%</b>															
30	Cigánd	10 nap	P 19.03.08.	Cs 19.03.21.	<b>10 nap</b>															
31	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	10 nap	H 18.12.17.	P 18.12.28.	<b>10 nap</b>															
32	Aranyosapáti	10 nap	Cs 18.12.20.	Sze 19.01.02.	<b>10 nap</b>															
33	Mándok	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.	<b>8 nap</b>															
34	Gávavencsellő	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.	<b>8 nap</b>															
35	Tiszatelek	10 nap	H 19.02.18.	P 19.03.01.	<b>10 nap</b>															
36	<b>Munkaterület átadása</b>	<b>259 nap</b>	<b>Sze 18.03.14.</b>	<b>P 19.03.22.</b>	<b>77%</b>															
37	<b>Hálózat</b>	<b>210 nap</b>	<b>Sze 18.03.14.</b>	<b>H 19.01.14.</b>	<b>100%</b>															
38	Jánd	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.	<b>1 nap</b>															
39	Aranyosapáti	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.	<b>1 nap</b>															
40	Mándok	1 nap	H 19.01.14.	H 19.01.14.	<b>1 nap</b>															



**Műszaki és tervezési ütemterv**


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1
41	Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.06.07.	Cs 18.06.07.																
42	Tiszatelek	1 nap	K 18.10.16.	K 18.10.16.																
43	Beszterec	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.																
44	Újdombrád	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.																
45	<b>Telep</b>	<b>154 nap</b>	<b>Cs 18.08.16.</b>	<b>P 19.03.22.</b>																
46	Cigánd	1 nap	P 19.03.22.	P 19.03.22.																
47	Vásárosnamény-Gergelyugornya	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.																
48	Aranyosapáti	1 nap	Cs 19.01.03.	Cs 19.01.03.																
49	Mándok	1 nap	P 18.10.26.	P 18.10.26.																
50	Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.08.16.	Cs 18.08.16.																
51	Tiszatelek	1 nap	H 18.11.19.	H 18.11.19.																
52	<b>Kivitelezési munkák elkezdése</b>	<b>631 nap</b>	<b>P 18.05.25.</b>	<b>Sze 20.10.28.</b>																
53	<b>Jánd - Vásárosnamény</b>	<b>602 nap</b>	<b>H 18.06.04.</b>	<b>P 20.09.25.</b>																
54	<b>Hálózat helyreállítással</b>	<b>255 nap</b>	<b>H 18.06.04.</b>	<b>Sze 19.05.29.</b>																
55	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>194 nap</b>	<b>H 18.06.04.</b>	<b>K 19.03.05.</b>																
56	1-0-0 - Petőfi, Árpád u.	47 nap	H 18.06.04.	K 18.08.07.																
57	1-1-0 - Árpád, Rákóczi u.	30 nap	P 18.08.10.	Cs 18.09.20.																
58	1-1-1 - Rákóczi u.	3 nap	K 18.09.11.	Cs 18.09.13.																
59	1-2-0 - Ady Endre u.	3 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.																
60	2-0-0 - Kossuth, Szabadság, Arany u.	56 nap	K 18.07.10.	K 18.09.25.																
61	2-1-0 - Jókai u.	7 nap	H 18.11.12.	K 18.11.20.																
62	2-2-0 - Jókai, Béke u.	19 nap	K 18.11.13.	P 18.12.07.																
63	2-2-1 - Dózsa, Béke	59 nap	H 18.12.10.	Cs 19.02.28.																
64	2-2-1-1 - Béke u.	7 nap	P 18.11.30.	H 18.12.10.																
65	2-2-2 - Jókai u	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.																
66	2-3-0 - 289 hrsz u.	24 nap	Sze 18.10.03.	P 18.11.09.																
67	2-4-0 - Kossuth u.	17 nap	H 18.07.09.	K 18.07.31.																
68	2-5-0 - Arany J u.	4 nap	K 18.09.04.	P 18.09.07.																
69	2-6-0 - Arany, Jókai u.	7 nap	P 18.08.24.	H 18.09.03.																
70	3-0-0 - Rákóczi, Tisza, Hunyadi u.	105 nap	K 18.10.02.	P 19.03.01.																
71	3-1-0 - Rákóczi u.	9 nap	P 18.10.26.	P 18.11.09.																
72	3-2-0 - Rákóczi u.	6 nap	Cs 18.10.04.	Cs 18.10.11.																
73	3-3-0 - Bajcsi Zs.u.	10 nap	Sze 19.02.06.	K 19.02.19.																
74	3-4-0 - Tisza u.	10 nap	Sze 19.02.20.	K 19.03.05.																
75	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>183,6 nap</b>	<b>K 18.06.05.</b>	<b>Sze 19.02.20.</b>																
76	NY-1 - Arpád, Petőfi u., külterület.	100 nap	K 18.06.05.	Sze 18.10.24.																
77	NY-2 - Jókai u.	7 nap	Cs 18.10.04.	P 18.10.12.																
78	NY-3 - Rákóczi u.	26 nap	H 18.10.01.	Sze 19.02.20.																
79	<b>Átemelő</b>	<b>64 nap</b>	<b>P 19.03.01.</b>	<b>Sze 19.05.29.</b>																
80	<b>Á-1</b>	<b>44 nap</b>	<b>P 19.03.01.</b>	<b>Sze 19.05.01.</b>																

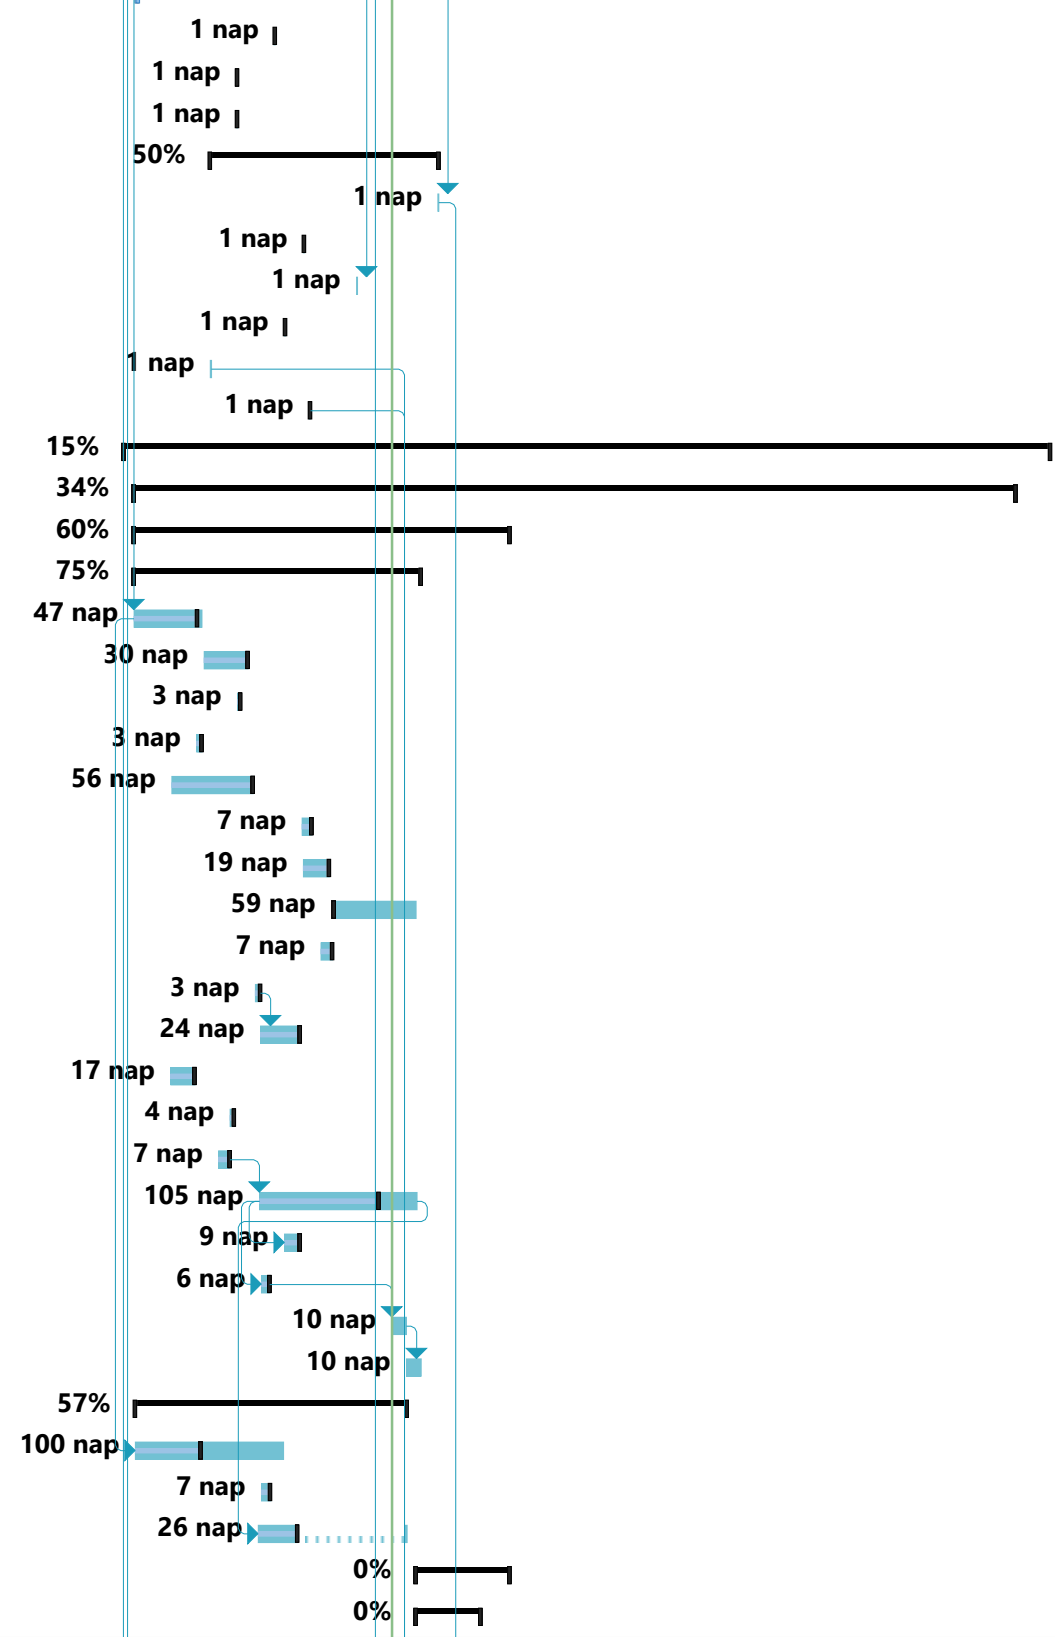



**Műszaki és tervezési ütemterv**


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1				
81	Építészeti munkák	14 nap	P 19.03.01.	Sze 19.03.20.																
82	Gépészeti munkák	10 nap	Cs 19.03.21.	Sze 19.04.03.																
83	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	Cs 19.04.18.	Sze 19.05.01.																
84	<b>Á-2</b>	<b>54 nap</b>	<b>P 19.03.01.</b>	<b>Sze 19.05.15.</b>																
85	Építészeti munkák	14 nap	P 19.03.01.	Sze 19.03.20.																
86	Gépészeti munkák	10 nap	Cs 19.04.04.	Sze 19.04.17.																
87	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.15.																
88	<b>Á-3</b>	<b>64 nap</b>	<b>P 19.03.01.</b>	<b>Sze 19.05.29.</b>																
89	Építészeti munkák	14 nap	P 19.03.01.	Sze 19.03.20.																
90	Gépészeti munkák	10 nap	Cs 19.03.21.	Sze 19.04.03.																
91	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	Cs 19.05.16.	Sze 19.05.29.																
92	<b>Telep</b>	<b>440 nap</b>	<b>H 19.01.21.</b>	<b>P 20.09.25.</b>																
93	Kivitelezési munkák	290 nap	H 19.01.21.	P 20.02.28.																
94	Bontás	30 nap	H 20.08.17.	P 20.09.25.																
95	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.02.29.	Sze 20.08.26.																
96	<b>Aranyosapáti</b>	<b>625 nap</b>	<b>P 18.05.25.</b>	<b>K 20.10.20.</b>																
97	<b>Hálózat helyreállítással</b>	<b>520 nap</b>	<b>P 18.05.25.</b>	<b>K 20.05.26.</b>																
98	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>520 nap</b>	<b>P 18.05.25.</b>	<b>K 20.05.26.</b>																
99	1-0-0 - Kossuth u.	80 nap	H 18.06.18.	P 18.10.05.																
100	1-1-0 - Kossuth u.	40 nap	H 19.02.11.	P 19.04.05.																
101	1-1-1 - Kossuth u.	30 nap	H 19.04.08.	P 19.05.17.																
102	1-2-0 - Bocskai u.	54 nap	H 18.06.18.	P 18.08.31.																
103	2-0-0 - Esze Tamás	107 nap	H 18.09.17.	P 19.02.15.																
104	2-1-0 - Vasút u.	40 nap	H 19.04.15.	P 19.06.07.																
105	2-1-1 - Vasút u.	30 nap	H 19.06.10.	P 19.07.19.																
106	2-1-2 - Bercsényi u.	30 nap	H 19.07.22.	P 19.08.30.																
107	2-1-3 - Hunyadi u.	30 nap	H 19.09.02.	P 19.10.11.																
108	2-1-3-1 - Vasút u.	30 nap	H 19.10.14.	P 19.11.22.																
109	2-2-0 - Kossuth u.	30 nap	H 19.11.25.	P 20.01.03.																
110	2-3-0 - Petőfi u.	30 nap	Sze 20.01.22.	K 20.03.03.																
111	2-3-1 - Petőfi u.	30 nap	Sze 20.03.04.	K 20.04.14.																
112	2-4-0 - Bajcsi Zs.	30 nap	Sze 20.04.15.	K 20.05.26.																
113	3-0-0 - Honvéd u.	170 nap	P 18.05.25.	K 19.01.22.																
114	3-1-0 - Béke u.	20 nap	Cs 18.06.07.	Sze 18.07.04.																
115	3-2-0 - Lenin u.	30 nap	H 19.02.11.	P 19.03.22.																
116	4-0-0 - Petőfi u., József A.	27 nap	K 18.10.09.	K 18.11.20.																
117	4-1-0 - József A.u.	50 nap	Sze 19.01.30.	K 19.04.09.																
118	4-2-0 - József, Arany u.	70 nap	H 18.09.03.	Sze 18.12.12.																
119	4-2-1 - Arany J. u.	4 nap	Cs 18.06.21.	K 18.06.26.																
120	4-2-2 - Kölcsey u.	4 nap	H 18.09.17.	Cs 18.09.20.																

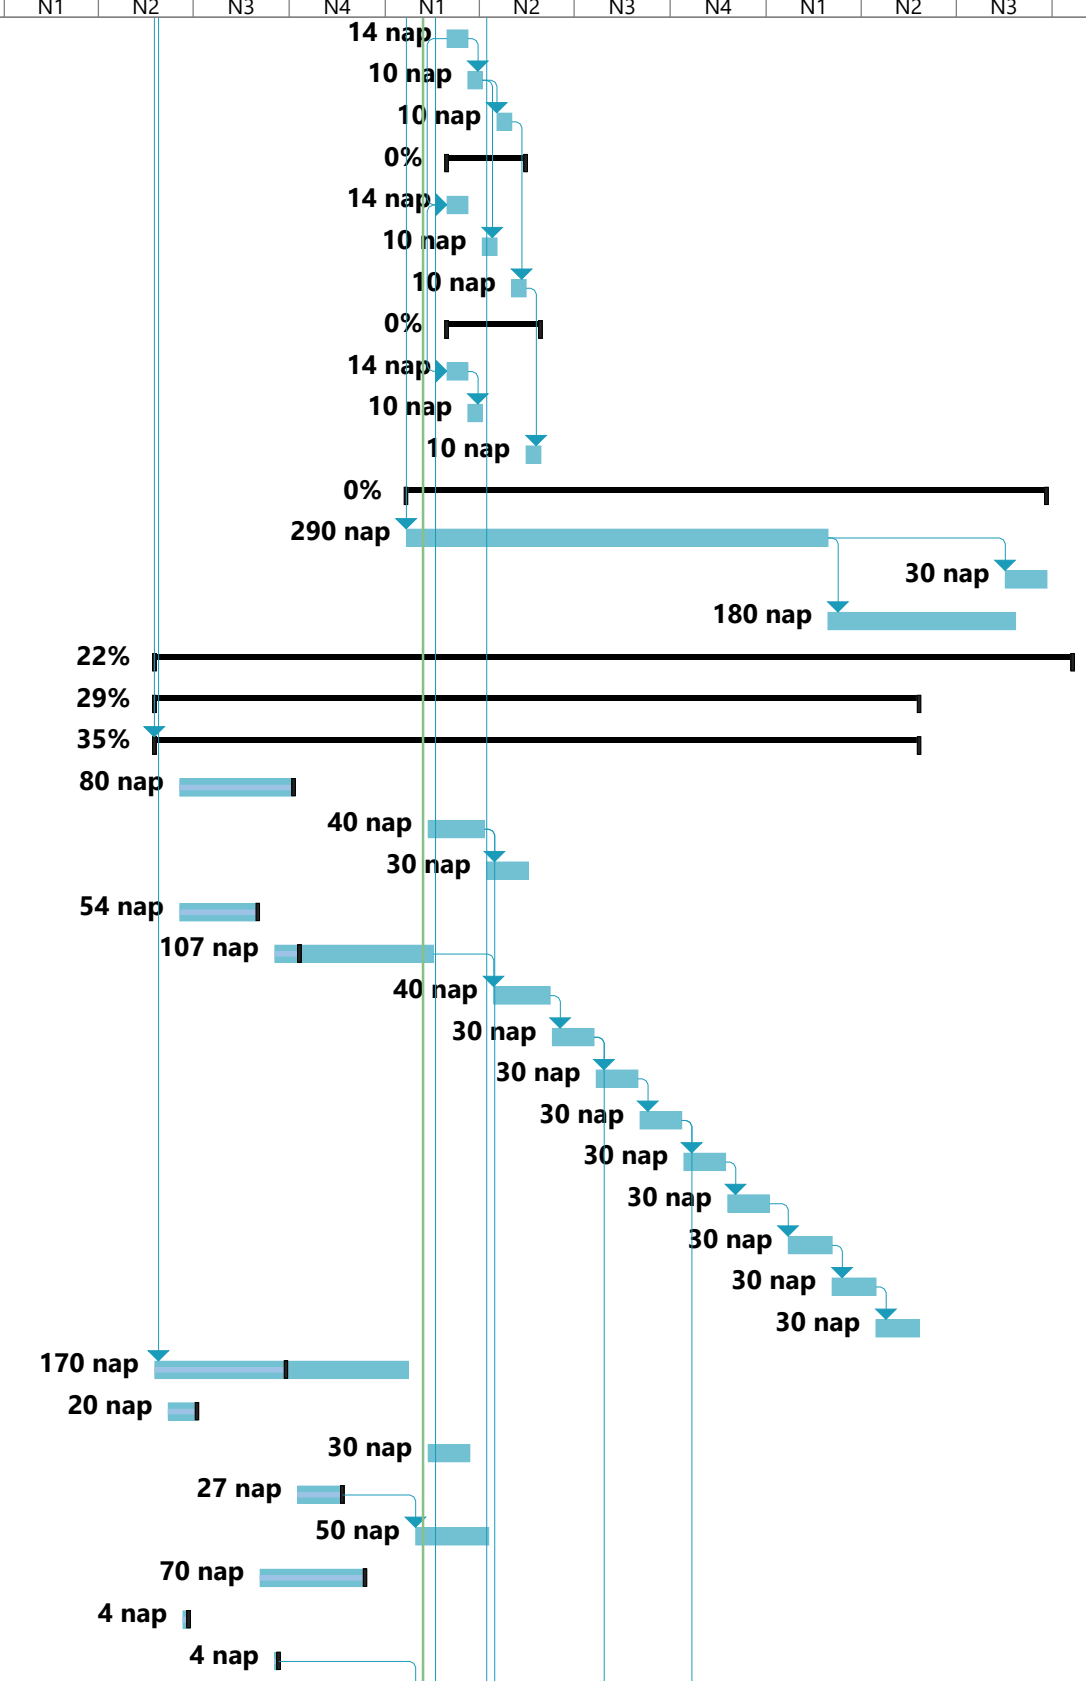



**Műszaki és tervezési ütemterv**


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdet	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1				
121	4-3-0 - Temető u.	30 nap	Sze 19.01.30.	K 19.03.12.																
122	4-4-0 - Táncsics	30 nap	Sze 19.03.13.	K 19.04.23.																
123	4-5-0 - Jókai u.	30 nap	Sze 19.04.24.	K 19.06.04.																
124	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>281 nap</b>	<b>K 18.10.09.</b>	<b>P 19.11.08.</b>																
125	NY-1 - Kossuth u.	20 nap	H 19.04.08.	P 19.05.03.																
126	NY-2 - Vasút u.	20 nap	H 19.07.22.	P 19.08.16.																
127	NY-3 - Vasút u.	20 nap	H 19.10.14.	P 19.11.08.																
128	NY-4 - József A. u.	45 nap	K 18.10.09.	Cs 18.12.13.																
129	<b>Átemelő</b>	<b>85 nap</b>	<b>P 19.03.01.</b>	<b>Cs 19.06.27.</b>																
130	<b>Á-1</b>	<b>60 nap</b>	<b>P 19.03.01.</b>	<b>Cs 19.05.23.</b>																
131	Építészeti munkák	20 nap	P 19.03.01.	Cs 19.03.28.																
132	Gépészeti munkák	20 nap	P 19.03.29.	Cs 19.04.25.																
133	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 19.04.26.	Cs 19.05.23.																
134	<b>Á-2</b>	<b>60 nap</b>	<b>P 19.03.08.</b>	<b>Cs 19.05.30.</b>																
135	Építészeti munkák	20 nap	P 19.03.08.	Cs 19.04.04.																
136	Gépészeti munkák	20 nap	P 19.04.05.	Cs 19.05.02.																
137	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 19.05.03.	Cs 19.05.30.																
138	<b>Á-3</b>	<b>60 nap</b>	<b>P 19.04.05.</b>	<b>Cs 19.06.27.</b>																
139	Építészeti munkák	20 nap	P 19.04.05.	Cs 19.05.02.																
140	Gépészeti munkák	20 nap	P 19.05.03.	Cs 19.05.30.																
141	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 19.05.31.	Cs 19.06.27.																
142	<b>Á-4</b>	<b>60 nap</b>	<b>P 19.03.15.</b>	<b>Cs 19.06.06.</b>																
143	Építészeti munkák	20 nap	P 19.03.15.	Cs 19.04.11.																
144	Gépészeti munkák	20 nap	P 19.04.12.	Cs 19.05.09.																
145	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 19.05.10.	Cs 19.06.06.																
146	<b>Telep</b>	<b>448 nap</b>	<b>P 19.02.01.</b>	<b>K 20.10.20.</b>																
147	Kivitelezési munkák	320 nap	P 19.02.01.	Cs 20.04.23.																
148	Próbaüzem	180 nap	P 20.04.24.	K 20.10.20.																
149	<b>Mándok</b>	<b>434 nap</b>	<b>H 19.01.14.</b>	<b>Cs 20.09.10.</b>																
150	Hálózat helyreállítással	400 nap	P 19.03.01.	Cs 20.09.10.																
151	<b>Telep</b>	<b>108 nap</b>	<b>H 19.01.14.</b>	<b>Sze 19.06.12.</b>																
152	Kivitelezési munkák	150 nap	H 19.01.14.	Sze 19.06.12.																
153	<b>Gávavencsellő</b>	<b>605 nap</b>	<b>H 18.07.02.</b>	<b>Sze 20.10.28.</b>																
154	Hálózat helyreállítással	458 nap	H 18.07.02.	H 20.04.06.																
155	<b>I. ütem</b>	<b>123 nap</b>	<b>H 18.07.02.</b>	<b>H 18.12.24.</b>																
156	M-1-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	Cs 18.07.12.	H 18.07.30.																
157	M-1-1-0 Kolozsvári u.	4 nap	Cs 18.07.19.	K 18.07.24.																
158	M-2-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	K 18.07.24.	Cs 18.08.09.																
159	M-2-1-0 Árpád u.	6 nap	Sze 18.08.01.	Sze 18.08.08.																

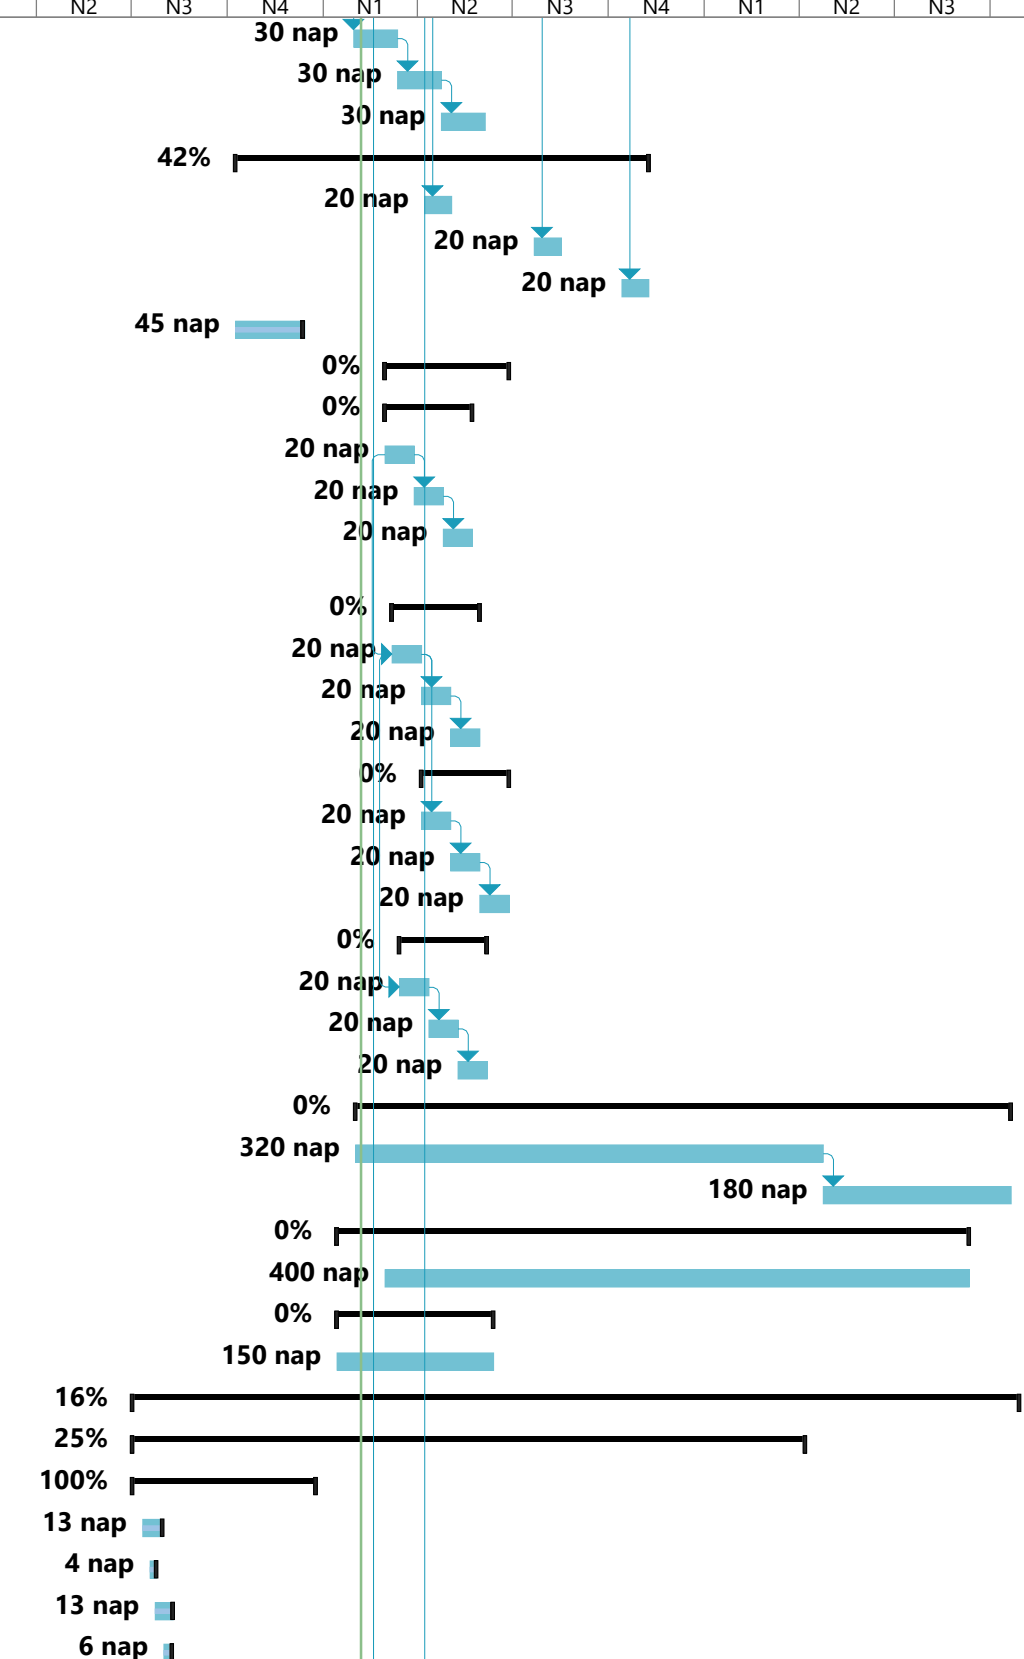



**Műszaki és tervezési ütemterv**


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021		
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1			
160	M-3-0-0 Vasút u.	10 nap	Cs 18.08.09.	Cs 18.08.23.															
161	M-5-0-0 Temető u.	17 nap	Cs 18.08.30.	P 18.09.21.															
162	M-5-1-0 Rakevszki u.	9 nap	P 18.08.31.	Sze 18.09.12.															
163	M-6-0-0 Bem József, Kossuth Lajos u.	21 nap	H 18.10.01.	Sze 18.10.31.															
164	M-6-1-0 Lehel u.	15 nap	K 18.10.02.	Sze 18.10.24.															
165	M-8-0-0 József Attila, Kossuth Lajos u.	25 nap	Cs 18.11.15.	Sze 18.12.19.															
166	M-8-1-0 Kossuth Lajos u.	3 nap	Cs 18.12.20.	H 18.12.24.															
167	M-9-0-0 Vörösmarty Mihály u.	12 nap	K 18.07.03.	Sze 18.07.18.															
168	M-9-1-0 Gorkij u.	18 nap	P 18.07.06.	K 18.07.31.															
169	M-10-0-0 Jókai Mór, Akácfa u.	12 nap	H 18.07.02.	K 18.07.17.															
170	M-10-1-0 Jókai Mór u.	2 nap	Cs 18.07.05.	P 18.07.06.															
171	M-11-0-0 Uzsoki u.	13 nap	Cs 18.08.09.	K 18.08.28.															
172	M-12-0-0 Rakevszki u., Kis köz	16 nap	Cs 18.08.23.	Cs 18.09.13.															
173	M-12-1-0 Rakevszki u.	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.															
174	<b>II. ütem</b>	<b>301 nap</b>	<b>H 19.02.11.</b>	<b>H 20.04.06.</b>															
175	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>254 nap</b>	<b>H 19.02.11.</b>	<b>Cs 20.01.30.</b>															
176	1-0-0 Vasvári Pál u.	5 nap	Sze 19.10.23.	K 19.10.29.															
177	1-0-0 Halász u.	3 nap	Sze 19.10.30.	P 19.11.01.															
178	1-1-0 Vasvári Pál u.	8 nap	H 19.11.04.	Sze 19.11.13.															
179	1-1-0 Toldi Miklós u.	13 nap	Cs 19.11.14.	H 19.12.02.															
180	1-1-1 Toldi Miklós u.	5 nap	K 19.12.03.	H 19.12.09.															
181	1-1-2 Arany János u.	5 nap	K 19.12.10.	H 19.12.16.															
182	1-2-0 Halász u.	7 nap	K 19.12.17.	Sze 19.12.25.															
183	2-0-0 Rákóczi Ferenc u.	4 nap	Cs 19.12.26.	K 19.12.31.															
184	2-0-0 Arany János u.	8 nap	Sze 20.01.01.	P 20.01.10.															
185	2-1-0 Rákóczi Ferenc u.	3 nap	H 20.01.13.	Sze 20.01.15.															
186	3-0-0 Fertő u.	10 nap	Sze 19.06.19.	K 19.07.02.															
187	3-1-0 Fertő u.	3 nap	Sze 19.07.03.	P 19.07.05.															
188	3-1-0 Kossuth u.	5 nap	Sze 19.07.03.	K 19.07.09.															
189	4-0-0 Kossuth u.	6 nap	H 19.05.13.	H 19.05.20.															
190	4-1-0 Kossuth u.	6 nap	K 19.05.21.	K 19.05.28.															
191	M-4-0-0 Báthori u.	1 nap	Sze 20.01.01.	Sze 20.01.01.															
192	M-4-0-0 Arany János u.	18 nap	Cs 20.01.02.	H 20.01.27.															
193	M-4-1-0 Báthory u.	3 nap	K 20.01.28.	Cs 20.01.30.															
194	5-0-0 Bem József u.	14 nap	Cs 19.04.11.	K 19.04.30.															
195	5-1-0 Bem József u.	8 nap	Sze 19.05.01.	P 19.05.10.															
196	6-0-0 Major u.	3 nap	H 19.02.11.	Sze 19.02.13.															
197	6-0-0 Lehel u.	15 nap	Cs 19.02.14.	Sze 19.03.06.															
198	6-1-0 Major u.	4 nap	Cs 19.03.07.	K 19.03.12.															
199	6-1-0 Ady Endre u.	21 nap	Sze 19.03.13.	Sze 19.04.10.															

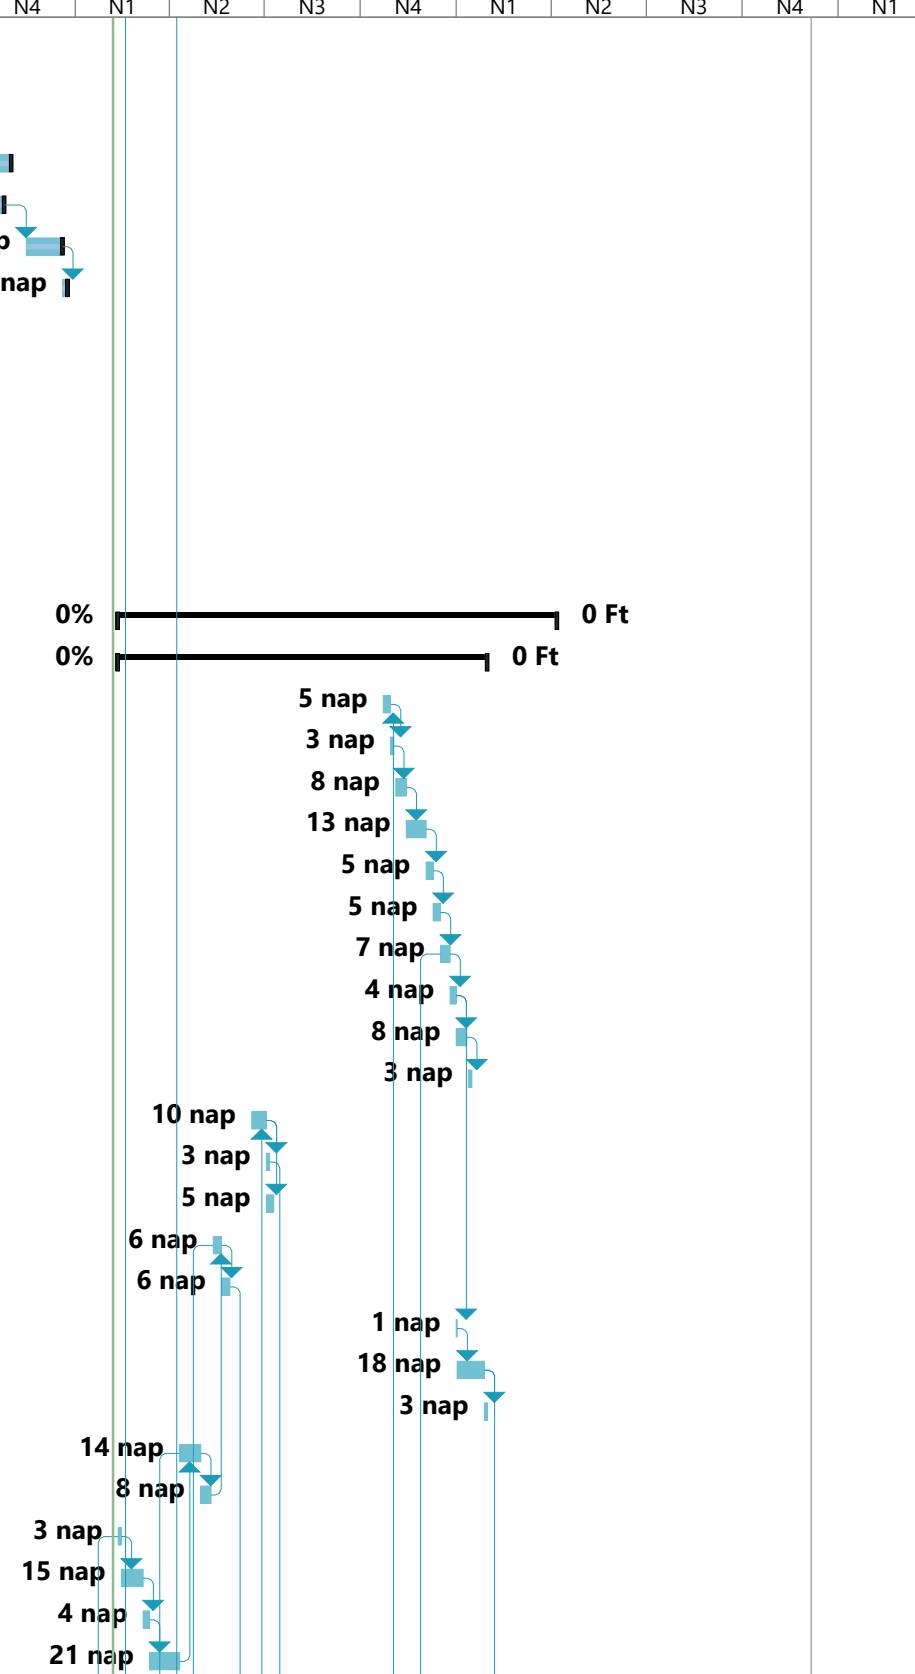



**Műszaki és tervezési ütemterv**


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1				
200	7-0-0 Tisza u.	4 nap	H 19.07.15.	Cs 19.07.18.																
201	7-1-0 Tisza u.	3 nap	Sze 19.07.10.	P 19.07.12.																
202	M-7/a-0-0 Petőfi Sándor u.	2 nap	H 19.07.08.	K 19.07.09.																
203	8-0-0 Tisza u.	16 nap	P 19.08.02.	P 19.08.23.																
204	8-1-0 Tisza u.	10 nap	P 19.07.19.	Cs 19.08.01.																
205	8-2-0 Kovács Mihály u.	8 nap	P 19.08.02.	K 19.08.13.																
206	9-0-0 Báthori u.	8 nap	P 19.10.11.	K 19.10.22.																
207	9-0-0 Honvéd u.	6 nap	Cs 19.10.03.	Cs 19.10.10.																
208	9-1-0 Báthori u.	4 nap	P 19.09.27.	Sze 19.10.02.																
209	10-0-0 Báthori u.	14 nap	H 19.09.02.	Cs 19.09.19.																
210	10-1-0 Báthori u.	5 nap	P 19.09.20.	Cs 19.09.26.																
211	11-0-0 Lónyai u.	5 nap	H 19.08.26.	P 19.08.30.																
212	11-1-0 Lónyai u.	0 nap	P 19.08.30.	P 19.08.30.																
213	12-0-0 Móricz Zsigmond u.	9 nap	Cs 19.06.06.	K 19.06.18.																
214	13-0-0 Rakovszki u.	6 nap	Sze 19.05.29.	Sze 19.06.05.																
215	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>301 nap</b>	<b>H 19.02.11.</b>	<b>H 20.04.06.</b>																
216	NY-1	15 nap	P 19.10.11.	Cs 19.10.31.																
217	NY-2	6 nap	K 19.12.17.	K 19.12.24.																
218	NY-3	15 nap	Cs 19.06.06.	Sze 19.06.26.																
219	NY-4	4 nap	H 19.05.13.	Cs 19.05.16.																
220	NY-5	10 nap	Cs 19.04.11.	Sze 19.04.24.																
221	NY-6	12 nap	H 19.02.11.	K 19.02.26.																
222	NY-7	7 nap	Sze 19.07.10.	Cs 19.07.18.																
223	NY-8	12 nap	P 19.08.02.	H 19.08.19.																
224	NY-9	4 nap	P 19.09.27.	Sze 19.10.02.																
225	NY-10	8 nap	H 19.09.02.	Sze 19.09.11.																
226	NY-11	5 nap	H 19.09.02.	P 19.09.06.																
227	NY-12	10 nap	Cs 19.06.06.	Sze 19.06.19.																
228	NY-13	5 nap	Sze 19.05.29.	K 19.06.04.																
229	NYG-1	50 nap	K 20.01.28.	H 20.04.06.																
230	<b>Átemelők</b>	210 nap	H 19.04.08.	P 20.01.24.																
231	<b>Telep</b>	<b>443 nap</b>	<b>H 19.02.18.</b>	<b>Sze 20.10.28.</b>																
232	Kivitelezési munkák	315 nap	H 19.02.18.	P 20.05.01.																
233	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.05.02.	Sze 20.10.28.																
234	<b>Tiszatelek-Beszterec-Újdombrád</b>	<b>514 nap</b>	<b>P 18.11.02.</b>	<b>Sze 20.10.21.</b>																
235	<u>Tiszatelek - Hálózat helyreállítással</u>	420 nap	P 19.03.01.	Cs 20.10.08.																
236	<b>Beszterec - Hálózat helyreállítással</b>	<b>317 nap</b>	<b>K 18.11.20.</b>	<b>Sze 20.02.05.</b>																
237	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>257 nap</b>	<b>K 18.11.20.</b>	<b>Sze 19.11.13.</b>																
238	1-0-0 Kossuth u.	24 nap	Cs 19.05.16.	K 19.06.18.																
239	1-1-0 Árpád u.	30 nap	Sze 19.06.19.	K 19.07.30.																

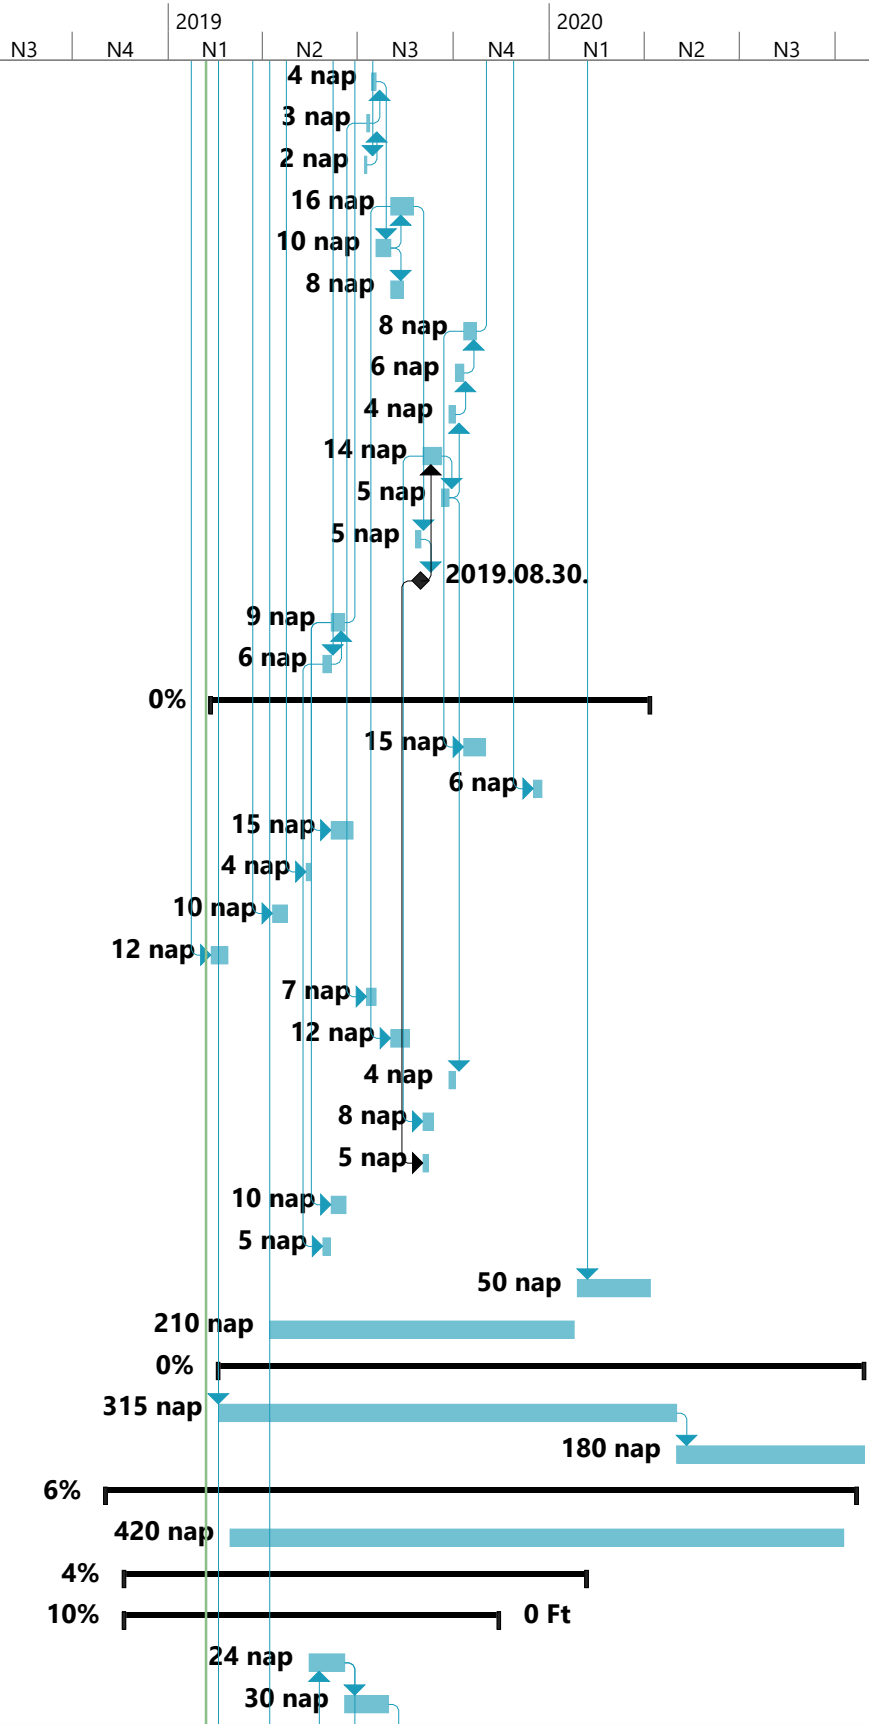



**Műszaki és tervezési ütemterv**

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1				
240	1-2-0 Arany J.u	31 nap	Sze 19.07.31.	Sze 19.09.11.																
241	1-3-0 Kossuth u.	3 nap	Cs 19.09.12.	H 19.09.16.																
242	2-0-0 Petőfi S.	42 nap	K 19.09.17.	Sze 19.11.13.																
243	2-1-0 József A.u	40 nap	K 18.11.20.	H 19.01.14.																
244	2-1-1 Dózsa Gy.u	22 nap	K 18.11.20.	Sze 18.12.19.																
245	2-1-1-1 Új u.	5 nap	P 18.11.30.	Cs 18.12.06.																
246	2-2-0 Petőfi S. u	27 nap	P 19.01.18.	H 19.02.25.																
247	2-3-0 910 hrsz	3 nap	K 19.02.26.	Cs 19.02.28.																
248	2-4-0 Petőfi S.u	2 nap	P 19.03.01.	H 19.03.04.																
249	2-4-0 366 hrsz	4 nap	K 19.03.05.	P 19.03.08.																
250	3-0-0 Táncsics M. u.	14 nap	H 19.03.11.	Cs 19.03.28.																
251	3-1-0 Széchenyi u.	8 nap	P 19.03.29.	K 19.04.09.																
252	4-0-0 Kossuth u.	18 nap	Sze 19.04.10.	P 19.05.03.																
253	4-1-0 Kossuth u.	8 nap	H 19.05.06.	Sze 19.05.15.																
254	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>224 nap</b>	<b>P 19.03.29.</b>	<b>Sze 20.02.05.</b>																
255	<b>NY-1</b>	60 nap	Sze 19.06.19.	K 19.09.10.																
256	<b>NY-2</b>	60 nap	Cs 19.11.14.	Sze 20.02.05.																
257	<b>NY-3</b>	60 nap	P 19.03.29.	Cs 19.06.20.																
258	<b>NY-4</b>	60 nap	Sze 19.04.10.	K 19.07.02.																
259	<b>Átemelő aknák</b>	<b>120 nap</b>	<b>H 19.03.11.</b>	<b>P 19.08.23.</b>																
260	<b>Á-1</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 19.03.11.</b>	<b>P 19.05.31.</b>																
261	Építészeti munkák	20 nap	H 19.03.11.	P 19.04.05.																
262	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.04.08.	P 19.05.03.																
263	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.05.06.	P 19.05.31.																
264	<b>Á-2</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 19.04.08.</b>	<b>P 19.06.28.</b>																
265	Építészeti munkák	20 nap	H 19.04.08.	P 19.05.03.																
266	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.05.06.	P 19.05.31.																
267	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.06.03.	P 19.06.28.																
268	<b>Á-3</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 19.05.06.</b>	<b>P 19.07.26.</b>																
269	Építészeti munkák	20 nap	H 19.05.06.	P 19.05.31.																
270	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.06.03.	P 19.06.28.																
271	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.07.01.	P 19.07.26.																
272	<b>Á-4</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>P 19.08.23.</b>																
273	Építészeti munkák	20 nap	H 19.06.03.	P 19.06.28.																
274	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.07.01.	P 19.07.26.																
275	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.07.29.	P 19.08.23.																
276	<b>Újdombrád - Hálózat helyreállítással</b>	<b>205 nap</b>	<b>P 18.11.02.</b>	<b>Cs 19.08.15.</b>																
277	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>205 nap</b>	<b>P 18.11.02.</b>	<b>Cs 19.08.15.</b>																
278	1-0-0 József A.u	60 nap	H 18.11.26.	P 19.02.15.																
279	1-0-0 Fő u.	6 nap	H 19.02.18.	H 19.02.25.																

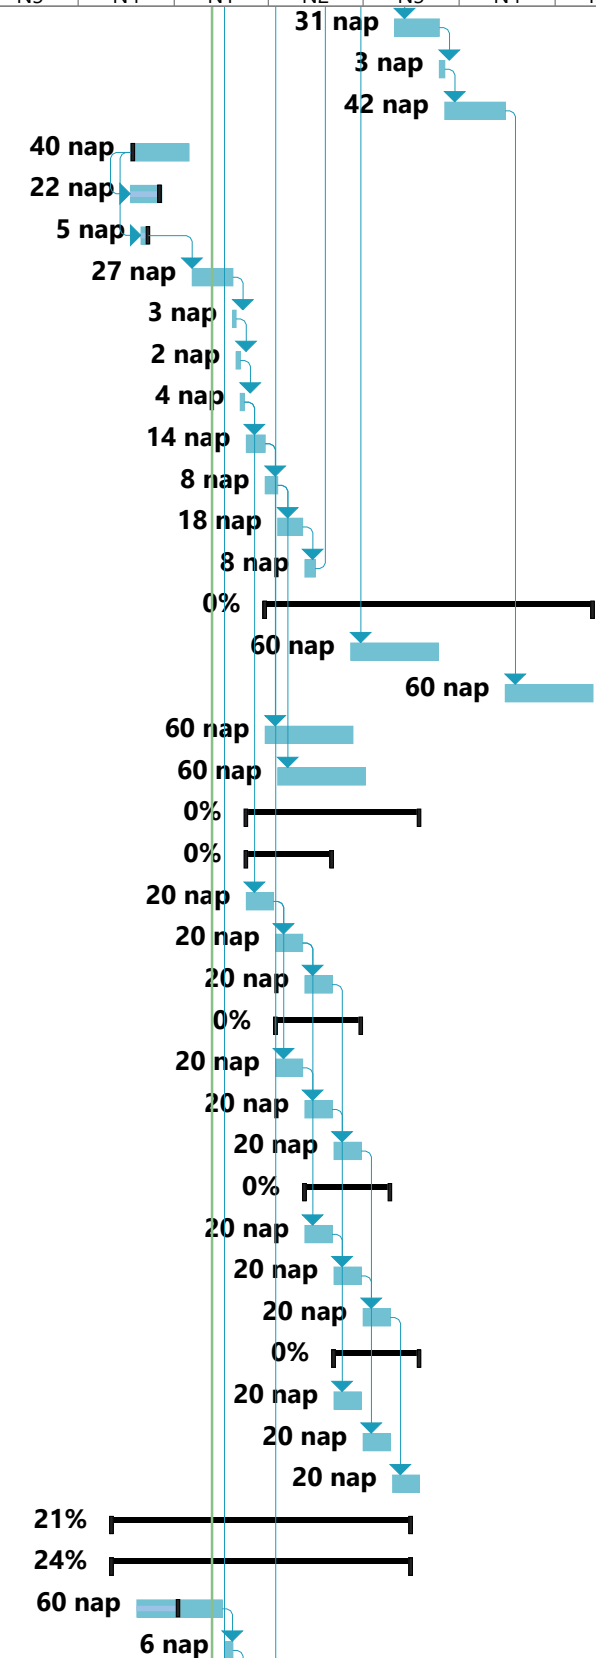



**Műszaki és tervezési ütemterv**

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	
280	1-1-0 József A.u	1 nap	K 19.02.26.	K 19.02.26.					1 nap								
281	1-1-0 336 sz u	7 nap	H 18.11.19.	K 18.11.27.					7 nap								
282	1-1-0 Virág u.	18 nap	P 18.11.02.	K 18.11.27.					18 nap								
283	1-2-0 Szabadság u.	9 nap	H 18.12.03.	Cs 18.12.13.					9 nap								
284	2-0-0 Szabadság u.	9 nap	P 18.12.14.	Sze 18.12.26.					9 nap								
285	2-0-0 Fő u.	54 nap	Cs 18.12.27.	K 19.03.12.					54 nap								
286	2-1-0 Szabadság u.	10 nap	Sze 19.03.13.	K 19.03.26.					10 nap								
287	2-1-1 Szabadság u.	30 nap	Sze 19.03.27.	K 19.05.07.					30 nap								
288	2-1-1 Templom u	15 nap	Sze 19.05.08.	K 19.05.28.					15 nap								
289	2-1-1 Dobi u.	15 nap	Sze 19.05.29.	K 19.06.18.					15 nap								
290	2-1-1-1 Templom u	17 nap	Sze 19.06.19.	Cs 19.07.11.					17 nap								
291	2-1-1-2 Iskola u.	6 nap	P 19.07.12.	P 19.07.19.					6 nap								
292	2-1-1-2 Napsugár u	9 nap	H 19.07.22.	Cs 19.08.01.					9 nap								
293	2-2-0 Fő u.	10 nap	P 19.08.02.	Cs 19.08.15.					10 nap								
294	2-3-0 Iskola u.	12 nap	Cs 19.01.03.	P 19.01.18.					12 nap								
295	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>144 nap</b>	<b>Cs 18.12.13.</b>	<b>K 19.07.02.</b>					16%								
296	<b>NY-1</b>	60 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.03.06.					60 nap								
297	<b>NY-2</b>	10 nap	Sze 19.03.27.	K 19.04.09.					10 nap								
298	<b>Átemelő</b>	<b>80 nap</b>	<b>Sze 19.03.13.</b>	<b>K 19.07.02.</b>					0%	0 Ft							
299	<b>Á-1</b>	<b>60 nap</b>	<b>Sze 19.03.13.</b>	<b>K 19.06.04.</b>					0%	0 Ft							
300	Építészeti munkák	20 nap	Sze 19.03.13.	K 19.04.09.					20 nap								
301	Gépészeti munkák	20 nap	Sze 19.04.10.	K 19.05.07.					20 nap								
302	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Sze 19.05.08.	K 19.06.04.					20 nap								
303	<b>Á-1</b>	<b>60 nap</b>	<b>Sze 19.04.10.</b>	<b>K 19.07.02.</b>					0%	0 Ft							
304	Építészeti munkák	20 nap	Sze 19.04.10.	K 19.05.07.					20 nap								
305	Gépészeti munkák	20 nap	Sze 19.05.08.	K 19.06.04.					20 nap								
306	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Sze 19.06.05.	K 19.07.02.					20 nap								
307	<u>Telep</u>	<b>438 nap</b>	<b>H 19.02.18.</b>	<b>Sze 20.10.21.</b>					0%								
308	Kivitelezési munkák	310 nap	H 19.02.18.	P 20.04.24.					310 nap								
309	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.25.	Sze 20.10.21.					180 nap								
310	<b>Cigánd-Tiszakarád</b>	<b>403 nap</b>	<b>H 19.04.08.</b>	<b>Sze 20.10.21.</b>					0%								
311	<u>Telep</u>	<b>403 nap</b>	<b>H 19.04.08.</b>	<b>Sze 20.10.21.</b>					0%								
312	Kivitelezési munkák	275 nap	H 19.04.08.	P 20.04.24.					275 nap								
313	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.25.	Sze 20.10.21.					180 nap								
314	<b>Projekt zárása</b>	28 nap	Cs 20.10.29.	Szo 20.12.05.					28 nap								
