




**Műszaki és tervezési ütemterv**

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	
1	<b>ÉKMO2 Projekt várható ütemezése</b>	1096 nap	Sze 17.12.06.	Szo 20.12.05.																
2	<b>ÉKMO2 projekt lebonyolítás ütemezése</b>		<b>K 17.12.12.</b>	<b>Szo 20.12.05.</b>																
3	<b>Munkaterület átadás tervezési munkákra</b>	1 nap	K 17.12.12.	K 17.12.12.																
4	<b>Tervezési munkák</b>	<b>395 nap</b>	<b>Sze 17.12.13.</b>	<b>Cs 19.06.27.</b>																
5	<b>Hálózat</b>	<b>395 nap</b>	<b>Sze 17.12.13.</b>	<b>Cs 19.06.27.</b>																
6	Jánd	67 nap	K 18.01.23.	Sze 18.05.02.																
7	Aranyosapáti	79 nap	Sze 18.01.17.	H 18.05.14.																
8	Mándok	350 nap	H 18.02.12.	Cs 19.06.27.																
9	Gávavencsellő	165 nap	Sze 17.12.13.	Sze 18.08.08.																
10	Tiszatelek	220 nap	Sze 17.12.13.	P 18.10.26.																
11	Beszterec	187 nap	Sze 17.12.13.	H 18.09.10.																
12	Újdombrád	181 nap	Sze 17.12.13.	P 18.08.31.																
13	<b>Telep</b>	<b>364 nap</b>	<b>K 18.01.23.</b>	<b>K 19.06.25.</b>																
14	Cigánd	250 nap	K 18.07.10.	K 19.06.25.																
15	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	188 nap	Cs 18.03.08.	Cs 18.12.06.																
16	Aranyosapáti	225 nap	P 18.01.26.	Sze 18.12.19.																
17	Mándok	101 nap	K 18.05.29.	H 18.10.29.																
18	Gávavencsellő	185 nap	Sze 18.01.31.	H 18.10.29.																
19	Tiszatelek	270 nap	K 18.01.23.	Cs 19.02.14.																
20	<b>Kiviteli tervek jóváhagyása</b>	<b>315 nap</b>	<b>Sze 18.05.09.</b>	<b>Cs 19.07.25.</b>																
21	<b>Hálózat</b>	<b>315 nap</b>	<b>Sze 18.05.09.</b>	<b>Cs 19.07.25.</b>																
22	Jánd	3 nap	Sze 18.05.09.	P 18.05.11.																
23	Aranyosapáti	4 nap	K 18.05.15.	P 18.05.18.																
24	Mándok	10 nap	P 19.07.12.	Cs 19.07.25.																
25	Gávavencsellő	1 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.																
26	Tiszatelek	5 nap	H 18.12.10.	P 18.12.14.																
27	Beszterec	10 nap	K 18.09.11.	P 18.09.21.																
28	Újdombrád	10 nap	H 18.09.03.	P 18.09.14.																
29	<b>Telep</b>	<b>190 nap</b>	<b>K 18.10.16.</b>	<b>K 19.07.09.</b>																
30	Cigánd	10 nap	Sze 19.06.26.	K 19.07.09.																
31	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	10 nap	P 18.12.14.	Sze 18.12.26.																
32	Aranyosapáti	10 nap	Cs 18.12.20.	Sze 19.01.02.																
33	Mándok	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.																
34	Gávavencsellő	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.																
35	Tiszatelek	10 nap	P 19.02.15.	Cs 19.02.28.																
36	<b>Munkaterület átadása</b>	<b>339 nap</b>	<b>Sze 18.03.14.</b>	<b>Sze 19.07.10.</b>																
37	<b>Hálózat</b>	<b>212 nap</b>	<b>Sze 18.03.14.</b>	<b>H 19.01.14.</b>																
38	Jánd	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.																
39	Aranyosapáti	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.																
40	Mándok	1 nap	H 19.01.14.	H 19.01.14.																



Műszaki és tervezési ütemterv


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021		
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4
41	Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.06.07.	Cs 18.06.07.															
42	Tiszatelek	1 nap	K 18.10.16.	K 18.10.16.															
43	Beszterec	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.															
44	Újdombrád	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.															
45	<b>Telep</b>	<b>185 nap</b>	<b>P 18.10.26.</b>	<b>Sze 19.07.10.</b>															
46	Cigánd	1 nap	Sze 19.07.10.	Sze 19.07.10.															
47	Vásárosnamény-Gergelyugornya	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.															
48	Aranyosapáti	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.															
49	Mándok	1 nap	P 18.10.26.	P 18.10.26.															
50	Gávavencsellő	1 nap	K 18.12.11.	K 18.12.11.															
51	Tiszatelek	1 nap	H 18.11.19.	H 18.11.19.															
52	<b>Kivitelezési munkák kezdése</b>	<b>625 nap</b>	<b>H 18.06.04.</b>	<b>H 20.10.26.</b>															
53	<b>Jánd - Vásárosnamény</b>	<b>617 nap</b>	<b>H 18.06.04.</b>	<b>Sze 20.10.14.</b>															
54	<b>Hálózat ideiglenes helyreállítással</b>	<b>518 nap</b>	<b>H 18.06.04.</b>	<b>Cs 20.05.28.</b>															
55	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>194 nap</b>	<b>H 18.06.04.</b>	<b>P 19.03.01.</b>															
56	1-0-0 - Petőfi, Árpád u.	47 nap	H 18.06.04.	K 18.08.07.															
57	1-1-0 - Árpád, Rákóczi u.	30 nap	P 18.08.10.	Cs 18.09.20.															
58	1-1-1 - Rákóczi u.	3 nap	K 18.09.11.	Cs 18.09.13.															
59	1-2-0 - Ady Endre u.	3 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.															
60	2-0-0 - Kossuth, Szabadság, Arany u.	56 nap	K 18.07.10.	K 18.09.25.															
61	2-1-0 - Jókai u.	7 nap	H 18.11.12.	K 18.11.20.															
62	2-2-0 - Jókai, Béke u.	19 nap	K 18.11.13.	P 18.12.07.															
63	2-2-1 - Dózsa, Béke	59 nap	H 18.12.10.	Cs 19.02.28.															
64	2-2-1-1 - Béke u.	7 nap	P 18.11.30.	H 18.12.10.															
65	2-2-2 - Jókai u.	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.															
66	2-3-0 - 289 hrsz u.	24 nap	Sze 18.10.03.	P 18.11.09.															
67	2-4-0 - Kossuth u.	17 nap	H 18.07.09.	K 18.07.31.															
68	2-5-0 - Arany J u.	4 nap	K 18.09.04.	P 18.09.07.															
69	2-6-0 - Arany, Jókai u.	7 nap	P 18.08.24.	H 18.09.03.															
70	3-0-0 - Rákóczi, Tisza, Hunyadi u.	105 nap	K 18.10.02.	P 19.03.01.															
71	3-1-0 - Rákóczi u.	9 nap	P 18.10.26.	P 18.11.09.															
72	3-2-0 - Rákóczi u.	6 nap	Cs 18.10.04.	Cs 18.10.11.															
73	3-3-0 - Bajcsi Zs.u.	12 nap	H 19.02.11.	K 19.02.26.															
74	3-4-0 - Tisza u.	10 nap	Cs 18.12.06.	Sze 18.12.19.															
75	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>227 nap</b>	<b>K 18.06.05.</b>	<b>Cs 19.04.18.</b>															
76	NY-1 - Arpád, Petőfi u., külterület.	225 nap	K 18.06.05.	Cs 19.04.18.															
77	NY-2 - Jókai u.	7 nap	Cs 18.10.04.	P 18.10.12.															
78	NY-3 - Rákóczi u.	26 nap	H 18.10.01.	Sze 19.02.20.															
79	<b>Végleges helyreállítás</b>	<b>50 nap</b>	<b>P 20.03.20.</b>	<b>Cs 20.05.28.</b>															
80	<b>Átemelő</b>	<b>64 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>Cs 19.08.29.</b>															

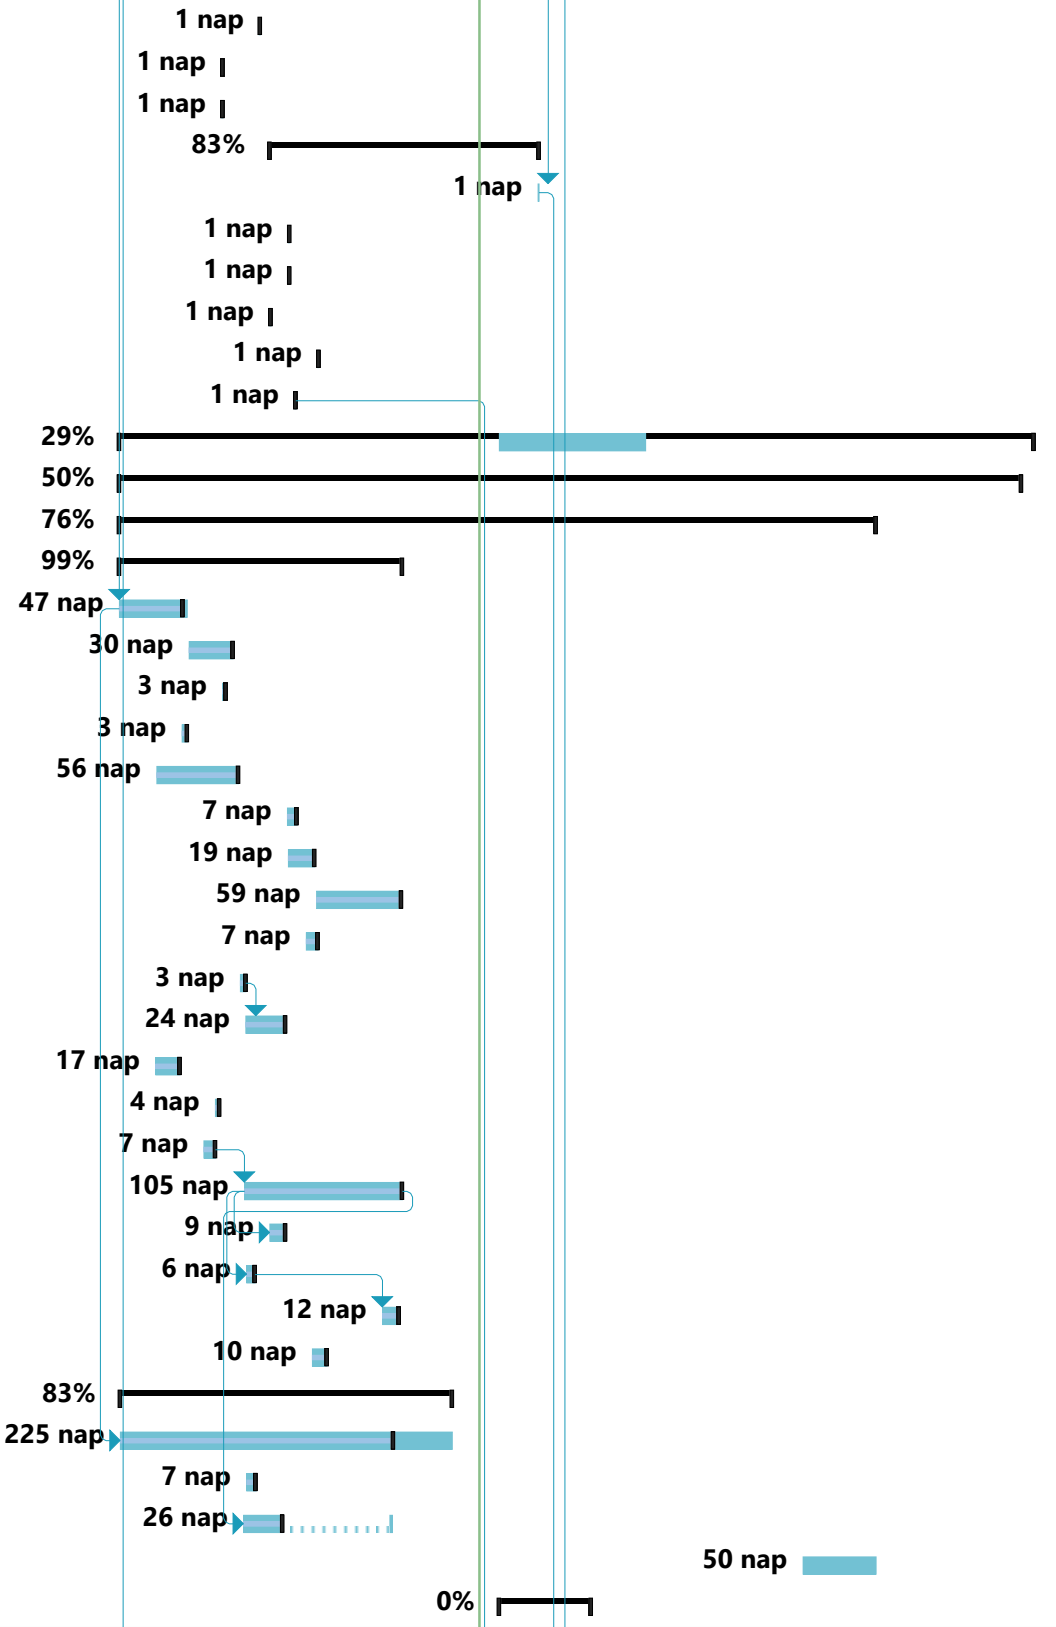



**Műszaki és tervezési ütemterv**

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1				
81	<b>Á-1</b>	<b>44 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>Cs 19.08.01.</b>																
82	Építészeti munkák	14 nap	H 19.06.03.	Cs 19.06.20.																
83	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.06.21.	Cs 19.07.04.																
84	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.07.19.	Cs 19.08.01.																
85	<b>Á-2</b>	<b>54 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>Cs 19.08.15.</b>																
86	Építészeti munkák	14 nap	H 19.06.03.	Cs 19.06.20.																
87	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.07.05.	Cs 19.07.18.																
88	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.08.02.	Cs 19.08.15.																
89	<b>Á-3</b>	<b>64 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>Cs 19.08.29.</b>																
90	Építészeti munkák	14 nap	H 19.06.03.	Cs 19.06.20.																
91	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.06.21.	Cs 19.07.04.																
92	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.08.16.	Cs 19.08.29.																
93	<b>Telep</b>	<b>368 nap</b>	<b>H 19.05.20.</b>	<b>Sze 20.10.14.</b>																
94	Kivitelezési munkák	240 nap	H 19.05.20.	P 20.04.17.																
95	Bontás	20 nap	H 20.08.10.	P 20.09.04.																
96	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.18.	Sze 20.10.14.																
97	<b>Aranyosapáti</b>	<b>616 nap</b>	<b>K 18.06.12.</b>	<b>Sze 20.10.21.</b>																
98	<b>Hálózat ideiglenes helyreállítással</b>	<b>523 nap</b>	<b>K 18.06.12.</b>	<b>P 20.06.12.</b>																
99	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>343 nap</b>	<b>K 18.06.12.</b>	<b>P 19.10.04.</b>																
100	1-0-0 - Kossuth u.	80 nap	H 18.06.18.	P 18.10.05.																
101	1-1-0 - Kossuth u.	40 nap	H 19.06.03.	P 19.07.26.																
102	1-1-1 - Kossuth u.	30 nap	H 19.07.29.	P 19.09.06.																
103	1-2-0 - Bocskai u.	5 nap	P 18.08.24.	Cs 18.08.30.																
104	2-0-0 - Esze Tamás	52 nap	H 18.09.17.	Cs 18.11.29.																
105	2-1-0 - Vasút u.	40 nap	H 19.06.03.	P 19.07.26.																
106	2-1-1 - Vasút u.	30 nap	H 19.06.03.	P 19.07.12.																
107	2-1-2 - Bercsényi u.	30 nap	H 19.07.15.	P 19.08.23.																
108	2-1-3 - Hunyadi u.	30 nap	H 19.08.26.	P 19.10.04.																
109	2-1-3-1 - Vasút u.	30 nap	Cs 19.06.20.	Sze 19.07.31.																
110	2-2-0 - Kossuth u.	30 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.09.11.																
111	2-3-0 - Petőfi u.	30 nap	Sze 19.05.08.	K 19.06.18.																
112	2-3-1 - Petőfi u.	30 nap	Sze 19.06.19.	K 19.07.30.																
113	2-4-0 - Bajcsi Zs.	30 nap	Sze 19.07.31.	K 19.09.10.																
114	3-0-0 - Honvéd u.	280 nap	K 18.06.12.	K 19.07.09.																
115	3-1-0 - Béke u.	2 nap	P 18.06.22.	H 18.06.25.																
116	3-2-0 - Lenin u.	30 nap	H 19.02.11.	P 19.03.22.																
117	4-0-0 - Petőfi u., József A.	27 nap	K 18.10.09.	K 18.11.20.																
118	4-1-0 - József A.u.	50 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.07.10.																
119	4-2-0 - József, Arany u.	70 nap	H 18.09.03.	Sze 18.12.12.																
120	4-2-1 - Arany J. u.	4 nap	Cs 18.06.21.	K 18.06.26.																

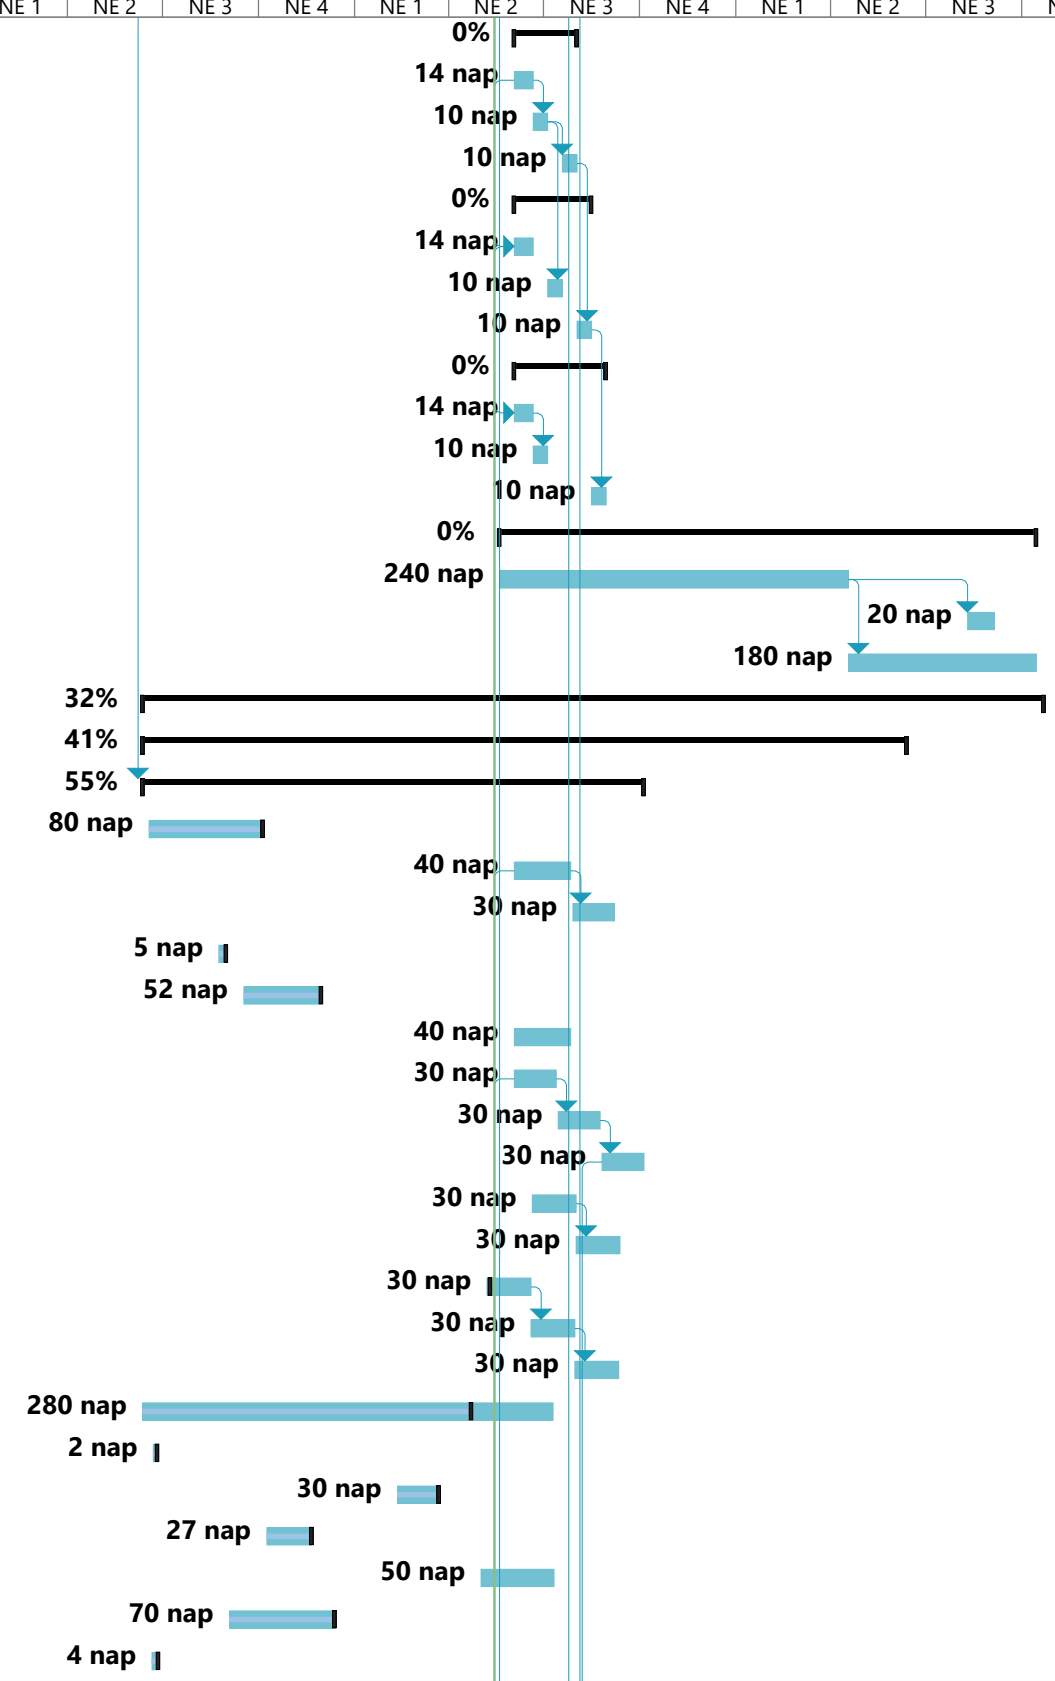




**Műszaki és tervezési ütemterv**

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1				
121	4-2-2 - Kölcsey u.	4 nap	H 18.09.17.	Cs 18.09.20.					4 nap											
122	4-3-0 - Temető u.	10 nap	H 19.04.08.	P 19.04.19.						10 nap										
123	4-4-0 - Táncsics	27 nap	H 19.02.18.	K 19.03.26.						27 nap										
124	4-5-0 - Jókai u.	10 nap	K 19.03.26.	H 19.04.08.						10 nap										
125	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>248 nap</b>	<b>K 18.10.09.</b>	<b>P 19.09.20.</b>						32%										
126	NY-1 - Kossuth u.	50 nap	H 19.06.03.	P 19.08.09.						50 nap										
127	NY-2 - Vasút u.	20 nap	H 19.06.03.	P 19.06.28.						20 nap										
128	NY-3 - Vasút u.	20 nap	H 19.08.26.	P 19.09.20.						20 nap										
129	NY-4 - József A. u.	45 nap	K 18.10.09.	Cs 18.12.13.						45 nap										
130	<b>Végleges helyreállítás</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 20.03.23.</b>	<b>P 20.06.12.</b>																
131	<b>Átemelő</b>	<b>85 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>P 19.09.27.</b>																
132	<b>Á-1</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>P 19.08.23.</b>																
133	Építészeti munkák	20 nap	H 19.06.03.	P 19.06.28.						20 nap										
134	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.07.01.	P 19.07.26.						20 nap										
135	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.07.29.	P 19.08.23.						20 nap										
136	<b>Á-2</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 19.06.10.</b>	<b>P 19.08.30.</b>																
137	Építészeti munkák	20 nap	H 19.06.10.	P 19.07.05.						20 nap										
138	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.07.08.	P 19.08.02.						20 nap										
139	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.08.05.	P 19.08.30.						20 nap										
140	<b>Á-3</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 19.07.08.</b>	<b>P 19.09.27.</b>																
141	Építészeti munkák	20 nap	H 19.07.08.	P 19.08.02.						20 nap										
142	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.08.05.	P 19.08.30.						20 nap										
143	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.09.02.	P 19.09.27.						20 nap										
144	<b>Á-4</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 19.06.17.</b>	<b>P 19.09.06.</b>																
145	Építészeti munkák	20 nap	H 19.06.17.	P 19.07.12.						20 nap										
146	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.07.15.	P 19.08.09.						20 nap										
147	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.08.12.	P 19.09.06.						20 nap										
148	<b>Telep</b>	<b>383 nap</b>	<b>H 19.05.06.</b>	<b>Sze 20.10.21.</b>																
149	Kivitelezési munkák	255 nap	H 19.05.06.	P 20.04.24.						255 nap										
150	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.25.	Sze 20.10.21.																
151	<b>Mándok</b>	<b>359 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>Cs 20.10.15.</b>																
152	<u>Hálózat ideiglenes helyreállítással</u>	320 nap	P 19.07.26.	Cs 20.10.15.						320 nap										
153	<b>Telep</b>	<b>100 nap</b>	<b>H 19.06.03.</b>	<b>V 19.10.20.</b>																
154	Kivitelezési munkák	140 nap	H 19.06.03.	V 19.10.20.						140 nap										
155	<b>Gávavencsellő</b>	<b>597 nap</b>	<b>H 18.07.02.</b>	<b>Sze 20.10.14.</b>																
156	<u>Hálózat ideiglenes helyreállítással</u>	509 nap	H 18.07.02.	P 20.06.12.						17%										
157	<b>I. ütem</b>	<b>125 nap</b>	<b>H 18.07.02.</b>	<b>H 18.12.24.</b>						39%										
158	M-1-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	Cs 18.07.12.	H 18.07.30.						100%										
159	M-1-1-0 Kolozsvári u.	4 nap	Cs 18.07.19.	K 18.07.24.						13 nap										
160	M-2-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	K 18.07.24.	Cs 18.08.09.						4 nap										
										13 nap										



**Műszaki és tervezési ütemterv**


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1
161	M-2-1-0 Árpád u.	6 nap	Sze 18.08.01.	Sze 18.08.08.					6 nap											
162	M-3-0-0 Vasút u.	10 nap	Cs 18.08.09.	Cs 18.08.23.					10 nap											
163	M-5-0-0 Temető u.	17 nap	Cs 18.08.30.	P 18.09.21.					17 nap											
164	M-5-1-0 Rakevszki u.	9 nap	P 18.08.31.	Sze 18.09.12.					9 nap											
165	M-6-0-0 Bem József, Kossuth Lajos u.	21 nap	H 18.10.01.	Sze 18.10.31.					21 nap											
166	M-6-1-0 Lehel u.	15 nap	K 18.10.02.	Sze 18.10.24.					15 nap											
167	M-8-0-0 József Attila, Kossuth Lajos u.	25 nap	Cs 18.11.15.	Sze 18.12.19.					25 nap											
168	M-8-1-0 Kossuth Lajos u.	3 nap	Cs 18.12.20.	H 18.12.24.					3 nap											
169	M-9-0-0 Vörösmarty Mihály u.	12 nap	K 18.07.03.	Sze 18.07.18.					12 nap											
170	M-9-1-0 Gorkij u.	18 nap	P 18.07.06.	K 18.07.31.					18 nap											
171	M-10-0-0 Jókai Mór, Akácfa u.	12 nap	H 18.07.02.	K 18.07.17.					12 nap											
172	M-10-1-0 Jókai Mór u.	2 nap	Cs 18.07.05.	P 18.07.06.					2 nap											
173	M-11-0-0 Uzsoki u.	13 nap	Cs 18.08.09.	K 18.08.28.					13 nap											
174	M-12-0-0 Rakevszki u., Kis köz	16 nap	Cs 18.08.23.	Cs 18.09.13.					16 nap											
175	M-12-1-0 Rakevszki u.	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.					3 nap											
176	<b>II. ütem</b>	<b>346 nap</b>	<b>P 19.02.15.</b>	<b>P 20.06.12.</b>																
177	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>151 nap</b>	<b>P 19.02.15.</b>	<b>P 19.09.13.</b>																
178	1-0-0 Vasvári Pál u.	20 nap	Cs 19.05.09.	Sze 19.06.05.					20 nap											
179	1-0-0 Halász u.	15 nap	Cs 19.05.09.	Sze 19.05.29.					15 nap											
180	1-1-0 Vasvári Pál u.	8 nap	Cs 19.05.09.	H 19.05.20.					8 nap											
181	1-1-0 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.					5 nap											
182	1-1-1 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.					5 nap											
183	1-1-2 Arany János u.	5 nap	Sze 19.04.17.	K 19.04.23.					5 nap											
184	1-2-0 Halász u.	7 nap	Cs 19.05.09.	P 19.05.17.					7 nap											
185	2-0-0 Rákóczi Ferenc u.	4 nap	H 19.05.20.	Cs 19.05.23.					4 nap											
186	2-0-0 Arany János u.	8 nap	P 19.05.24.	K 19.06.04.					8 nap											
187	2-1-0 Rákóczi Ferenc u.	3 nap	Sze 19.06.05.	P 19.06.07.					3 nap											
188	3-0-0 Fertő u.	16 nap	Sze 19.03.20.	Sze 19.04.10.					16 nap											
189	3-1-0 Fertő u.	3 nap	H 19.04.15.	Sze 19.04.17.					3 nap											
190	3-1-0 Kossuth u.	2 nap	K 19.04.23.	Cs 19.04.25.					2 nap											
191	4-0-0 Kossuth u.	6 nap	K 19.03.19.	K 19.03.26.					6 nap											
192	4-1-0 Kossuth u.	9 nap	Sze 19.03.06.	H 19.03.18.					9 nap											
193	M-4-0-0 Báthori u.	1 nap	P 19.05.24.	P 19.05.24.					1 nap											
194	M-4-0-0 Arany János u.	18 nap	H 19.05.27.	Sze 19.06.19.					18 nap											
195	M-4-1-0 Báthory u.	3 nap	Cs 19.06.20.	H 19.06.24.					3 nap											
196	5-0-0 Bem József u.	14 nap	H 19.03.18.	Cs 19.04.04.					14 nap											
197	5-1-0 Bem József u.	8 nap	Cs 19.03.07.	H 19.03.18.					8 nap											
198	6-0-0 Major u.	3 nap	P 19.03.15.	K 19.03.19.					3 nap											
199	6-0-0 Lehel u.	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.					12 nap											
200	6-1-0 Major u.	13 nap	P 19.02.15.	K 19.03.05.					13 nap											

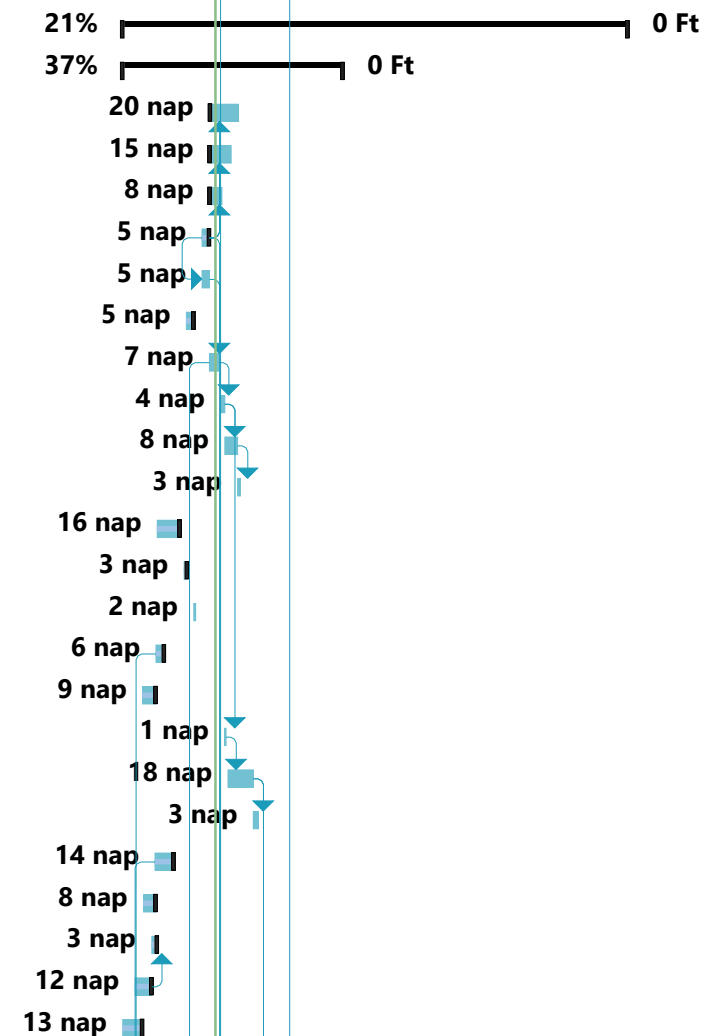



**Műszaki és tervezési ütemterv**


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021					
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1		
201	6-1-0 Ady Endre u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.																		
202	7-0-0 Tisza u.	4 nap	Cs 19.06.06.	K 19.06.11.																		
203	7-1-0 Tisza u.	3 nap	H 19.06.03.	Sze 19.06.05.																		
204	M-7/a-0-0 Petőfi Sándor u.	2 nap	Cs 19.06.06.	P 19.06.07.																		
205	8-0-0 Tisza u.	16 nap	Sze 19.06.26.	Sze 19.07.17.																		
206	8-1-0 Tisza u.	10 nap	Sze 19.06.12.	K 19.06.25.																		
207	8-2-0 Kovács Mihály u.	8 nap	Sze 19.06.26.	P 19.07.05.																		
208	9-0-0 Báthori u.	8 nap	Sze 19.09.04.	P 19.09.13.																		
209	9-0-0 Honvéd u.	6 nap	K 19.08.27.	K 19.09.03.																		
210	9-1-0 Báthori u.	4 nap	Sze 19.08.21.	H 19.08.26.																		
211	10-0-0 Báthori u.	14 nap	Cs 19.07.25.	K 19.08.13.																		
212	10-1-0 Báthori u.	5 nap	Sze 19.08.14.	K 19.08.20.																		
213	11-0-0 Lónyai u.	5 nap	Cs 19.07.18.	Sze 19.07.24.																		
214	11-1-0 Lónyai u.	0 nap	Sze 19.07.24.	Sze 19.07.24.																		
215	12-0-0 Móricz Zsigmond u.	9 nap	K 19.06.11.	P 19.06.21.																		
216	13-0-0 Rakovszki u.	6 nap	H 19.06.03.	H 19.06.10.																		
217	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>131 nap</b>	<b>Sze 19.02.27.</b>	<b>Sze 19.08.28.</b>																		
218	NY-1	15 nap	Cs 19.05.09.	Sze 19.05.29.																		
219	NY-2	6 nap	Cs 19.05.09.	Cs 19.05.16.																		
220	NY-3	15 nap	P 19.04.05.	Cs 19.04.25.																		
221	NY-4	4 nap	K 19.03.19.	P 19.03.22.																		
222	NY-5	10 nap	H 19.03.18.	P 19.03.29.																		
223	NY-6	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.																		
224	NY-7	7 nap	H 19.06.03.	K 19.06.11.																		
225	NY-8	12 nap	Sze 19.06.26.	Cs 19.07.11.																		
226	NY-9	4 nap	Sze 19.08.21.	H 19.08.26.																		
227	NY-10	8 nap	Cs 19.07.25.	H 19.08.05.																		
228	NY-11	5 nap	Cs 19.07.25.	Sze 19.07.31.																		
229	NY-12	10 nap	K 19.06.11.	H 19.06.24.																		
230	NY-13	5 nap	H 19.06.03.	P 19.06.07.																		
231	NYG-1	50 nap	Cs 19.06.20.	Sze 19.08.28.																		
232	<b>Átemelő</b>	210 nap	H 19.06.10.	P 20.03.27.																		
233	<b>Végleges helyreállítás</b>	60 nap	H 20.03.23.	P 20.06.12.																		
234	<b>Telep</b>	<b>405 nap</b>	<b>Cs 19.03.28.</b>	<b>Sze 20.10.14.</b>																		
235	Szociális és kezelő épület építése	130 nap	Sze 19.04.03.	K 19.10.01.																		
236	I. Reaktor építése	110 nap	Cs 19.03.28.	Sze 19.08.28.																		
237	II. Reaktor építése	110 nap	Cs 19.03.28.	Sze 19.08.28.																		
238	Utóülepítő medence építése	110 nap	Cs 19.03.28.	Sze 19.08.28.																		
239	Fertőtlenítő medence építése	45 nap	Cs 19.04.18.	Sze 19.06.19.																		
240	Izlapstabilizáló-sűrítő építése	45 nap	Cs 19.04.18.	Sze 19.06.19.																		

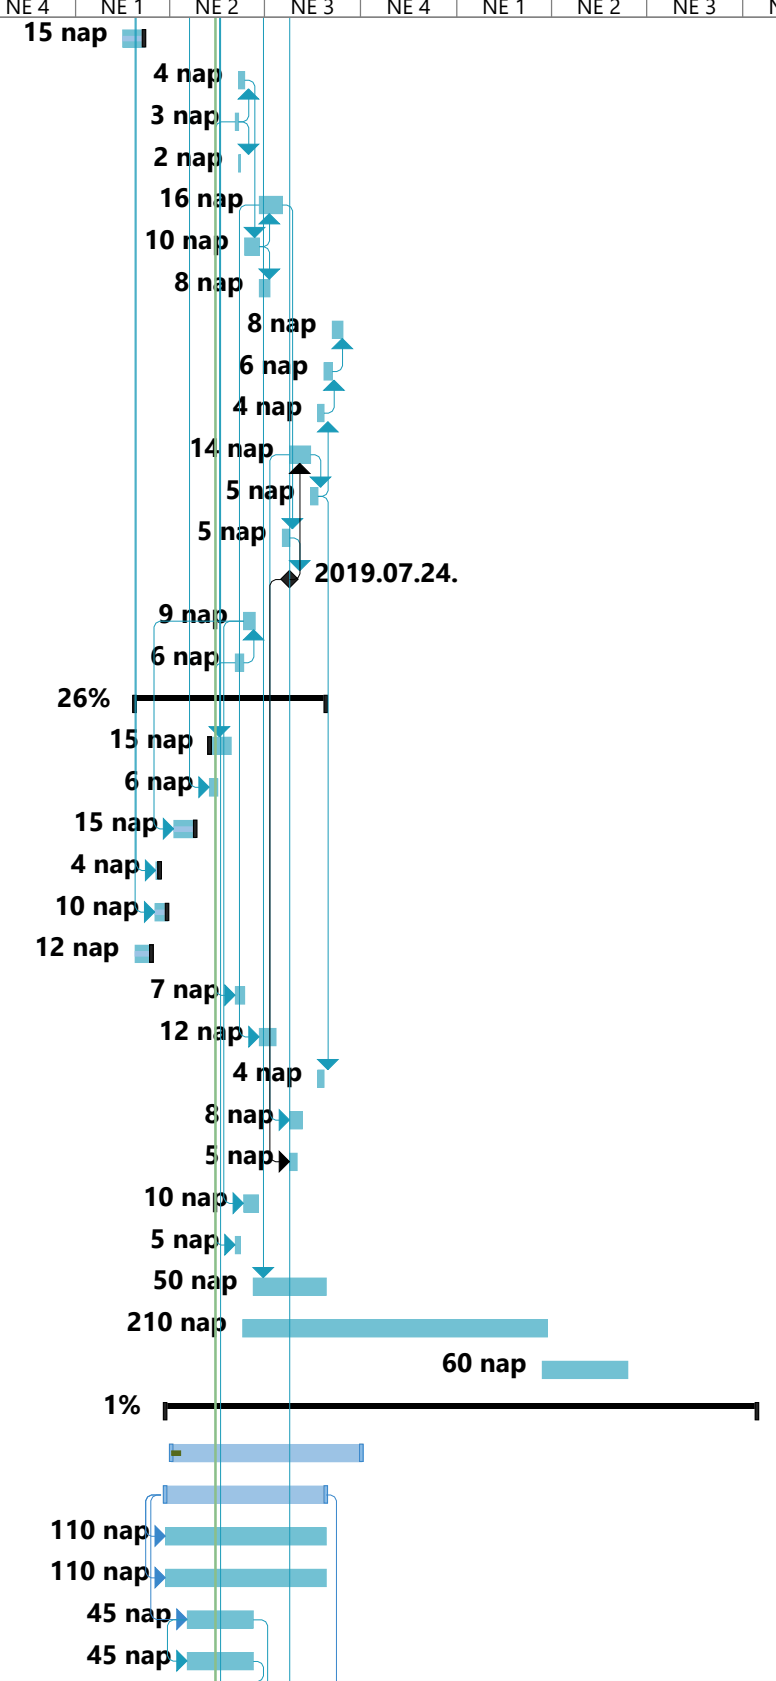




**Műszaki és tervezési ütemterv**

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1				
241	Csurgalékvíz átemelő építése	20 nap	Cs 19.05.30.	Sze 19.06.26.																
242	Tisztított szennyvíz átemelő építése	20 nap	Cs 19.05.30.	Sze 19.06.26.																
243	<b>Egyéb műtárgyak építése</b>	<b>60 nap</b>	<b>Cs 19.06.27.</b>	<b>Sze 19.09.18.</b>																
244	Vassó tároló, Vízmérőműtárgyak, Osztóakna 1-2, M	60 nap	Cs 19.06.27.	Sze 19.09.18.																
245	Udvartéri vezetékek, közművek	45 nap	Cs 19.07.04.	Sze 19.09.04.																
246	Technológiai gépészeti szerelés	90 nap	Cs 19.08.29.	Sze 20.01.01.																
247	Elektromos erős-gyengeáram és irányítástechnikai sz	100 nap	Cs 19.09.05.	Sze 20.01.22.																
248	Kerítés, térburkolat építés, csapadékvíz- tereprende	120 nap	Cs 19.09.26.	Sze 20.03.11.																
249	Üzempróbák	10 nap	Cs 20.01.23.	Sze 20.02.05.																
250	Próbaüzem	180 nap	Cs 20.02.06.	Sze 20.10.14.																
251	<b>Tiszatelek-Beszterec-Újdombrád</b>	<b>511 nap</b>	<b>P 18.11.02.</b>	<b>Sze 20.10.14.</b>																
252	<b>Tiszatelek - Hálózat ideiglenes helyreállítással</b>	<b>382 nap</b>	<b>P 19.02.15.</b>	<b>H 20.08.03.</b>																
253	1-0-0 Kossuth u.	20 nap	Cs 19.08.15.	Sze 19.09.11.																
254	1/1-0-0 Dózsa Gy.	20 nap	Cs 19.09.12.	Sze 19.10.09.																
255	2-0-0 Kossuth u.	30 nap	P 19.05.10.	Cs 19.06.20.																
256	2-1-0 Kossuth, Damjanich, Petőfi u.	10 nap	P 19.06.21.	Cs 19.07.04.																
257	2-2-0 Damjanich J. u	7 nap	P 19.07.05.	H 19.07.15.																
258	2-3-0 Petőfi u.	7 nap	K 19.07.16.	Sze 19.07.24.																
259	3-0-0 Kossuth u.	30 nap	H 19.04.22.	P 19.05.31.																
260	3-1-0 Kossuth u.	12 nap	P 19.05.03.	H 19.05.20.																
261	3-2-0 Szántó-K. J. u	12 nap	K 19.05.21.	Sze 19.06.05.																
262	4-0-0 Tanács, Zrínyi Ilona u,	30 nap	Cs 19.06.06.	Sze 19.07.17.																
263	4-1-0 Zrínyi Ilona u,	6 nap	Cs 19.07.18.	Cs 19.07.25.																
264	4-2-0 Tanács u.	8 nap	P 19.07.26.	K 19.08.06.																
265	5-0-0 Kossuth u.	6 nap	Sze 19.08.07.	Sze 19.08.14.																
266	7-0-0 Árpád, Fürst S. út	16 nap	Cs 19.08.15.	Cs 19.09.05.																
267	7-1-0 Fürst S. út	4 nap	P 19.09.06.	Sze 19.09.11.																
268	7-2-0 József A. u.	9 nap	Cs 19.09.12.	K 19.09.24.																
269	7-3-0 Iskola u	10 nap	H 19.06.10.	P 19.06.21.																
270	8-0-0 Arany J.u	15 nap	P 19.05.31.	Cs 19.06.20.																
271	8-1-0 Árpád, Arany J.u	11 nap	P 19.06.21.	P 19.07.05.																
272	8-1-1 Árpád u.	5 nap	K 19.07.16.	H 19.07.22.																
273	9-0-0 Dózsa Gy.	30 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.09.11.																
274	9-1-0 Dózsa Gy.	8 nap	Cs 19.08.15.	H 19.08.26.																
275	10-0-0 Dózsa Gy.	8 nap	Sze 20.05.06.	P 20.05.15.																
276	10-1-0 Dózsa Gy.	4 nap	Cs 19.07.11.	K 19.07.16.																
277	11-0-0 Esze Tamás u.	3 nap	Sze 19.06.05.	P 19.06.07.																
278	11-0-0 Sallai u.	9 nap	P 19.03.08.	Sze 19.03.20.																
279	11-1-0 Esze Tamás u.	60 nap	Cs 19.03.21.	Cs 19.07.11.																
280	11-2-0 Esze Tamás u.	60 nap	H 19.03.25.	H 19.07.15.																

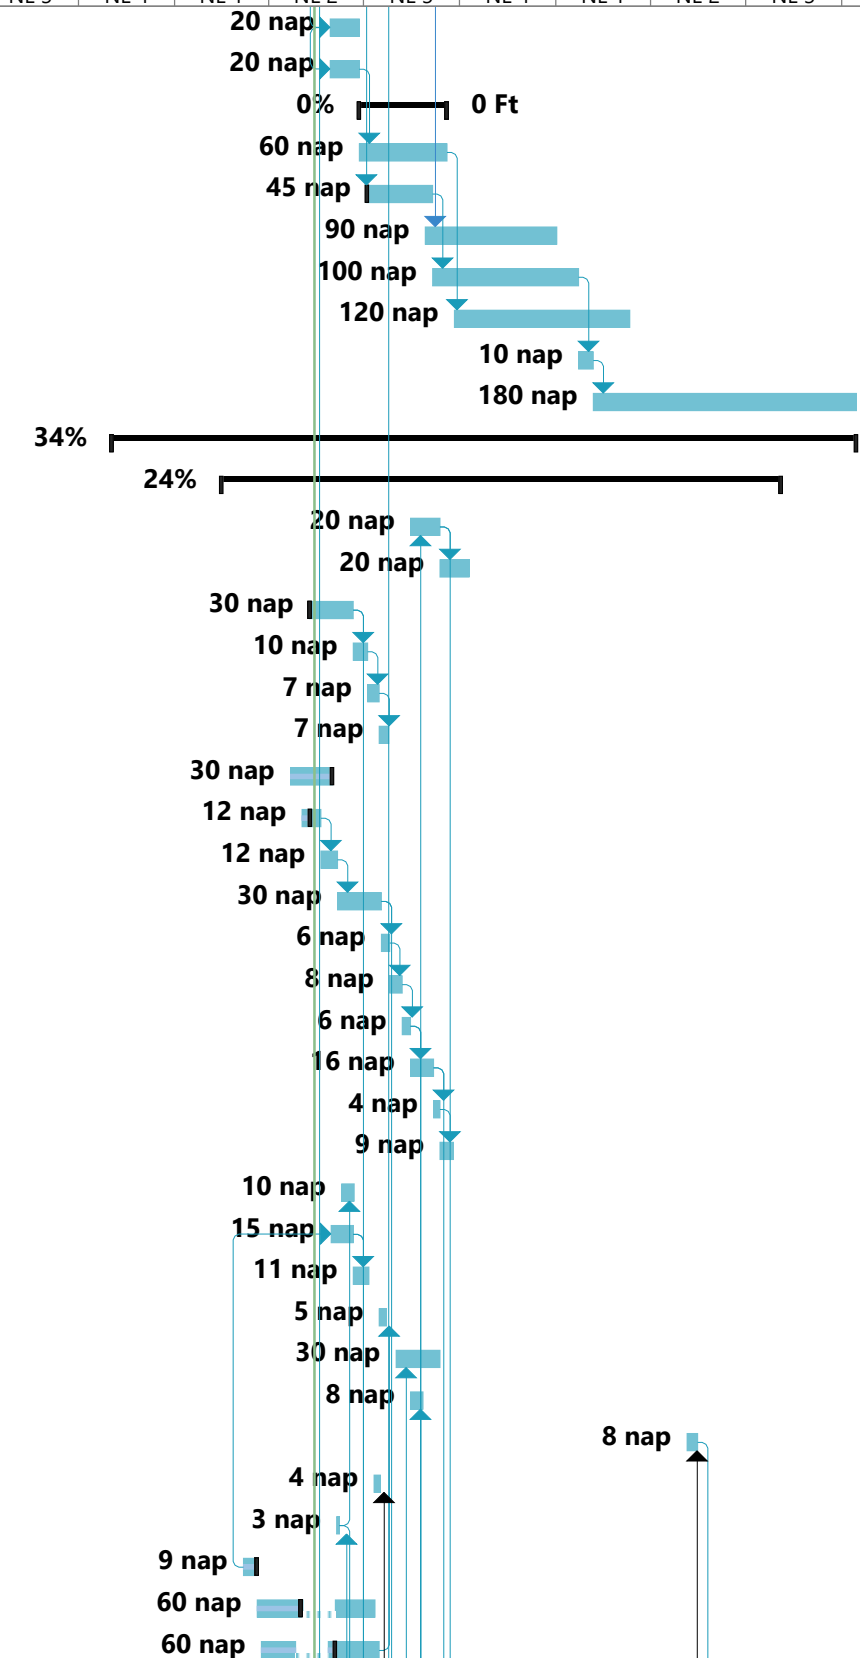



**Műszaki és tervezési ütemterv**

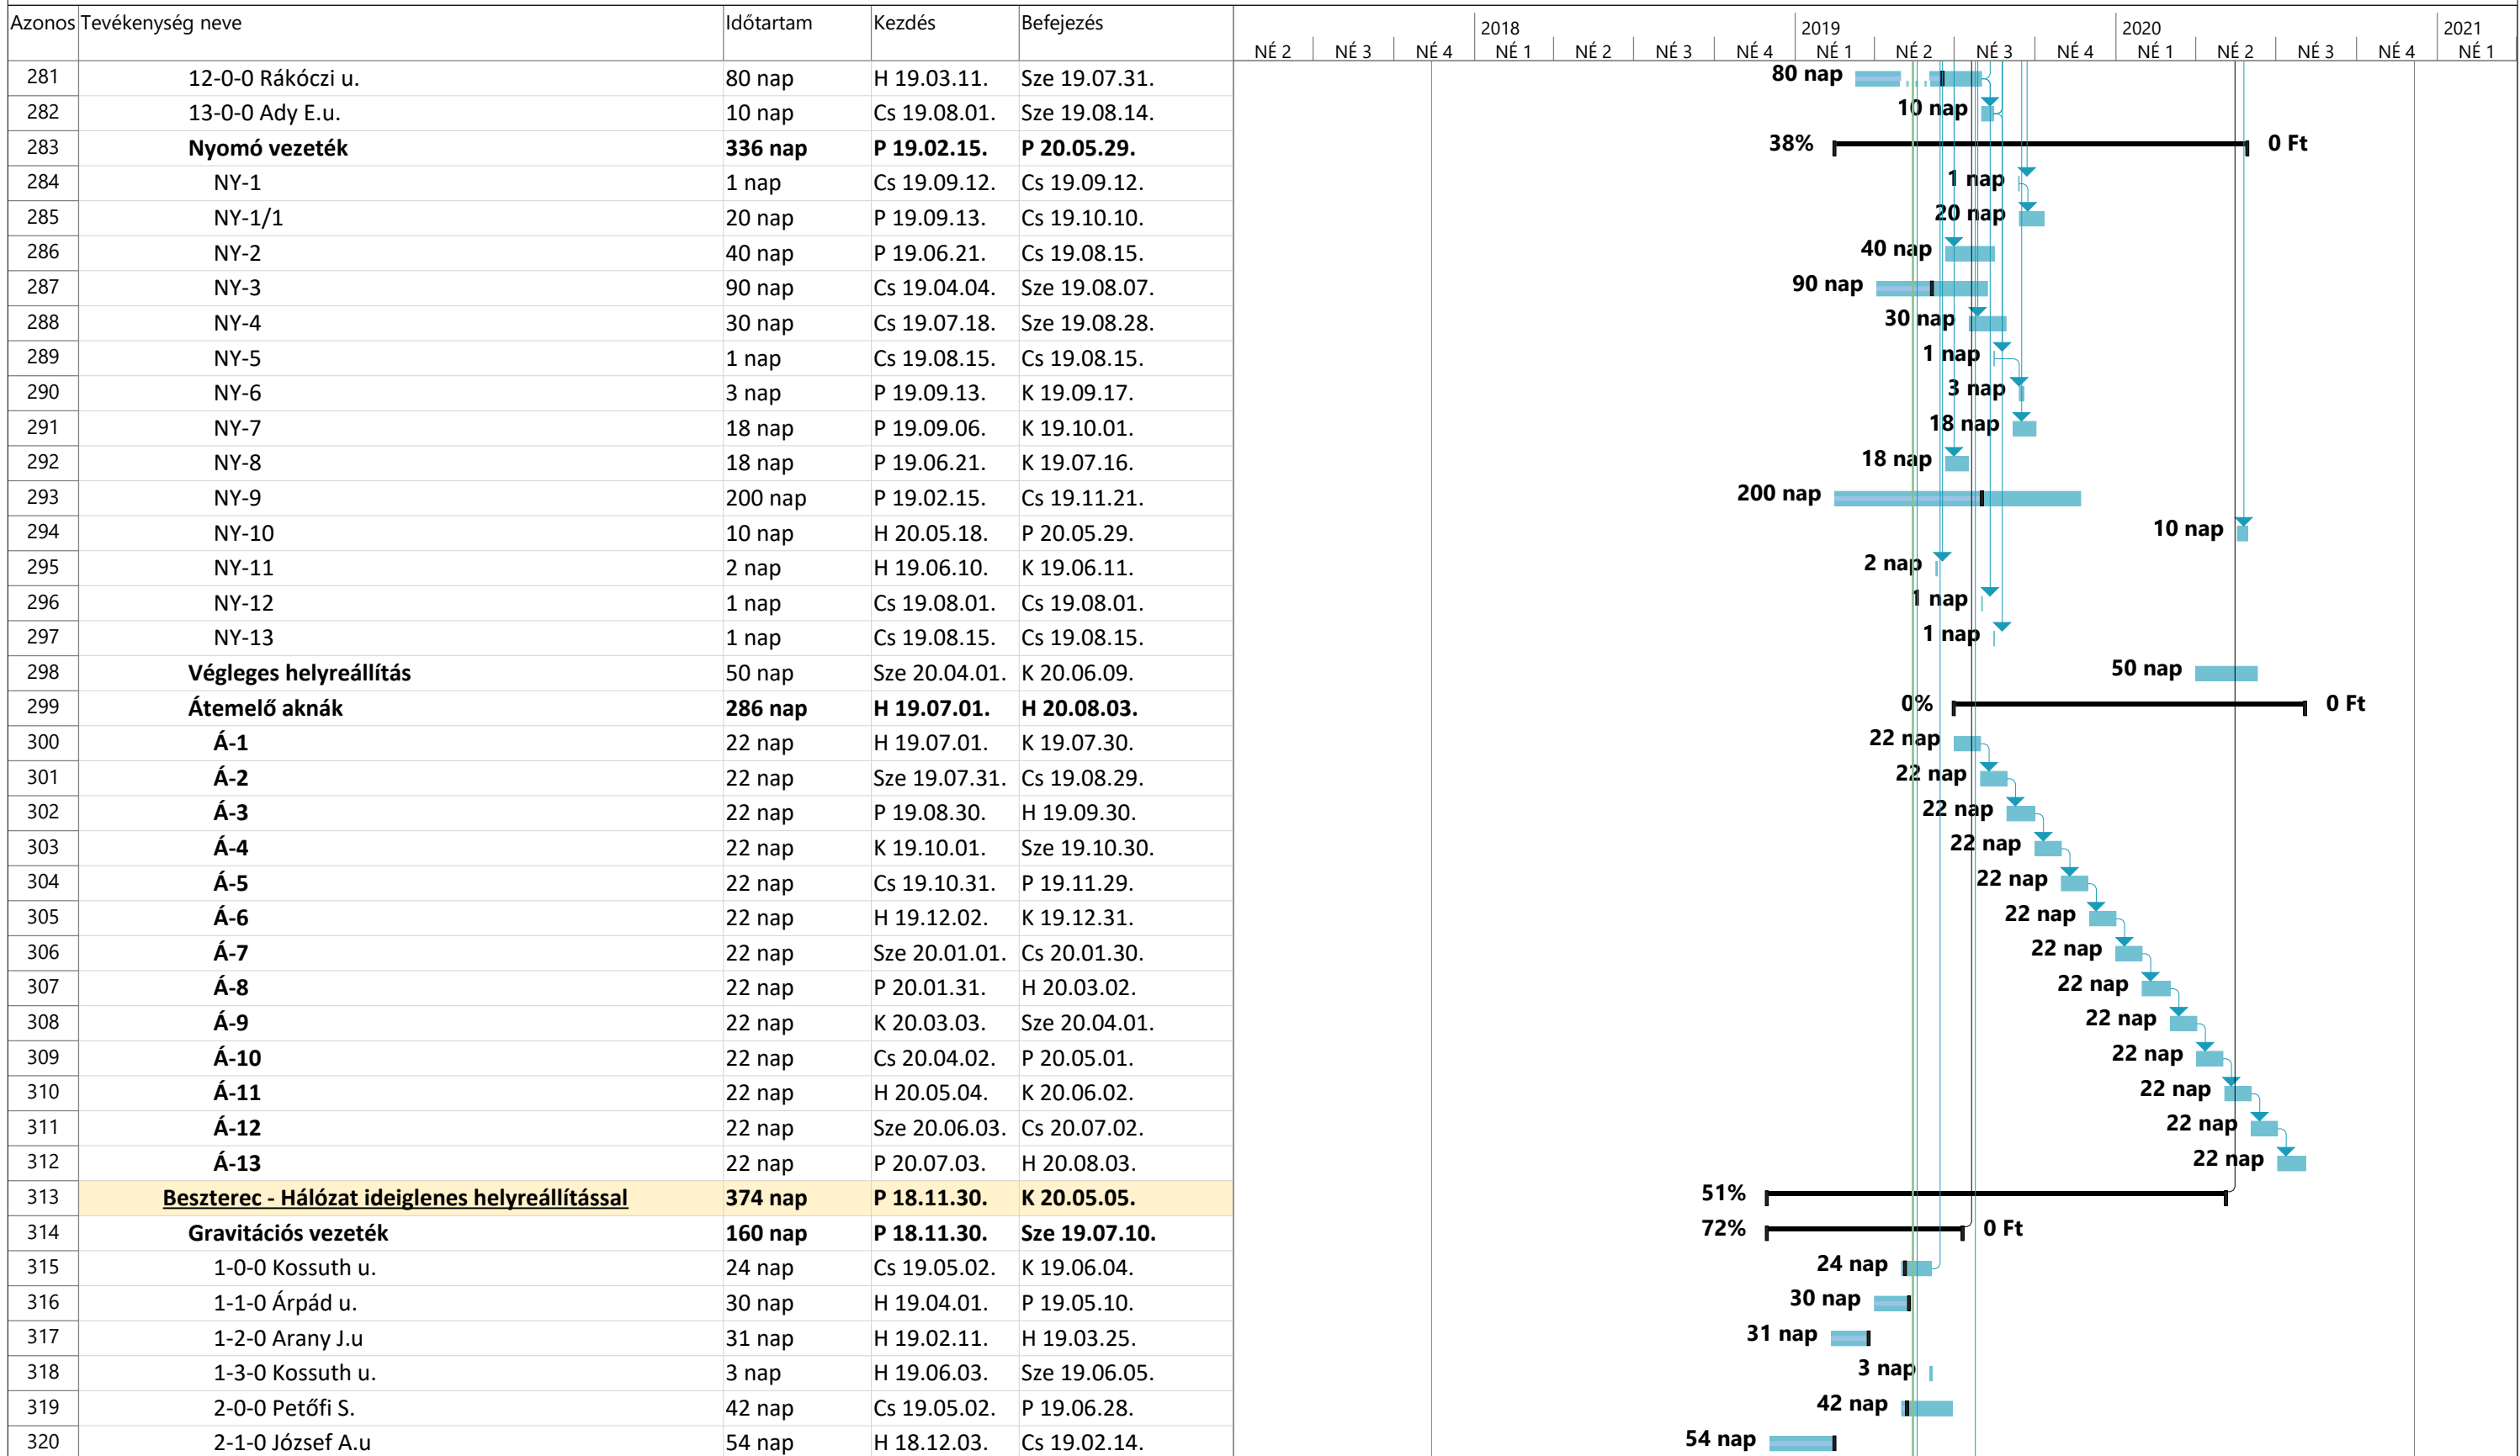






**Műszaki és tervezési ütemterv**


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021					
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1		
321	2-1-1 Dózsa Gy.u	46 nap	H 18.12.03.	H 19.02.04.																		
322	2-1-1-1 Új u.	5 nap	P 18.11.30.	Cs 18.12.06.																		
323	2-2-0 Petőfi S. u	27 nap	Sze 19.04.03.	Cs 19.05.09.																		
324	2-3-0 910 hrsz	3 nap	P 19.06.07.	K 19.06.11.																		
325	2-4-0 Petőfi S.u	2 nap	Sze 19.06.12.	Cs 19.06.13.																		
326	2-4-0 366 hrsz	4 nap	P 19.06.14.	Sze 19.06.19.																		
327	3-0-0 Táncsics M. u.	41 nap	Szo 18.12.15.	P 19.02.08.																		
328	3-1-0 Széchenyi u.	8 nap	Sze 19.02.06.	P 19.02.15.																		
329	4-0-0 Kossuth u.	18 nap	H 19.06.17.	Sze 19.07.10.																		
330	4-1-0 Kossuth u.	8 nap	Cs 19.06.06.	H 19.06.17.																		
331	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>210 nap</b>	<b>P 18.12.14.</b>	<b>Sze 19.10.02.</b>																		
332	<b>NY-1</b>	60 nap	H 19.04.29.	P 19.07.19.																		
333	<b>NY-2</b>	60 nap	Cs 19.01.17.	Sze 19.04.10.																		
334	<b>NY-3</b>	98 nap	P 18.12.14.	H 19.04.29.																		
335	<b>NY-4</b>	60 nap	Cs 19.07.11.	Sze 19.10.02.																		
336	<b>Végleges helyreállítás</b>	30 nap	Sze 20.03.25.	K 20.05.05.																		
337	<b>Átemelő aknák</b>	<b>120 nap</b>	<b>Cs 19.06.20.</b>	<b>Sze 19.12.04.</b>																		
338	<b>Á-1</b>	<b>60 nap</b>	<b>Cs 19.06.20.</b>	<b>Sze 19.09.11.</b>																		
339	Építészeti munkák	20 nap	Cs 19.06.20.	Sze 19.07.17.																		
340	Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.07.18.	Sze 19.08.14.																		
341	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 19.08.15.	Sze 19.09.11.																		
342	<b>Á-2</b>	<b>60 nap</b>	<b>Cs 19.07.18.</b>	<b>Sze 19.10.09.</b>																		
343	Építészeti munkák	20 nap	Cs 19.07.18.	Sze 19.08.14.																		
344	Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.08.15.	Sze 19.09.11.																		
345	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 19.09.12.	Sze 19.10.09.																		
346	<b>Á-3</b>	<b>60 nap</b>	<b>Cs 19.08.15.</b>	<b>Sze 19.11.06.</b>																		
347	Építészeti munkák	20 nap	Cs 19.08.15.	Sze 19.09.11.																		
348	Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.09.12.	Sze 19.10.09.																		
349	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 19.10.10.	Sze 19.11.06.																		
350	<b>Á-4</b>	<b>60 nap</b>	<b>Cs 19.09.12.</b>	<b>Sze 19.12.04.</b>																		
351	Építészeti munkák	20 nap	Cs 19.09.12.	Sze 19.10.09.																		
352	Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.10.10.	Sze 19.11.06.																		
353	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 19.11.07.	Sze 19.12.04.																		
354	<b>Újdombrád - Hálózat ideiglenes helyreállítással</b>	<b>392 nap</b>	<b>P 18.11.02.</b>	<b>Cs 20.04.30.</b>																		
355	<b>Gravitációs vezeték</b>	<b>264 nap</b>	<b>P 18.11.02.</b>	<b>H 19.11.04.</b>																		
356	1-0-0 Fő u.	6 nap	K 19.10.01.	K 19.10.08.																		
357	1-0-0 József A.u	79 nap	H 18.11.26.	Cs 19.03.14.																		
358	1-1-0 Virág u.	18 nap	P 18.11.02.	K 18.11.27.																		
359	1-1-0 336 sz u	7 nap	H 18.11.19.	K 18.11.27.																		

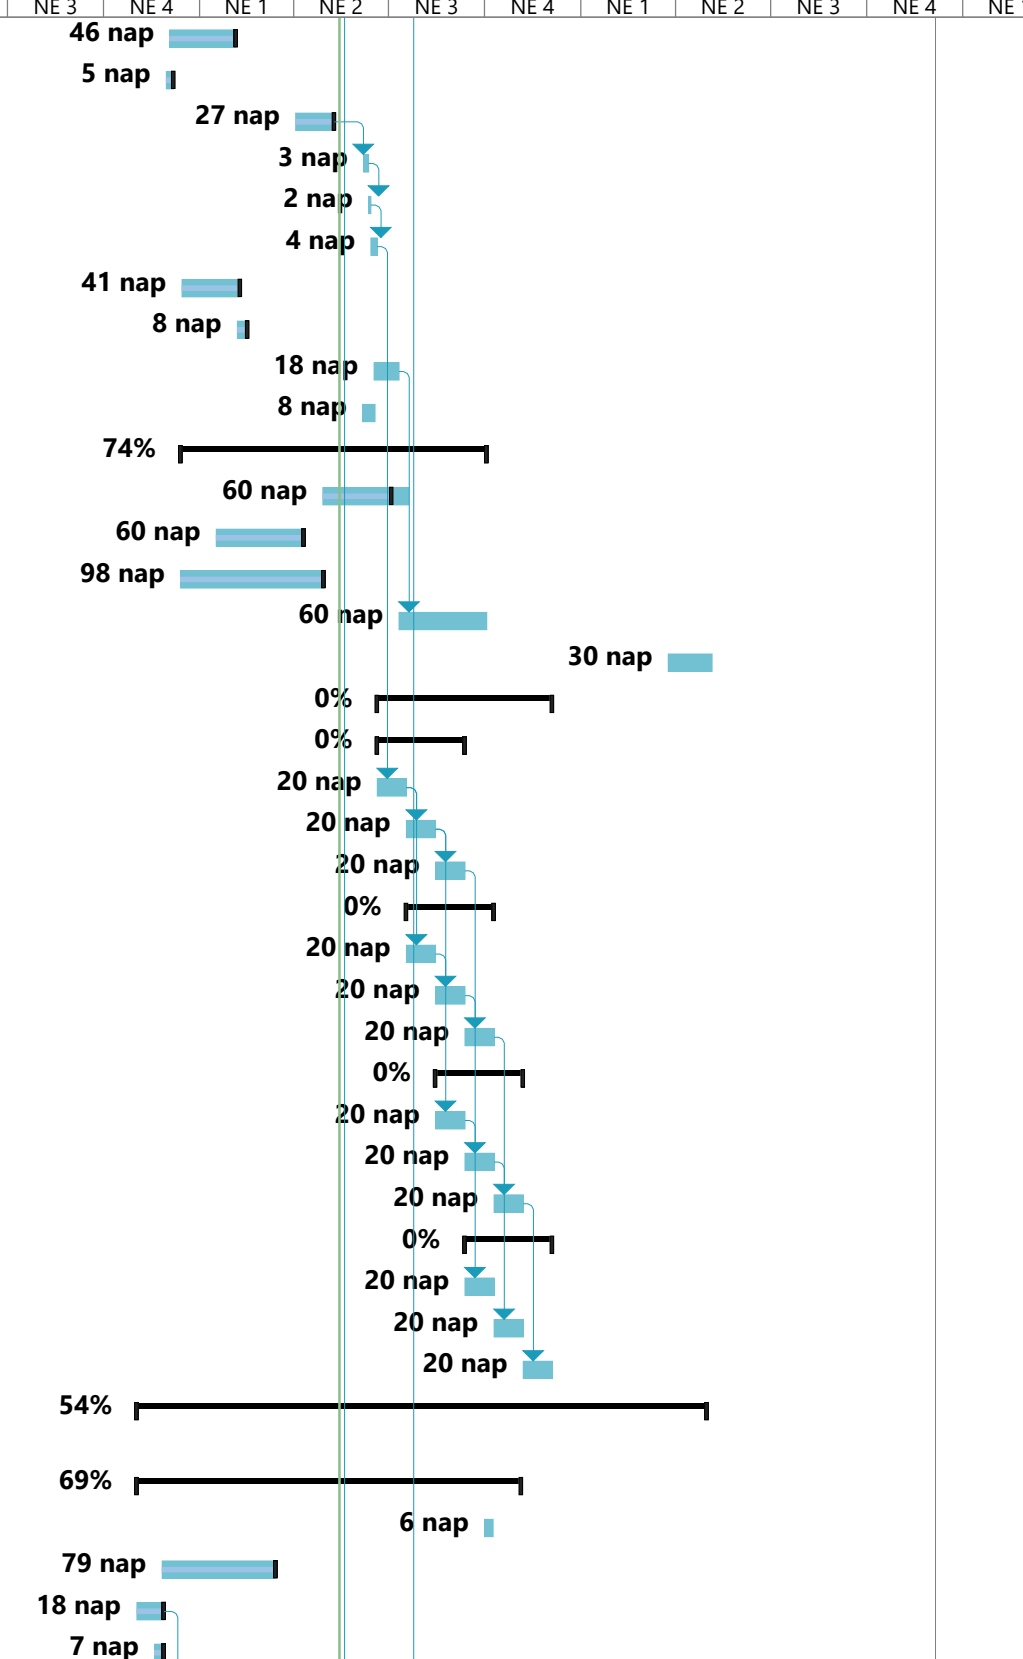



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	
360	1-2-0 Szabadság u.	9 nap	K 18.12.11.	Cs 18.12.20.																
361	2-0-0 Szabadság u.	40 nap	Sze 19.04.17.	K 19.06.11.																
362	2-0-0 Templom u.	25 nap	H 19.02.11.	P 19.03.15.																
363	2-0-0 Iskola u.	2 nap	P 19.02.22.	H 19.02.25.																
364	2-1-0 Szabadság u.	6 nap	K 19.02.12.	K 19.02.19.																
365	2-2-0 Templom u	28 nap	K 19.01.08.	Cs 19.02.14.																
366	2-3-0 Iskola u.	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.																
367	2-3-0 Napsugár u	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.																
368	2-4-0 Templom u	4 nap	K 19.02.05.	P 19.02.08.																
369	2-4-0 Fő u.	21 nap	K 19.10.01.	K 19.10.29.																
370	2-4-1 Dobi u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.																
371	2-4-2 Fő u.	2 nap	K 19.10.01.	Sze 19.10.02.																
372	2-5-0 Szabadság u.	5 nap	H 19.02.18.	P 19.02.22.																
373	2-5-0 Fő u.	25 nap	K 19.10.01.	H 19.11.04.																
374	2-5-1 Fő u.	7 nap	K 19.10.01.	Sze 19.10.09.																
375	2-5-2 Iskola u.	10 nap	P 19.03.01.	Cs 19.03.14.																
376	<b>Nyomó vezeték</b>	<b>66 nap</b>	<b>Cs 18.12.13.</b>	<b>Sze 19.03.13.</b>																
377	<b>NY-1</b>	50 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.02.20.																
378	<b>NY-2</b>	20 nap	Cs 19.02.14.	Sze 19.03.13.																
379	<b>Végleges helyreállítás</b>	30 nap	P 20.03.20.	Cs 20.04.30.																
380	<b>Átemelő</b>	<b>80 nap</b>	<b>Cs 19.08.01.</b>	<b>Sze 19.11.20.</b>																
381	<b>Á-1</b>	<b>60 nap</b>	<b>Cs 19.08.01.</b>	<b>Sze 19.10.23.</b>																
382	Építészeti munkák	20 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.08.28.																
383	Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.08.29.	Sze 19.09.25.																
384	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 19.09.26.	Sze 19.10.23.																
385	<b>Á-1</b>	<b>60 nap</b>	<b>Cs 19.08.29.</b>	<b>Sze 19.11.20.</b>																
386	Építészeti munkák	20 nap	Cs 19.08.29.	Sze 19.09.25.																
387	Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.09.26.	Sze 19.10.23.																
388	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 19.10.24.	Sze 19.11.20.																
389	<u>Telep</u>	<b>368 nap</b>	<b>H 19.05.20.</b>	<b>Sze 20.10.14.</b>																
390	Kivitelezési munkák	240 nap	H 19.05.20.	P 20.04.17.																
391	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.18.	Sze 20.10.14.																
392	<b>Cigánd-Tiszakarád</b>	<b>328 nap</b>	<b>Cs 19.07.25.</b>	<b>H 20.10.26.</b>																
393	<u>Telep</u>	<b>328 nap</b>	<b>Cs 19.07.25.</b>	<b>H 20.10.26.</b>																
394	Kivitelezési munkák	200 nap	Cs 19.07.25.	Sze 20.04.29.																
395	Próbaüzem	180 nap	Cs 20.04.30.	H 20.10.26.																
396	<b>Projekt zárása</b>	28 nap	Cs 20.10.29.	Szo 20.12.05.																

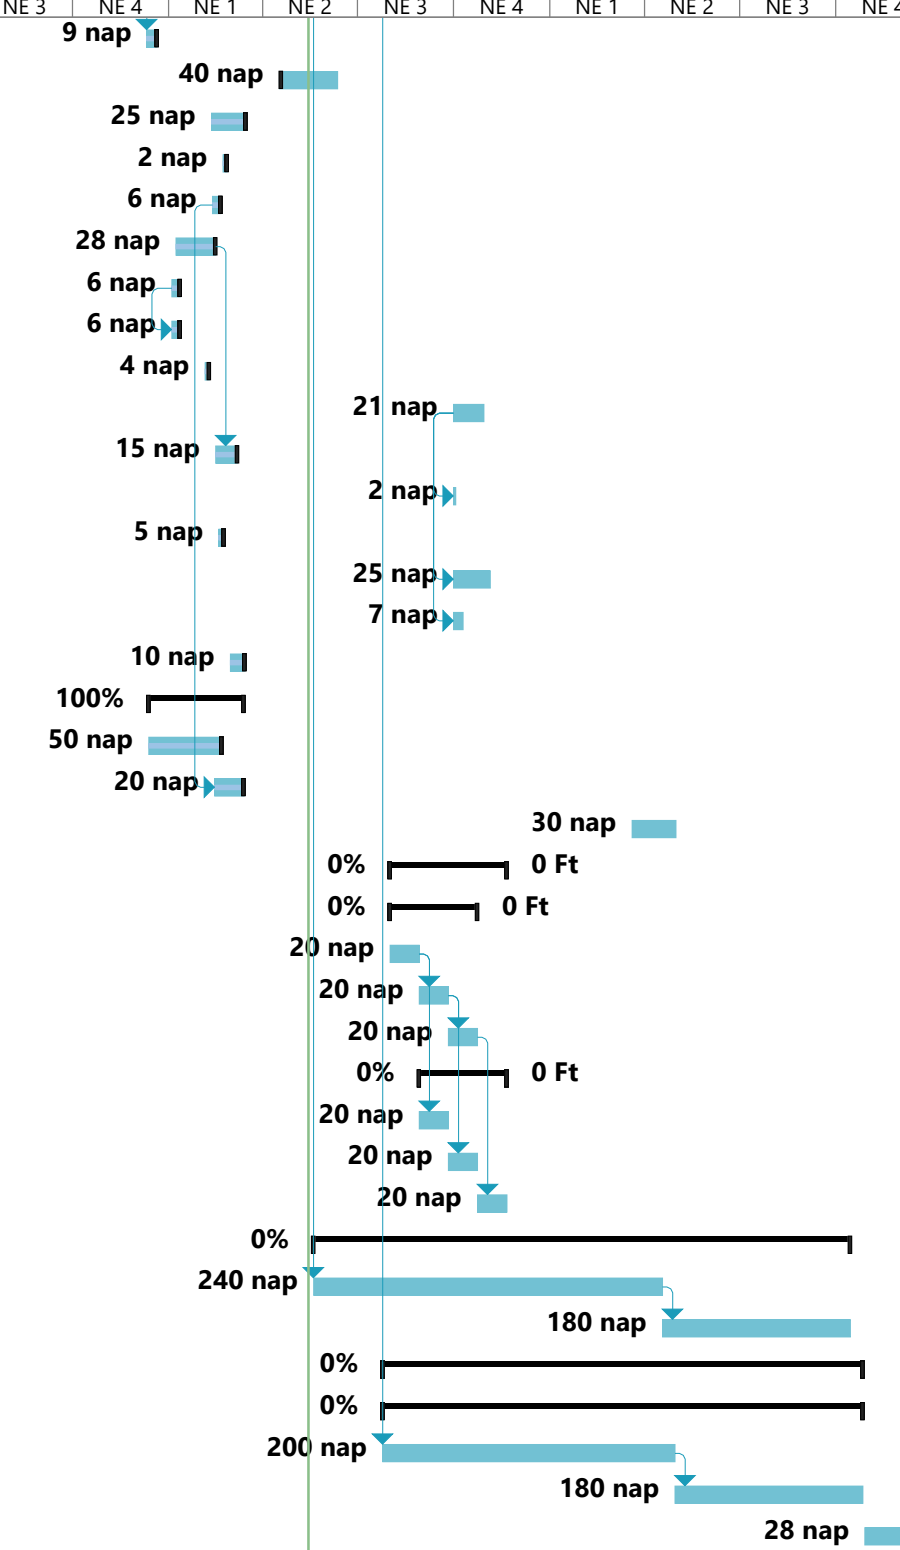

VÁLLALKOZÓ

VEZETŐ MŰSZAKI ELLENŐR

MÉRNÖK
