Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
1		**ÉKMO2 Projekt várható ütemezése**	1096 nap	Sze 17.12.06.	Szo 20.12.05.
2		**ÉKMO2 projekt lebonyolítás ütemezése**		**K 17.12.12.**	**Szo 20.12.05.**
3		**Munkaterület átadás tervezési munkákra**	1 nap	K 17.12.12.	K 17.12.12.
4		**Tervezési munkák**	**440 nap**	**Sze 17.12.13.**	**Sze 19.08.28.**
5		**Hálózat**	**422 nap**	**Sze 17.12.13.**	**P 19.08.02.**
6		Jánd	67 nap	K 18.01.23.	Sze 18.05.02.
7		Aranyosapáti	79 nap	Sze 18.01.17.	H 18.05.14.
8		Mándok	377 nap	H 18.02.12.	P 19.08.02.
9		Gávavencsellő	165 nap	Sze 17.12.13.	Sze 18.08.08.
10		Tiszatelek	220 nap	Sze 17.12.13.	P 18.10.26.
11		Beszterec	187 nap	Sze 17.12.13.	H 18.09.10.
12		Újdombrád	181 nap	Sze 17.12.13.	P 18.08.31.
13		**Telep**	**411 nap**	**K 18.01.23.**	**Sze 19.08.28.**
14		Cigánd	297 nap	K 18.07.10.	Sze 19.08.28.
15		Vásárosnamény-Gergelyiugornya	188 nap	Cs 18.03.08.	Cs 18.12.06.
16		Aranyosapáti	225 nap	P 18.01.26.	Sze 18.12.19.
17		Mándok	101 nap	K 18.05.29.	H 18.10.29.
18		Gávavencsellő	185 nap	Sze 18.01.31.	H 18.10.29.
19		Tiszatelek	270 nap	K 18.01.23.	Cs 19.02.14.
20		**Kiviteli tervek jóváhagyása**	**379 nap**	**Sze 18.05.09.**	**H 19.10.21.**
21		**Hálózat**	**379 nap**	**Sze 18.05.09.**	**H 19.10.21.**
22		Jánd	3 nap	Sze 18.05.09.	P 18.05.11.
23		Aranyosapáti	4 nap	K 18.05.15.	P 18.05.18.
24		Mándok	1 nap	H 19.10.21.	H 19.10.21.
25		Gávavencsellő	1 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.
26		Tiszatelek	5 nap	H 18.12.10.	P 18.12.14.
27		Beszterec	10 nap	K 18.09.11.	P 18.09.21.
28		Újdombrád	10 nap	H 18.09.03.	P 18.09.14.
29		**Telep**	**237 nap**	**K 18.10.16.**	**Sze 19.09.11.**
30		Cigánd	10 nap	Cs 19.08.29.	Sze 19.09.11.
31		Vásárosnamény-Gergelyiugornya	10 nap	P 18.12.14.	Sze 18.12.26.
32		Aranyosapáti	10 nap	Cs 18.12.20.	Sze 19.01.02.
33		Mándok	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.
34		Gávavencsellő	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.
35		Tiszatelek	10 nap	P 19.02.15.	Cs 19.02.28.
36		**Munkaterület átadása**	**386 nap**	**Sze 18.03.14.**	**Cs 19.09.12.**
37		**Hálózat**	**212 nap**	**Sze 18.03.14.**	**H 19.01.14.**
38		Jánd	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.
39		Aranyosapáti	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.

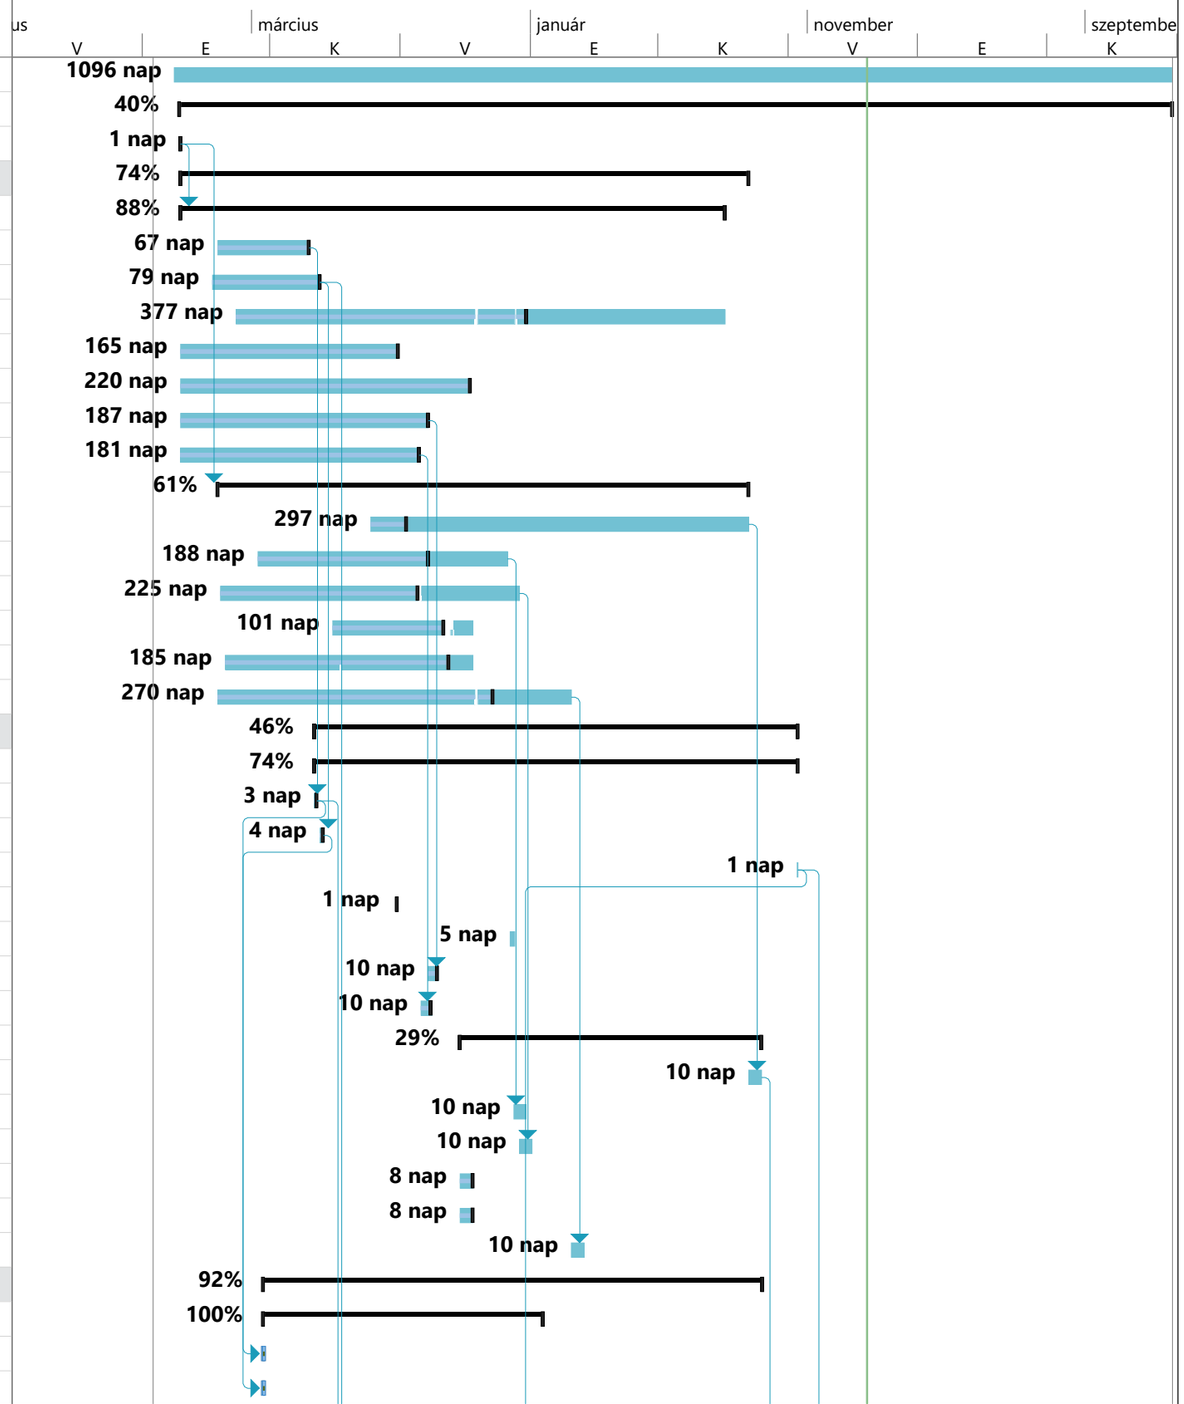

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
40		Mándok	1 nap	H 19.01.14.	H 19.01.14.
41		Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.06.07.	Cs 18.06.07.
42		Tiszatelek	1 nap	K 18.10.16.	K 18.10.16.
43		Beszterec	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.
44		Újdombrád	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.
45		**Telep**	**232 nap**	**P 18.10.26.**	**Cs 19.09.12.**
46		Cigánd	1 nap	Cs 19.09.12.	Cs 19.09.12.
47		Vásárosnamény-Gergelyiugornya	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.
48		Aranyosapáti	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.
49		Mándok	1 nap	P 18.10.26.	P 18.10.26.
50		Gávavencsellő	1 nap	K 18.12.11.	K 18.12.11.
51		Tiszatelek	1 nap	H 18.11.19.	H 18.11.19.
52		**Kivitelezési munkák elkezdése**	**654 nap**	**H 18.06.04.**	**Sze 20.12.02.**
53		**Jánd - Vásárosnamény**	**604 nap**	**H 18.06.04.**	**Sze 20.09.23.**
54		**Hálózat ideiglenes helyreállítással**	**520 nap**	**H 18.06.04.**	**Cs 20.05.28.**
55		**Gravitációs vezeték**	**194 nap**	**H 18.06.04.**	**P 19.03.01.**
56		1-0-0 - Petőfi, Árpád u.	47 nap	H 18.06.04.	K 18.08.07.
57		1-1-0 - Árpád, Rákóczi u.	30 nap	P 18.08.10.	Cs 18.09.20.
58		1-1-1 - Rákóczi u.	3 nap	K 18.09.11.	Cs 18.09.13.
59		1-2-0 - Ady Endre u.	3 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.
60		2-0-0 - Kossuth, Szabadság, Arany u.	56 nap	K 18.07.10.	K 18.09.25.
61		2-1-0 - Jókai u.	7 nap	H 18.11.12.	K 18.11.20.
62		2-2-0 - Jókai, Béke u.	19 nap	K 18.11.13.	P 18.12.07.
63		2-2-1 - Dózsa, Béke	59 nap	H 18.12.10.	Cs 19.02.28.
64		2-2-1-1 - Béke u.	7 nap	P 18.11.30.	H 18.12.10.
65		2-2-2 - Jókai u	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.
66		2-3-0 - 289 hrsz u.	24 nap	Sze 18.10.03.	P 18.11.09.
67		2-4-0 - Kossuth u.	17 nap	H 18.07.09.	K 18.07.31.
68		2-5-0 - Arany J u.	4 nap	K 18.09.04.	P 18.09.07.
69		2-6-0 - Arany, Jókai u.	7 nap	P 18.08.24.	H 18.09.03.
70		3-0-0 - Rákóczi, Tisza, Hunyadi u.	105 nap	K 18.10.02.	P 19.03.01.
71		3-1-0 - Rákóczi u.	9 nap	P 18.10.26.	P 18.11.09.
72		3-2-0 - Rákóczi u.	6 nap	Cs 18.10.04.	Cs 18.10.11.
73		3-3-0 - Bajcsi Zs.u.	12 nap	H 19.02.11.	K 19.02.26.
74		3-4-0 - Tisza u.	10 nap	Cs 18.12.06.	Sze 18.12.19.
75		**Nyomó vezeték**	**227 nap**	**K 18.06.05.**	**Cs 19.04.18.**
76		NY-1 - Arpád, Petőfi u., külterület.	225 nap	K 18.06.05.	Cs 19.04.18.
77		NY-2 - Jókai u.	7 nap	Cs 18.10.04.	P 18.10.12.
78		NY-3 - Rákóczi u.	26 nap	H 18.10.01.	Sze 19.02.20.

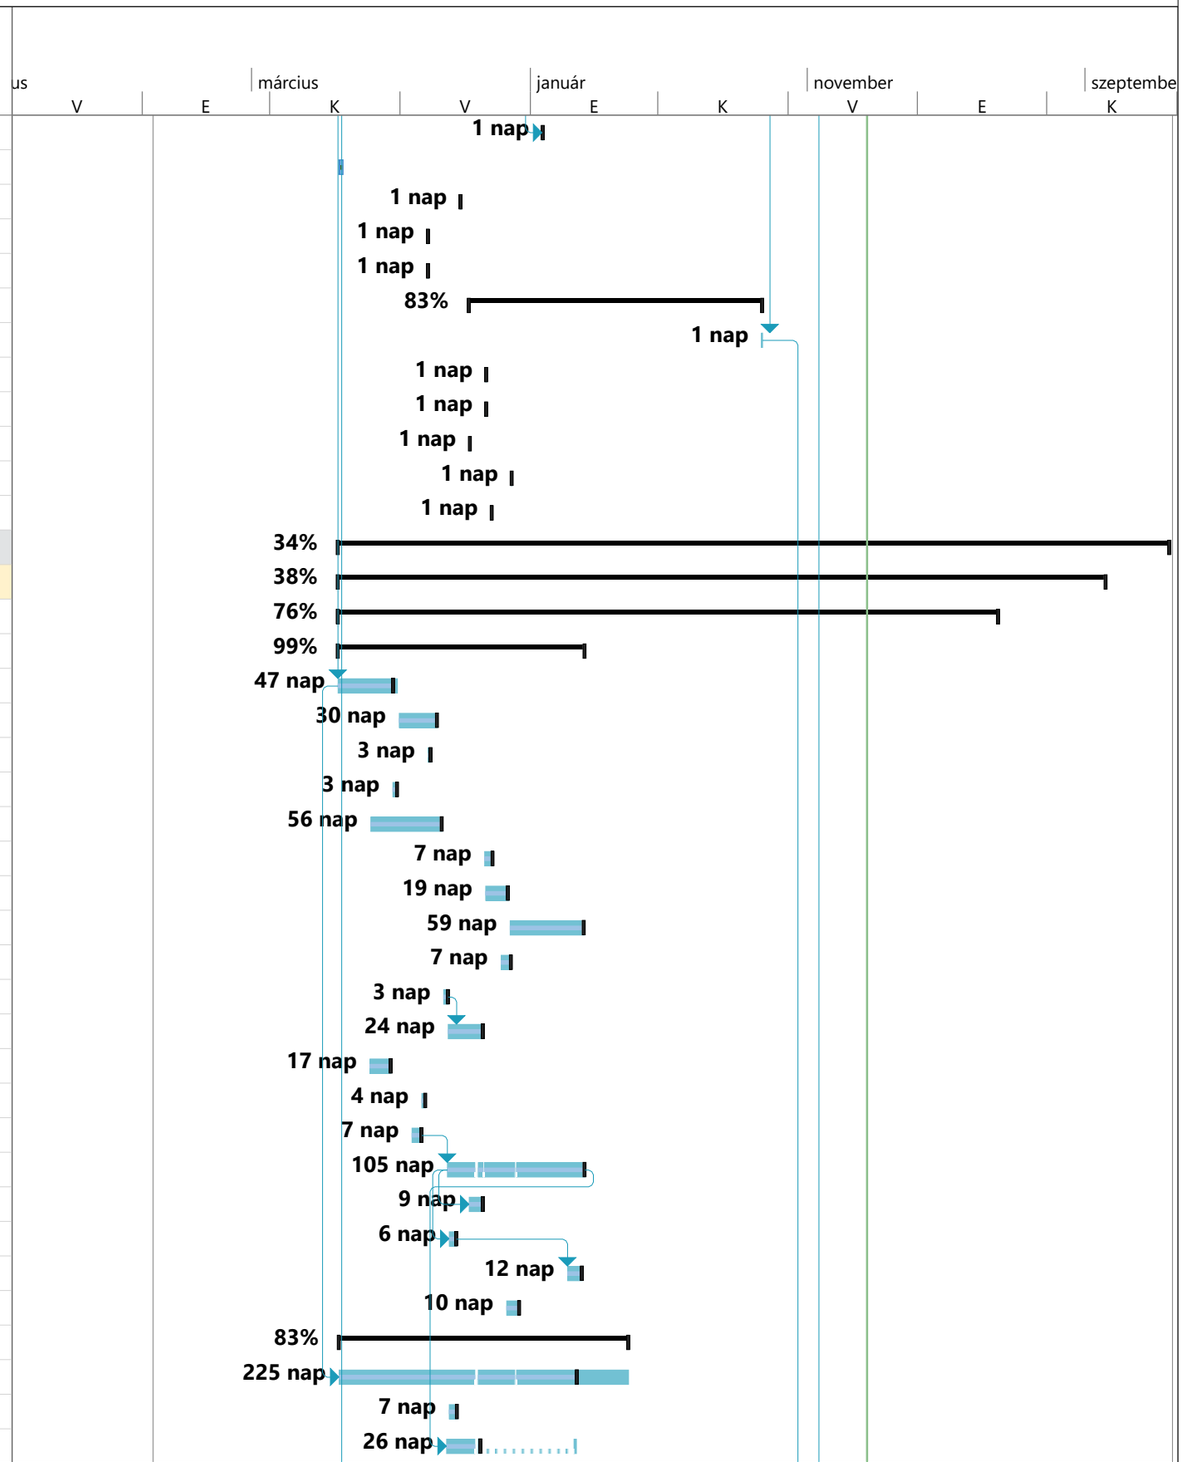

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
79		**Végleges helyreállítás**	50 nap	P 20.03.20.	Cs 20.05.28.
80		**Átemelő**	**127 nap**	**Cs 19.10.03.**	**P 20.03.27.**
81		**Á-1**	**107 nap**	**Cs 19.10.03.**	**P 20.02.28.**
82		Építészeti munkák	14 nap	Cs 19.10.03.	K 19.10.22.
83		Gépészeti munkák	10 nap	H 20.01.20.	P 20.01.31.
84		Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	H 20.02.17.	P 20.02.28.
85		**Á-2**	**117 nap**	**Cs 19.10.03.**	**P 20.03.13.**
86		Építészeti munkák	14 nap	Cs 19.10.03.	K 19.10.22.
87		Gépészeti munkák	10 nap	H 20.02.03.	P 20.02.14.
88		Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	H 20.03.02.	P 20.03.13.
89		**Á-3**	**127 nap**	**Cs 19.10.03.**	**P 20.03.27.**
90		Építészeti munkák	14 nap	Cs 19.10.03.	K 19.10.22.
91		Gépészeti munkák	10 nap	Sze 19.10.23.	K 19.11.05.
92		Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	H 20.03.16.	P 20.03.27.
93		**Telep**	**349 nap**	**H 19.05.27.**	**Sze 20.09.23.**
94		Szociális és kezelő épület építése	174 nap	Sze 19.06.05.	P 20.01.31.
95		I. Reaktor építése	151 nap	H 19.05.27.	P 19.12.20.
96		II. Reaktor építése	110 nap	P 19.06.21.	Sze 19.11.20.
97		Utóülepítő medence építése	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.
98		Fertőtlenítő medence építése	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.
99		Iszapstabilizáló-sűrítő építése	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.
100		Csurgalékvíz átemelő építése	10 nap	H 20.01.20.	P 20.01.31.
101		Tisztított szennyvíz átemelő építése	10 nap	H 20.01.20.	P 20.01.31.
102		Egyéb műtárgyak építése	**20 nap**	**H 20.01.20.**	**P 20.02.14.**
103		Vassó tároló, Vízmérőműtárgyak, Osztóakna 1-2, Motorostolózár akna,	20 nap	H 20.01.20.	P 20.02.14.
104		Udvartéri vezetékek, közművek	30 nap	Cs 20.01.16.	Sze 20.02.26.
105		Technológiai gépészeti szerelés	40 nap	Cs 20.01.16.	Sze 20.03.11.
106		Elektromos erős-gyengeáram és irányítástechnikai szerelések	40 nap	Cs 20.01.30.	Sze 20.03.25.
107		Kerítés, térburkolat építés, csapadékvíz-tereprendezés	60 nap	Cs 20.03.05.	Sze 20.05.27.
108		Üzempróbák	10 nap	Cs 20.03.26.	Sze 20.04.08.
109		Próbaüzem	120 nap	Cs 20.04.09.	Sze 20.09.23.
110		**Aranyosapáti**	**581 nap**	**K 18.06.12.**	**H 20.08.31.**
111		**Hálózat ideiglenes helyreállítással**	**472 nap**	**K 18.06.12.**	**K 20.03.31.**
112		**Gravitációs vezeték**	**440 nap**	**K 18.06.12.**	**P 20.02.14.**
113		1-0-0 - Kossuth u.	80 nap	H 18.06.18.	P 18.10.05.
114		1-1-0 - Kossuth u.	8 nap	Sze 19.07.10.	P 19.07.19.

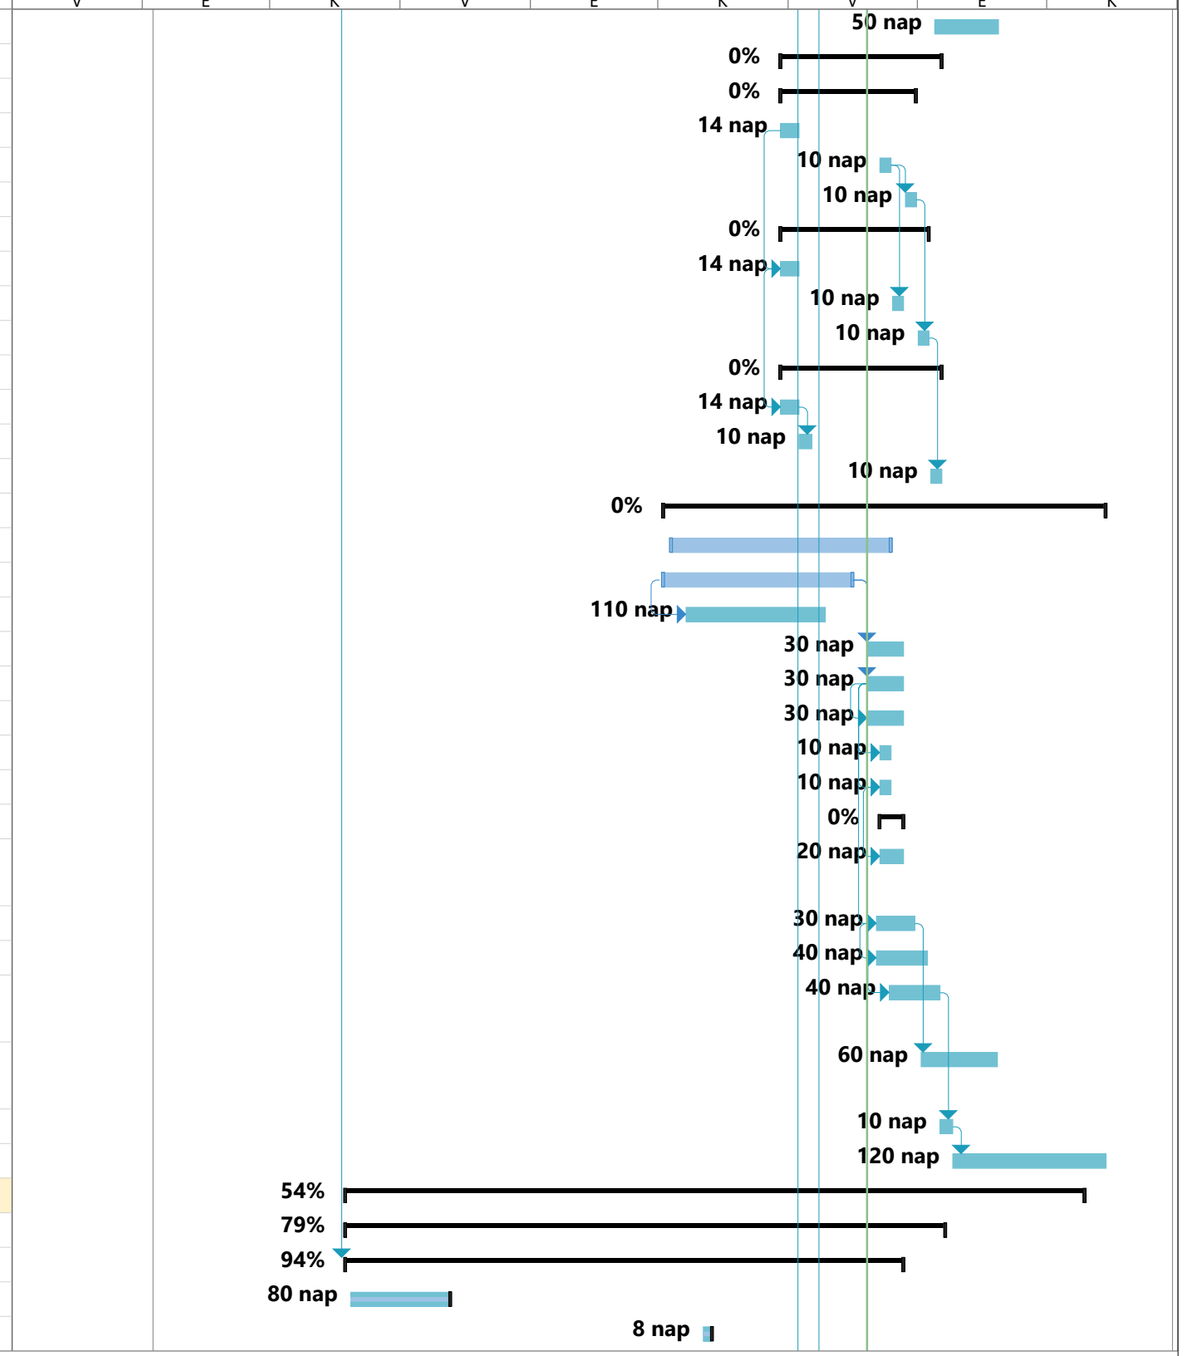

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
115		1-1-1 - Kossuth u.	2 nap	H 19.12.09.	K 19.12.10.
116		1-2-0 - Bocskai u.	5 nap	P 18.08.24.	Cs 18.08.30.
117		2-0-0 - Esze Tamás	337 nap	H 18.09.17.	K 19.12.31.
118		2-1-0 - Vasút u.	152 nap	H 19.06.03.	K 19.12.31.
119		2-1-1 - Vasút u.	27 nap	H 19.06.03.	K 19.07.09.
120		2-1-2 - Bercsényi u.	30 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.09.11.
121		2-1-3 - Hunyadi u.	40 nap	Sze 19.11.27.	K 20.01.21.
122		2-1-3-1 - Vasút u.	2 nap	Cs 19.06.06.	P 19.06.07.
123		2-2-0 - Kossuth u.	34 nap	H 19.06.10.	Cs 19.07.25.
124		2-3-0 - Petőfi u.	43 nap	Sze 19.05.08.	Cs 19.07.04.
125		2-3-1 - Petőfi u.	20 nap	H 19.12.09.	P 20.01.03.
126		2-4-0 - Bajcsi Zs.	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.
127		3-0-0 - Honvéd u.	255 nap	K 18.06.12.	H 19.06.03.
128		3-1-0 - Béke u.	2 nap	P 18.06.22.	H 18.06.25.
129		3-2-0 - Lenin u.	30 nap	H 19.02.11.	P 19.03.22.
130		4-0-0 - Petőfi u., József A.	27 nap	K 18.10.09.	K 18.11.20.
131		4-1-0 - József A.u.	37 nap	K 19.04.23.	K 19.06.11.
132		4-2-0 - József, Arany u.	70 nap	H 18.09.03.	Sze 18.12.12.
133		4-2-1 - Arany J. u.	4 nap	Cs 18.06.21.	K 18.06.26.
134		4-2-2 - Kölcsey u.	4 nap	H 18.09.17.	Cs 18.09.20.
135		4-3-0 - Temető u.	10 nap	H 19.04.08.	P 19.04.19.
136		4-4-0 - Táncsics	27 nap	H 19.02.18.	K 19.03.26.
137		4-5-0 - Jókai u.	10 nap	K 19.03.26.	H 19.04.08.
138		**Nyomó vezeték**	**322 nap**	**K 18.10.09.**	**K 19.12.31.**
139		NY-1 - Kossuth u.	20 nap	P 19.07.12.	Cs 19.08.08.
140		NY-2 - Vasút u.	20 nap	P 19.07.26.	Cs 19.08.22.
141		NY-3 - Vasút u.	88 nap	H 19.09.02.	K 19.12.31.
142		NY-4 - József A. u.	45 nap	K 18.10.09.	Cs 18.12.13.
143		**Végleges helyreállítás**	127 nap	H 19.10.07.	K 20.03.31.
144		**Átemelő**	**366 nap**	**Sze 18.09.26.**	**K 20.02.18.**
145		**Á-1**	**103 nap**	**Cs 19.09.19.**	**P 20.02.07.**
146		Építészeti munkák	3 nap	Cs 19.09.19.	H 19.09.23.
147		Gépészeti munkák	20 nap	H 19.12.16.	P 20.01.10.
148		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 20.01.13.	P 20.02.07.
149		**Á-2**	**103 nap**	**H 19.09.16.**	**K 20.02.04.**
150		Építészeti munkák	3 nap	H 19.09.16.	Sze 19.09.18.
151		Gépészeti munkák	20 nap	Sze 19.12.11.	K 20.01.07.
152		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Sze 20.01.08.	K 20.02.04.
153		**Á-3**	**103 nap**	**Szo 19.09.28.**	**K 20.02.18.**

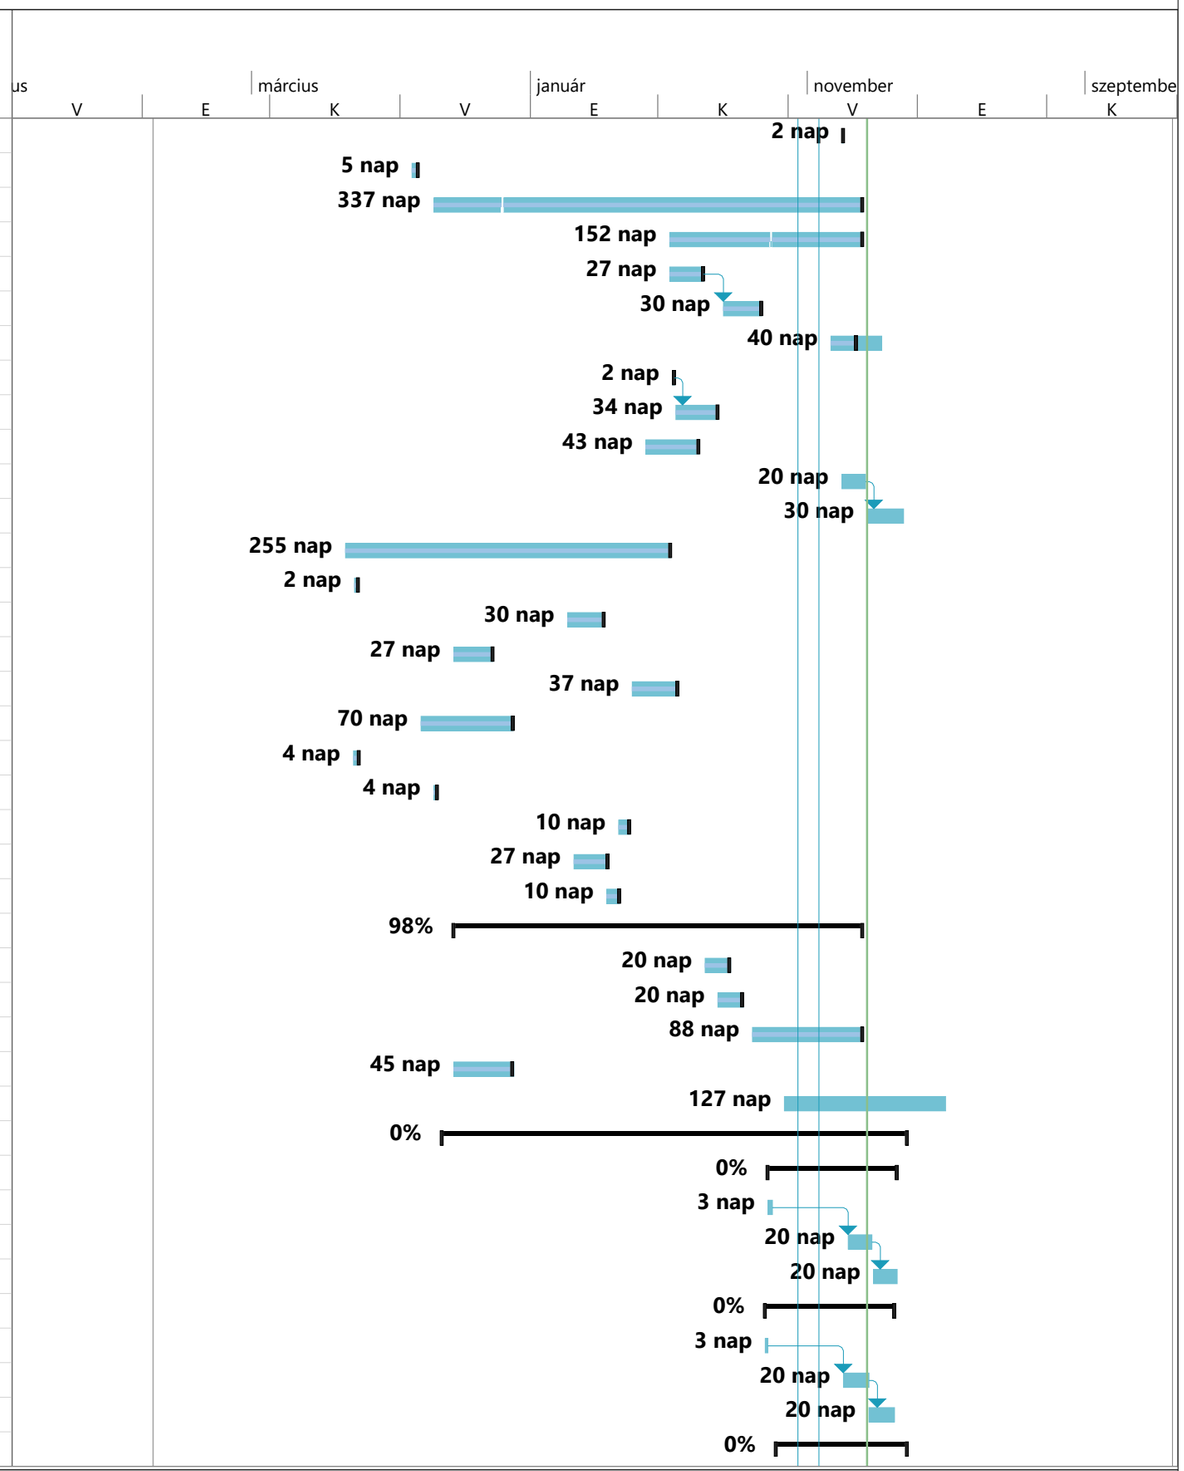

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
154		Építészeti munkák	3 nap	Szo 19.09.28.	K 19.10.01.
155		Gépészeti munkák	20 nap	Sze 19.12.25.	K 20.01.21.
156		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Sze 20.01.22.	K 20.02.18.
157		**Á-4**	**72 nap**	**Sze 18.09.26.**	**P 19.01.04.**
158		Építészeti munkák	2 nap	Sze 18.09.26.	Cs 18.09.27.
159		Gépészeti munkák	20 nap	K 18.11.13.	H 18.12.10.
160		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	K 18.12.11.	P 19.01.04.
161		**Telep**	**347 nap**	**K 19.05.07.**	**H 20.08.31.**
162		Föld feltöltés	75 nap	H 19.05.20.	P 19.08.30.
163		Biológiai reaktor építése	61 nap	K 19.05.07.	H 19.07.29.
164		Iszaptároló építése	70 nap	Sze 19.08.14.	H 19.11.18.
165		Utak, járdák, kerítés építése, füvesítés	140 nap	K 19.10.01.	H 20.04.13.
166		Udvartéri vezetékek, műtárgy gépészet, rácsok, korlátok, fedlapok gyártása, szerelése	120 nap	Cs 19.08.01.	K 20.01.14.
167		Műtárgyak építése (csurgalékvíz átemelő, fertőtlenítő medence, tisztított szennyvíz átemelő, szennyvízátemelő, szennyvízmérő akna, ivóvízmérő akna)	59 nap	Sze 19.07.10.	Szo 19.09.28.
168		Kezelőépület építészet gépészet	100 nap	K 19.09.10.	P 20.01.24.
169		Próbaüzem	180 nap	Cs 20.03.05.	H 20.08.31.
170		**Mándok**	**248 nap**	**Sze 19.11.13.**	**P 20.10.23.**
171		**Hálózat ideiglenes helyreállítással**	**245 nap**	**H 19.11.18.**	**P 20.10.23.**
172		1-0-0 Dózsa Gy. út	39 nap	H 20.01.06.	Cs 20.02.27.
173		1-1-0 Dózsa Gy. út	6 nap	P 20.02.28.	P 20.03.06.
174		2-1-0 Nyárfás út	2 nap	H 20.03.09.	K 20.03.10.
175		2-1-1 Táncsics út	6 nap	Sze 20.03.11.	Sze 20.03.18.
176		2-1-2 Arany J. út	18 nap	Cs 20.03.19.	H 20.04.13.
177		2-3-0 Mező út	50 nap	H 19.11.18.	P 20.01.24.
178		2-1-1-1 Bem J. út	35 nap	Sze 20.03.11.	K 20.04.28.
179		3-1-0 Vasvári P. út	25 nap	Sze 20.04.29.	K 20.06.02.
180		4-0-0 Bajcsy Zs. út	34 nap	Sze 20.06.03.	H 20.07.20.
181		5-0-0 Honvéd út	25 nap	K 20.07.21.	H 20.08.24.
182		6-0-0 Ságvári út	35 nap	H 19.11.25.	P 20.01.10.
183		7-0-0 Ady E. út	7 nap	K 20.08.25.	Sze 20.09.02.
184		7-0-1 Petőfi út	22 nap	Cs 20.09.03.	P 20.10.02.
185		7-2-2 Rákóczi F. út	15 nap	H 20.10.05.	P 20.10.23.
186		**Nyomó vezeték**	**60 nap**	**H 19.11.18.**	**P 20.02.07.**
187		NY-1 Dózsa Gy.	10 nap	H 20.01.13.	P 20.01.24.
188		Ny-2 Dózsa, Arany, Táncsics, Nyárfás	60 nap	H 19.11.18.	P 20.02.07.

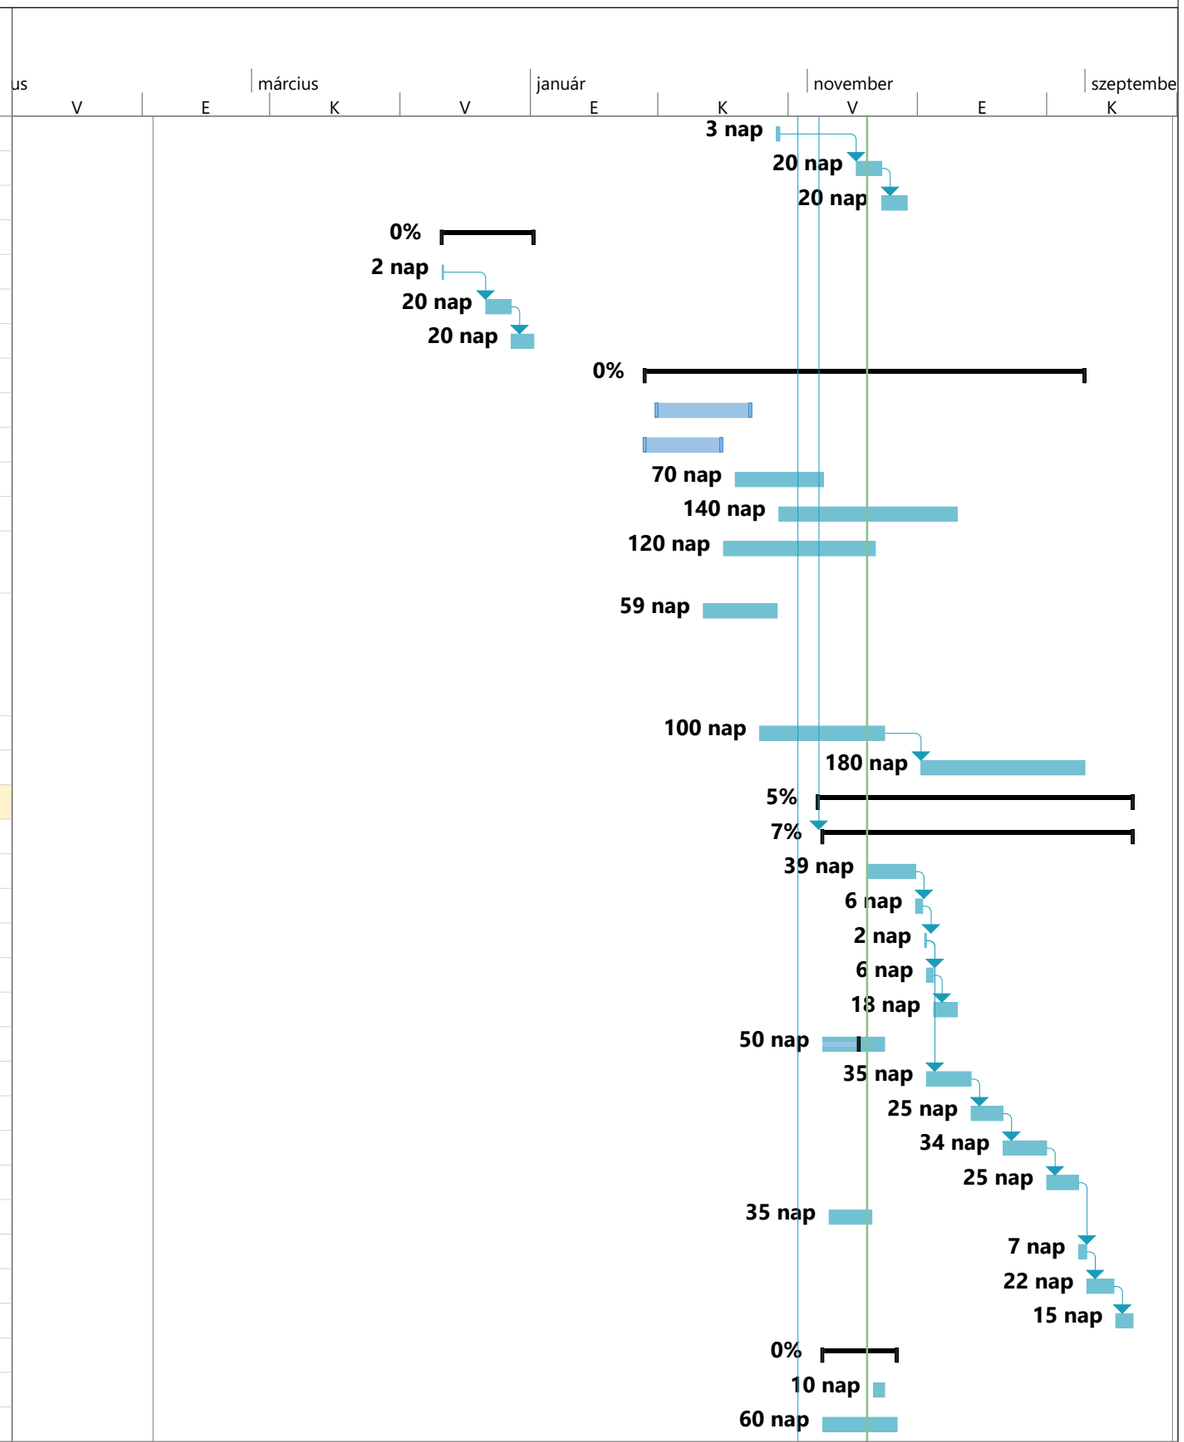

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
189		**Végleges helyreállítás**	60 nap	H 20.05.11.	P 20.07.31.
190		**Telep**	**78 nap**	**Sze 19.11.13.**	**V 20.03.01.**
191		Kivitelezési munkák	110 nap	Sze 19.11.13.	V 20.03.01.
192		**Gávavencsellő**	**621 nap**	**H 18.07.02.**	**P 20.11.13.**
193		**Hálózat ideiglenes helyreállítással**	**511 nap**	**H 18.07.02.**	**P 20.06.12.**
194		**I. ütem**	**125 nap**	**H 18.07.02.**	**H 18.12.24.**
195		M-1-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	Cs 18.07.12.	H 18.07.30.
196		M-1-1-0 Kolozsvári u.	4 nap	Cs 18.07.19.	K 18.07.24.
197		M-2-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	K 18.07.24.	Cs 18.08.09.
198		M-2-1-0 Árpád u.	6 nap	Sze 18.08.01.	Sze 18.08.08.
199		M-3-0-0 Vasút u.	10 nap	Cs 18.08.09.	Cs 18.08.23.
200		M-5-0-0 Temető u.	17 nap	Cs 18.08.30.	P 18.09.21.
201		M-5-1-0 Rakevszki u.	9 nap	P 18.08.31.	Sze 18.09.12.
202		M-6-0-0 Bem József, Kossuth Lajos u.	21 nap	H 18.10.01.	Sze 18.10.31.
203		M-6-1-0 Lehel u.	15 nap	K 18.10.02.	Sze 18.10.24.
204		M-8-0-0 József Attila, Kossuth Lajos u.	25 nap	Cs 18.11.15.	Sze 18.12.19.
205		M-8-1-0 Kossuth Lajos u.	3 nap	Cs 18.12.20.	H 18.12.24.
206		M-9-0-0 Vörösmarty Mihály u.	12 nap	K 18.07.03.	Sze 18.07.18.
207		M-9-1-0 Gorkij u.	18 nap	P 18.07.06.	K 18.07.31.
208		M-10-0-0 Jókai Mór, Akácfa u.	12 nap	H 18.07.02.	K 18.07.17.
209		M-10-1-0 Jókai Mór u.	2 nap	Cs 18.07.05.	P 18.07.06.
210		M-11-0-0 Uzsoki u.	13 nap	Cs 18.08.09.	K 18.08.28.
211		M-12-0-0 Rakevszki u., Kis köz	16 nap	Cs 18.08.23.	Cs 18.09.13.
212		M-12-1-0 Rakevszki u.	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.
213		**II. ütem**	**348 nap**	**P 19.02.15.**	**P 20.06.12.**
214		**Gravitációs vezeték**	**279 nap**	**P 19.02.15.**	**H 20.03.09.**
215		1-0-0 Vasvári Pál u.	8 nap	Cs 19.05.23.	H 19.06.03.
216		1-0-0 Halász u.	15 nap	Cs 19.05.23.	Sze 19.06.12.
217		1-1-0 Vasvári Pál u.	11 nap	Cs 19.05.09.	Cs 19.05.23.
218		1-1-0 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.
219		1-1-1 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.
220		1-1-2 Arany János u.	5 nap	Sze 19.04.17.	K 19.04.23.
221		1-2-0 Halász u.	7 nap	Cs 19.05.09.	P 19.05.17.
222		2-0-0 Rákóczi Ferenc u.	4 nap	Szo 19.05.18.	Sze 19.05.22.
223		2-0-0 Arany János u.	8 nap	Cs 19.05.23.	H 19.06.03.
224		2-1-0 Rákóczi Ferenc u.	3 nap	K 19.06.04.	Cs 19.06.06.
225		3-0-0 Fertő u.	16 nap	Sze 19.03.20.	Sze 19.04.10.
226		3-1-0 Fertő u.	3 nap	H 19.04.15.	Sze 19.04.17.
227		3-1-0 Kossuth u.	2 nap	K 19.04.23.	Cs 19.04.25.

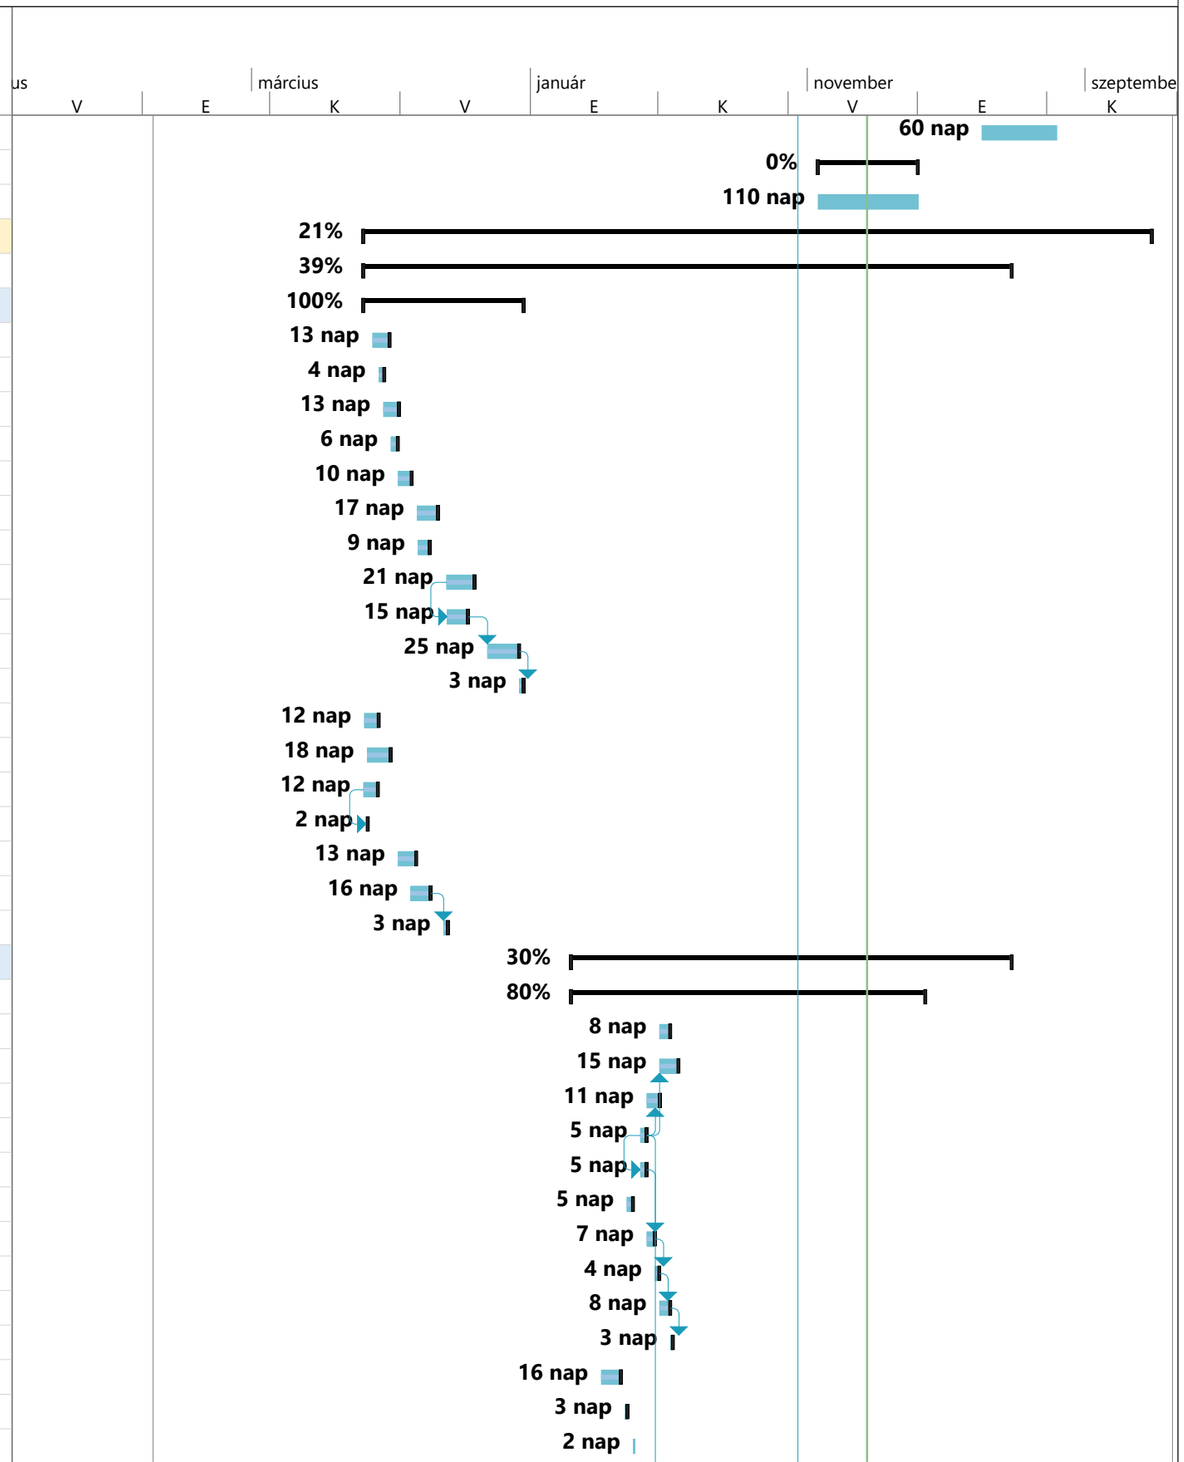

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
228		4-0-0 Kossuth u.	6 nap	K 19.03.19.	K 19.03.26.
229		4-1-0 Kossuth u.	9 nap	Sze 19.03.06.	H 19.03.18.
230		M-4-0-0 Báthori u.	1 nap	K 19.08.20.	K 19.08.20.
231		M-4-0-0 Arany János u.	18 nap	H 19.07.22.	Sze 19.08.14.
232		M-4-1-0 Báthory u.	3 nap	Cs 19.08.15.	H 19.08.19.
233		5-0-0 Bem József u.	14 nap	H 19.03.18.	Cs 19.04.04.
234		5-1-0 Bem József u.	8 nap	Cs 19.03.07.	H 19.03.18.
235		6-0-0 Major u.	3 nap	P 19.03.15.	K 19.03.19.
236		6-0-0 Lehel u.	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.
237		6-1-0 Major u.	13 nap	P 19.02.15.	K 19.03.05.
238		6-1-0 Ady Endre u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.
239		7-0-0 Tisza u.	4 nap	K 20.01.07.	P 20.01.10.
240		7-1-0 Tisza u.	3 nap	H 19.11.18.	Sze 19.11.20.
241		M-7/a-0-0 Petőfi Sándor u.	2 nap	H 20.01.20.	K 20.01.21.
242		8-0-0 Tisza u.	16 nap	H 20.01.27.	H 20.02.17.
243		8-1-0 Tisza u.	10 nap	H 20.01.13.	P 20.01.24.
244		8-2-0 Kovács Mihály u.	8 nap	H 20.01.27.	Sze 20.02.05.
245		9-0-0 Báthori u.	10 nap	H 19.08.19.	P 19.08.30.
246		9-0-0 Honvéd u.	6 nap	H 19.08.12.	H 19.08.19.
247		9-1-0 Báthori u.	4 nap	K 19.08.27.	P 19.08.30.
248		10-0-0 Báthori u.	15 nap	K 19.09.03.	H 19.09.23.
249		10-1-0 Báthori u.	13 nap	K 19.09.24.	Sze 19.10.09.
250		11-0-0 Lónyai u.	5 nap	K 20.02.18.	H 20.02.24.
251		11-1-0 Lónyai u.	1 nap	K 20.02.25.	K 20.02.25.
252		12-0-0 Móricz Zsigmond u.	9 nap	Sze 20.02.26.	H 20.03.09.
253		13-0-0 Rakovszki u.	6 nap	Cs 19.03.28.	Cs 19.04.04.
254		**Nyomó vezeték**	**272 nap**	**Sze 19.02.27.**	**K 20.03.10.**
255		NY-1	15 nap	Cs 19.05.09.	Sze 19.05.29.
256		NY-2	6 nap	Sze 19.07.03.	Sze 19.07.10.
257		NY-3	15 nap	P 19.04.05.	Cs 19.04.25.
258		NY-4	4 nap	K 19.03.19.	P 19.03.22.
259		NY-5	10 nap	H 19.03.18.	P 19.03.29.
260		NY-6	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.
261		NY-7	7 nap	Cs 20.01.02.	P 20.01.10.
262		NY-8	12 nap	H 20.01.27.	K 20.02.11.
263		NY-9	4 nap	H 19.09.02.	Cs 19.09.05.
264		NY-10	1 nap	Cs 19.10.10.	Cs 19.10.10.
265		NY-11	5 nap	K 20.02.25.	H 20.03.02.
266		NY-12	10 nap	Sze 20.02.26.	K 20.03.10.

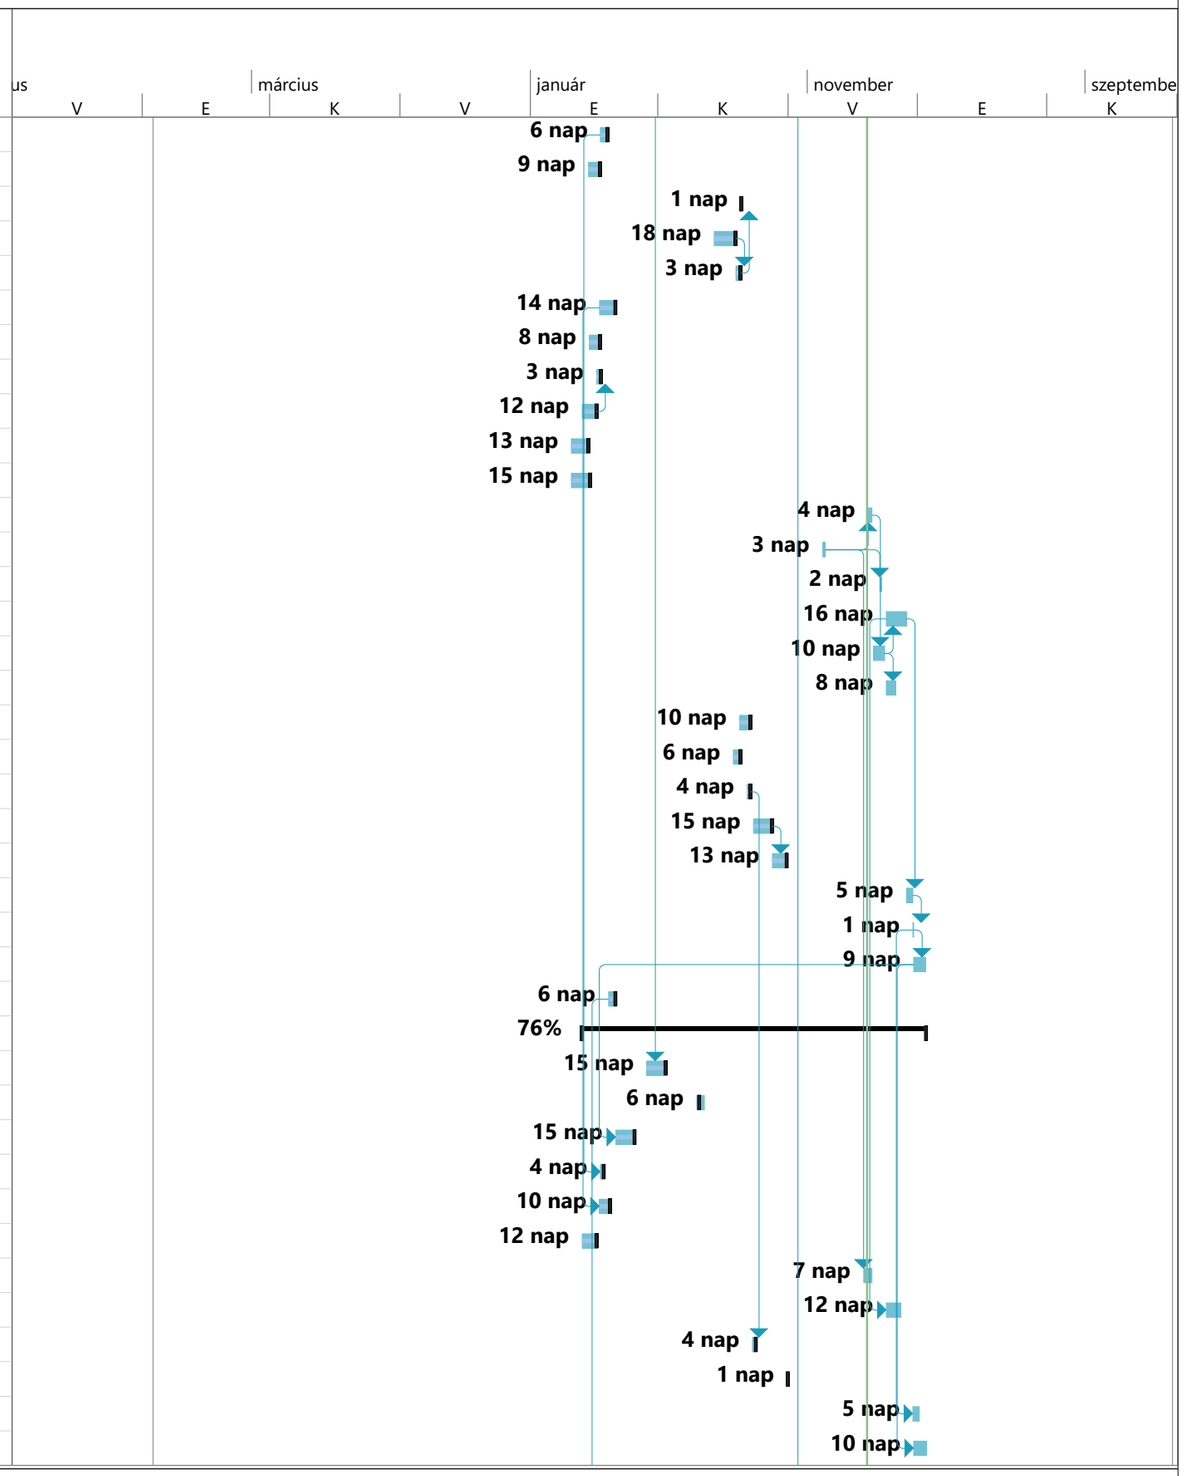

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
267		NY-13	5 nap	Cs 19.03.28.	Sze 19.04.03.
268		NYG-1	50 nap	H 19.10.14.	P 19.12.20.
269		**Átemelők**	**113 nap**	**H 19.11.18.**	**Sze 20.04.22.**
270		G1 végátemelő	60 nap	P 19.11.22.	Cs 20.02.13.
271		1. sz.	60 nap	P 19.12.20.	Cs 20.03.12.
272		2. sz.	60 nap	Sze 19.12.18.	K 20.03.10.
273		3. sz.	60 nap	H 19.12.16.	P 20.03.06.
274		4. közt. Kisátm.	60 nap	K 19.12.17.	H 20.03.09.
275		5. sz.	60 nap	H 19.11.18.	P 20.02.07.
276		6. sz.	60 nap	H 20.01.13.	P 20.04.03.
277		7. közt. Kisátm.	60 nap	Sze 20.01.15.	K 20.04.07.
278		8. sz.	60 nap	H 20.01.27.	P 20.04.17.
279		9. sz.	60 nap	Cs 19.12.05.	Sze 20.02.26.
280		10. sz.	60 nap	Sze 19.11.27.	K 20.02.18.
281		11. közt. Kisátm.	60 nap	H 20.01.20.	P 20.04.10.
282		12. közt. Kisátm.	60 nap	Cs 20.01.30.	Sze 20.04.22.
283		13. közt. Kisátm.	60 nap	K 20.01.28.	H 20.04.20.
284		**Végleges helyreállítás**	60 nap	H 20.03.23.	P 20.06.12.
285		**Telep**	**429 nap**	**Cs 19.03.28.**	**P 20.11.13.**
286		Szociális és kezelő épület építése	190 nap	Sze 19.04.03.	P 19.12.20.
287		I. Reaktor építése	162 nap	Cs 19.03.28.	H 19.12.09.
288		II. Reaktor építése	120 nap	Cs 19.06.06.	P 19.12.20.
289		Utóülepítő medence építése	130 nap	K 19.05.07.	Cs 19.10.31.
290		Fertőtlenítő medence építése	90 nap	Sze 19.05.29.	H 19.09.30.
291		Iszapstabilizáló-sűrítő építése	75 nap	Sze 19.05.29.	Sze 19.10.09.
292		Csurgalékvíz átemelő építése	20 nap	P 19.09.20.	Sze 19.10.16.
293		Tisztított szennyvíz átemelő építése	20 nap	P 19.09.20.	Sze 19.10.16.
294		**Egyéb műtárgyak építése**	**70 nap**	**Sze 19.07.17.**	**H 19.10.21.**
295		Vassó tároló, Vízmérőműtárgyak, Osztóakna 1-2, Motorostolózár akna,	70 nap	Sze 19.07.17.	H 19.10.21.
296		Udvartéri vezetékek, közművek	35 nap	H 19.10.28.	P 19.12.13.
297		Technológiai gépészeti szerelés	50 nap	H 19.12.16.	P 20.02.21.
298		Elektromos erős-gyengeáram és irányítástechnikai szerelések	40 nap	H 19.11.25.	P 20.01.17.
299		Kerítés, térburkolat építés, csapadékvíz- tereprendezés	120 nap	K 19.10.29.	H 20.04.13.
300		Üzempróbák	10 nap	H 20.02.24.	P 20.03.06.
301		Próbaüzem	180 nap	H 20.03.09.	P 20.11.13.
302		**Tiszatelek-Beszterec-Újdombrád**	**548 nap**	**P 18.11.02.**	**Sze 20.12.02.**

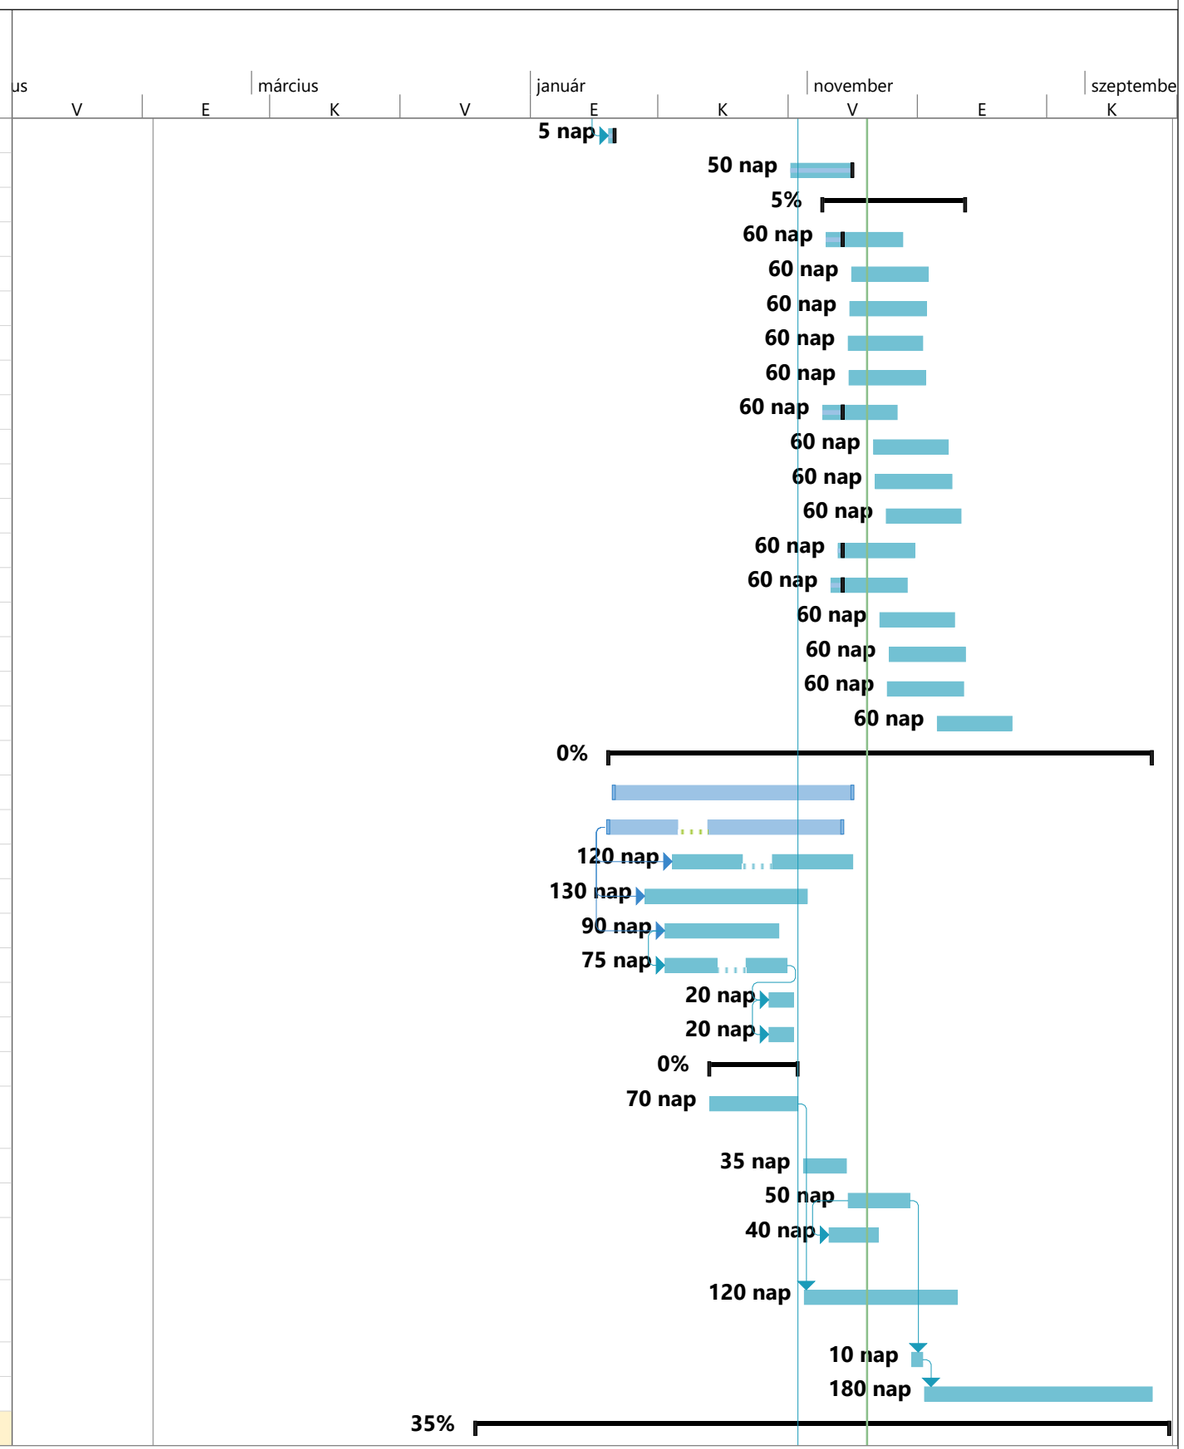

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
303		**Tiszatelek - Hálózat ideiglenes helyreállítással**	**447 nap**	**P 19.02.15.**	**Cs 20.10.29.**
304		1-0-0 Kossuth u.	20 nap	H 19.07.29.	P 19.08.23.
305		1/1-0-0 Dózsa Gy.	25 nap	H 19.07.08.	P 19.08.09.
306		2-0-0 Kossuth u.	70 nap	P 19.05.10.	Cs 19.08.15.
307		2-1-0 Kossuth, Damjanich, Petőfi u.	40 nap	K 19.05.21.	H 19.07.15.
308		2-2-0 Damjanich J. u	7 nap	H 20.02.24.	K 20.03.03.
309		2-3-0 Petőfi u.	7 nap	H 19.09.23.	H 19.09.30.
310		3-0-0 Kossuth u.	30 nap	H 19.04.22.	P 19.05.31.
311		3-1-0 Kossuth u.	87 nap	P 19.05.03.	P 19.08.30.
312		3-2-0 Szántó-K. J. u	8 nap	Sze 19.10.02.	P 19.10.11.
313		4-0-0 Tanács, Zrínyi Ilona u,	40 nap	Sze 20.02.05.	K 20.03.31.
314		4-1-0 Zrínyi Ilona u,	11 nap	K 19.11.05.	K 19.11.19.
315		4-2-0 Tanács u.	8 nap	Sze 19.11.20.	P 19.11.29.
316		5-0-0 Kossuth u.	6 nap	H 19.12.02.	H 19.12.09.
317		7-0-0 Árpád, Fürst S. út	16 nap	H 20.02.24.	H 20.03.16.
318		7-1-0 Fürst S. út	4 nap	K 20.03.17.	P 20.03.20.
319		7-2-0 József A. u.	9 nap	H 20.03.23.	Cs 20.04.02.
320		7-3-0 Iskola u	10 nap	P 20.04.03.	Cs 20.04.16.
321		8-0-0 Arany J.u	15 nap	H 20.03.16.	P 20.04.03.
322		8-1-0 Árpád, Arany J.u	11 nap	H 20.05.18.	H 20.06.01.
323		8-1-1 Árpád u.	5 nap	K 20.06.02.	H 20.06.08.
324		9-0-0 Dózsa Gy.	48 nap	Sze 19.08.21.	Cs 19.10.24.
325		9-1-0 Dózsa Gy.	36 nap	P 19.09.13.	Cs 19.10.31.
326		10-0-0 Dózsa Gy.	13 nap	Cs 19.08.08.	H 19.08.26.
327		10-1-0 Dózsa Gy.	5 nap	P 19.08.09.	Cs 19.08.15.
328		11-0-0 Esze Tamás u.	3 nap	Cs 20.02.20.	H 20.02.24.
329		11-0-0 Sallai u.	9 nap	P 19.03.08.	Sze 19.03.20.
330		11-1-0 Esze Tamás u.	274 nap	Cs 19.03.21.	H 20.05.04.
331		11-2-0 Esze Tamás u.	271 nap	H 19.03.25.	H 20.05.04.
332		12-0-0 Rákóczi u.	279 nap	H 19.03.11.	H 20.05.04.
333		13-0-0 Ady E.u.	10 nap	K 20.05.05.	H 20.05.18.
334		**Nyomó vezeték**	**311 nap**	**P 19.02.15.**	**Sze 20.04.22.**
335		NY-1	1 nap	H 20.03.02.	H 20.03.02.
336		NY-1/1	34 nap	Sze 19.07.10.	K 19.10.08.
337		NY-2	82 nap	H 19.05.20.	K 19.09.10.
338		NY-3	239 nap	Cs 19.04.04.	H 20.03.02.
339		NY-4	30 nap	Cs 19.10.17.	Sze 19.11.27.
340		NY-5	1 nap	P 20.03.20.	P 20.03.20.
341		NY-6	3 nap	H 20.04.20.	Sze 20.04.22.

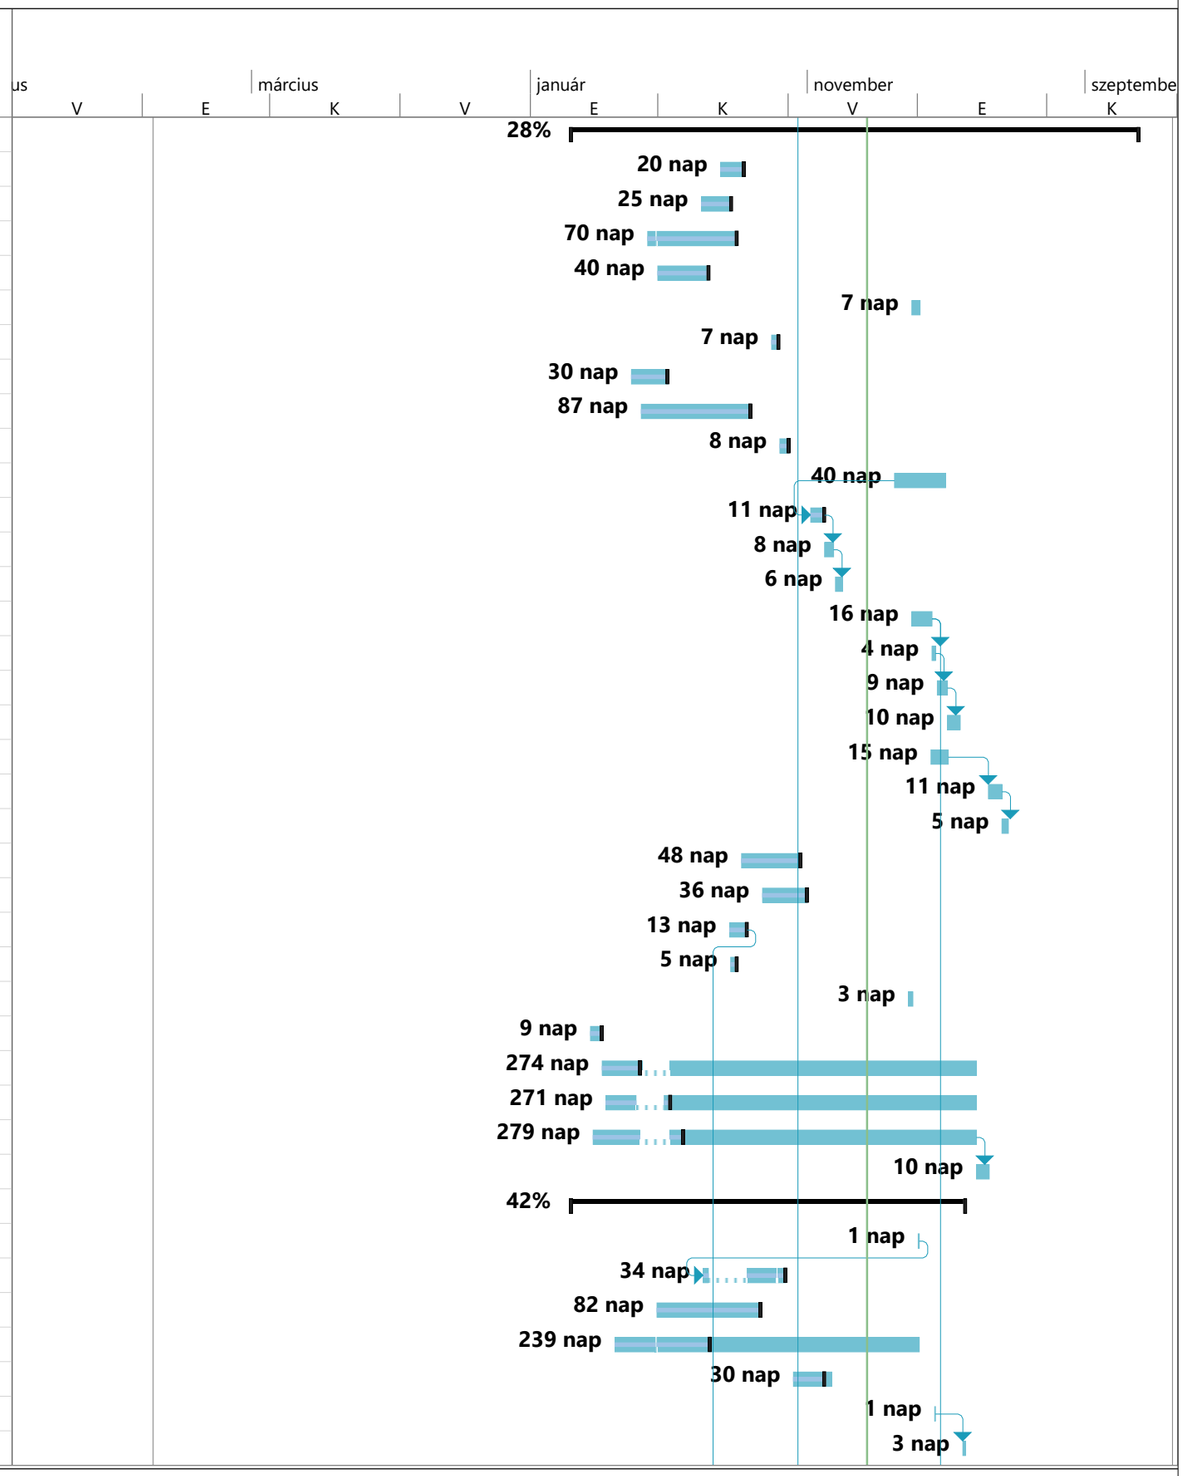

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
342		NY-7	18 nap	K 20.03.17.	Cs 20.04.09.
343		NY-8	18 nap	H 19.11.04.	Sze 19.11.27.
344		NY-9	270 nap	P 19.02.15.	Sze 20.02.26.
345		NY-10	150 nap	Cs 19.08.08.	P 20.03.20.
346		NY-11	2 nap	H 19.11.11.	K 19.11.12.
347		NY-12	1 nap	Sze 19.11.13.	Sze 19.11.13.
348		NY-13	1 nap	Cs 19.11.14.	Cs 19.11.14.
349		**Végleges helyreállítás**	50 nap	Sze 20.04.01.	K 20.06.09.
350		**Átemelő aknák**	**330 nap**	**H 19.07.29.**	**Cs 20.10.29.**
351		**Á-1**	80 nap	Sze 19.08.07.	H 19.11.25.
352		**Á-2**	80 nap	H 19.07.29.	Cs 19.11.14.
353		**Á-3**	80 nap	H 19.08.05.	Cs 19.11.21.
354		**Á-4**	117 nap	H 19.09.02.	H 20.02.10.
355		**Á-5**	111 nap	K 19.09.10.	H 20.02.10.
356		**Á-6**	10 nap	H 20.06.01.	P 20.06.12.
357		**Á-7**	115 nap	Sze 19.09.04.	H 20.02.10.
358		**Á-8**	114 nap	Cs 19.09.05.	H 20.02.10.
359		**Á-9**	80 nap	H 20.02.03.	P 20.05.22.
360		**Á-10**	112 nap	H 19.09.09.	H 20.02.10.
361		**Á-11**	80 nap	P 19.11.29.	Cs 20.03.19.
362		**Á-12**	80 nap	P 20.03.20.	Cs 20.07.09.
363		**Á-13**	80 nap	P 20.07.10.	Cs 20.10.29.
364		**Beszterec - Hálózat ideiglenes helyreállítással**	**376 nap**	**P 18.11.30.**	**K 20.05.05.**
365		**Gravitációs vezeték**	**173 nap**	**P 18.11.30.**	**P 19.07.26.**
366		1-0-0 Kossuth u.	63 nap	Cs 19.05.02.	P 19.07.26.
367		1-1-0 Árpád u.	30 nap	H 19.04.01.	P 19.05.10.
368		1-2-0 Arany J.u	31 nap	H 19.02.11.	H 19.03.25.
369		1-3-0 Kossuth u.	2 nap	Cs 19.06.20.	P 19.06.21.
370		2-0-0 Petőfi S.	63 nap	Cs 19.05.02.	P 19.07.26.
371		2-1-0 József A.u	54 nap	H 18.12.03.	Cs 19.02.14.
372		2-1-1 Dózsa Gy.u	46 nap	H 18.12.03.	H 19.02.04.
373		2-1-1-1 Új u.	5 nap	P 18.11.30.	Cs 18.12.06.
374		2-2-0 Petőfi S. u	27 nap	Sze 19.04.03.	Cs 19.05.09.
375		~~2-3-0 910 hrsz~~	~~3 nap~~	~~Cs 19.06.06.~~	~~H 19.06.10.~~
376		2-4-0 Petőfi S.u	2 nap	H 19.05.20.	K 19.05.21.
377		2-4-0 366 hrsz	4 nap	P 19.05.17.	K 19.05.21.
378		3-0-0 Táncsics M. u.	41 nap	Szo 18.12.15.	P 19.02.08.
379		3-1-0 Széchenyi u.	8 nap	Sze 19.02.06.	P 19.02.15.
380		4-0-0 Kossuth u.	19 nap	H 19.06.17.	Cs 19.07.11.

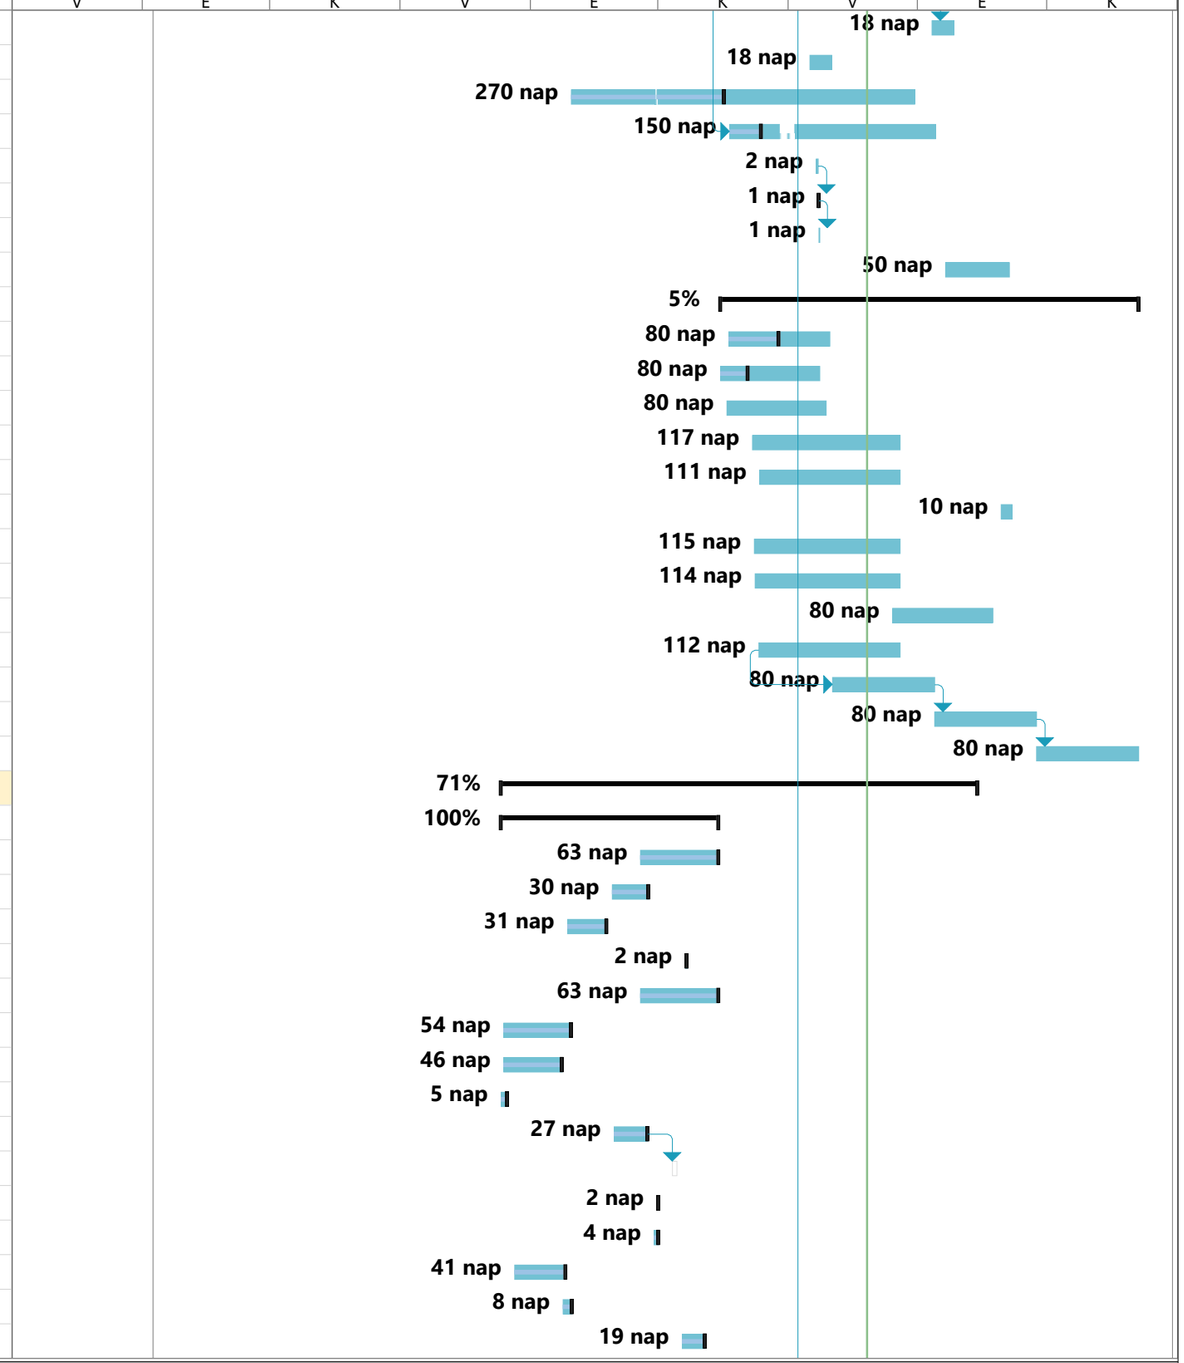

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
381		4-1-0 Kossuth u.	28 nap	K 19.05.21.	Cs 19.06.27.
382		**Nyomó vezeték**	**167 nap**	**P 18.12.14.**	**Cs 19.08.01.**
383		**NY-1**	58 nap	H 19.04.29.	Sze 19.07.17.
384		**NY-2**	60 nap	Cs 19.01.17.	Sze 19.04.10.
385		**NY-3**	98 nap	P 18.12.14.	H 19.04.29.
386		**NY-4**	30 nap	P 19.06.21.	Cs 19.08.01.
387		**Végleges helyreállítás**	30 nap	Sze 20.03.25.	K 20.05.05.
388		**Átemelő aknák**	**210 nap**	**H 19.07.08.**	**Cs 20.04.23.**
389		**Á-1**	**150 nap**	**H 19.07.08.**	**Cs 20.01.30.**
390		Építészeti munkák	20 nap	H 19.07.08.	P 19.08.02.
391		Gépészeti munkák	20 nap	P 19.12.06.	Cs 20.01.02.
392		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.01.03.	Cs 20.01.30.
393		**Á-2**	**166 nap**	**P 19.07.12.**	**Cs 20.02.27.**
394		Építészeti munkák	20 nap	P 19.07.12.	Cs 19.08.08.
395		Gépészeti munkák	20 nap	P 20.01.03.	Cs 20.01.30.
396		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.01.31.	Cs 20.02.27.
397		**Á-3**	**183 nap**	**Sze 19.07.17.**	**Cs 20.03.26.**
398		Építészeti munkák	20 nap	Sze 19.07.17.	K 19.08.13.
399		Gépészeti munkák	20 nap	P 20.01.31.	Cs 20.02.27.
400		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.02.28.	Cs 20.03.26.
401		**Á-4**	**204 nap**	**K 19.07.16.**	**Cs 20.04.23.**
402		Építészeti munkák	20 nap	K 19.07.16.	H 19.08.12.
403		Gépészeti munkák	20 nap	P 20.02.28.	Cs 20.03.26.
404		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.03.27.	Cs 20.04.23.
405		**Újdombrád - Hálózat ideiglenes helyreállítással**	**394 nap**	**P 18.11.02.**	**Cs 20.04.30.**
406		**Gravitációs vezeték**	**391 nap**	**P 18.11.02.**	**H 20.04.27.**
407		1-0-0 Fő u.	6 nap	H 20.03.16.	H 20.03.23.
408		1-0-0 József A.u	79 nap	H 18.11.26.	Cs 19.03.14.
409		1-1-0 Virág u.	18 nap	P 18.11.02.	K 18.11.27.
410		1-1-0 336 sz u	7 nap	H 18.11.19.	K 18.11.27.
411		1-2-0 Szabadság u.	9 nap	K 18.12.11.	Cs 18.12.20.
412		2-0-0 Szabadság u.	250 nap	Sze 19.04.17.	P 20.03.27.
413		2-0-0 Templom u.	25 nap	H 19.02.11.	P 19.03.15.
414		2-0-0 Iskola u.	2 nap	P 19.02.22.	H 19.02.25.
415		2-1-0 Szabadság u.	6 nap	K 19.02.12.	K 19.02.19.
416		2-2-0 Templom u	28 nap	K 19.01.08.	Cs 19.02.14.
417		2-3-0 Iskola u.	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.
418		2-3-0 Napsugár u	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.
419		2-4-0 Templom u	4 nap	K 19.02.05.	P 19.02.08.

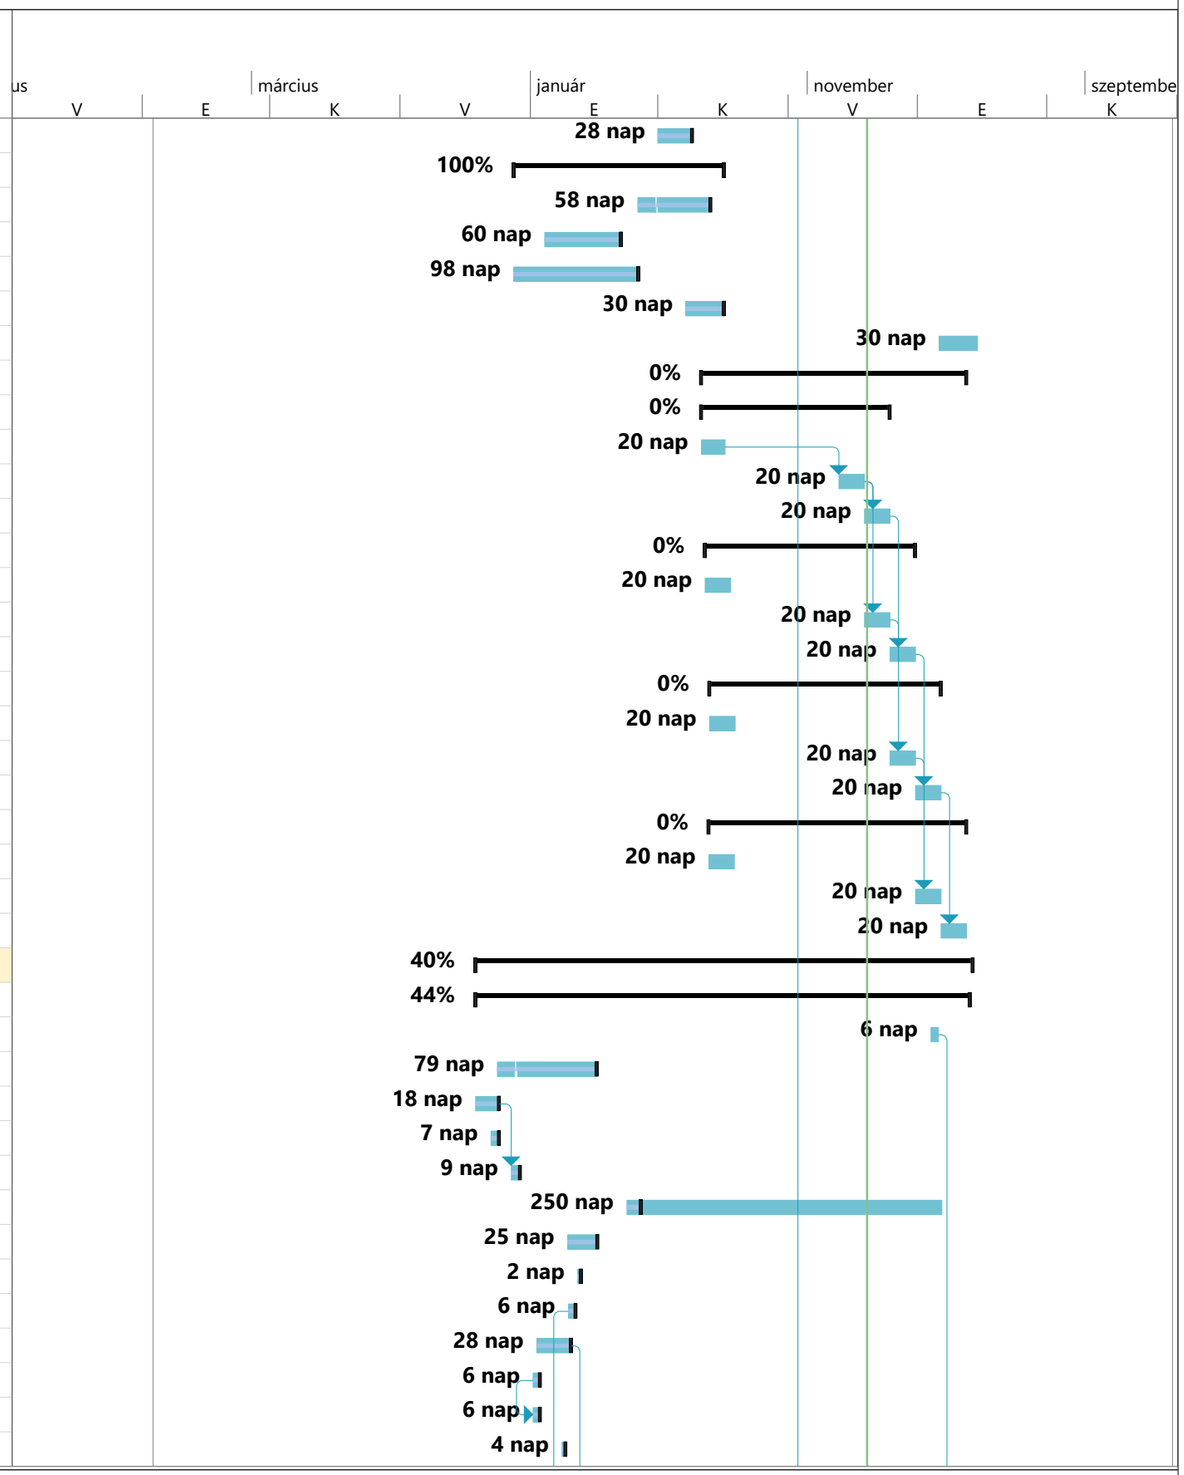

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
420		2-4-0 Fő u.	21 nap	K 20.03.24.	K 20.04.21.
421		2-4-1 Dobi u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.
422		2-4-2 Fő u.	2 nap	K 20.03.24.	Sze 20.03.25.
423		2-5-0 Szabadság u.	5 nap	H 19.02.18.	P 19.02.22.
424		2-5-0 Fő u.	25 nap	K 20.03.24.	H 20.04.27.
425		2-5-1 Fő u.	7 nap	K 20.03.24.	Sze 20.04.01.
426		2-5-2 Iskola u.	10 nap	P 19.03.01.	Cs 19.03.14.
427		**Nyomó vezeték**	**66 nap**	**Cs 18.12.13.**	**Sze 19.03.13.**
428		**NY-1**	50 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.02.20.
429		**NY-2**	20 nap	Cs 19.02.14.	Sze 19.03.13.
430		**Végleges helyreállítás**	30 nap	P 20.03.20.	Cs 20.04.30.
431		**Átemelő**	**163 nap**	**K 19.07.23.**	**Sze 20.03.04.**
432		**Á-1**	**140 nap**	**P 19.07.26.**	**Sze 20.02.05.**
433		Építészeti munkák	20 nap	P 19.07.26.	Cs 19.08.22.
434		Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.12.12.	Sze 20.01.08.
435		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 20.01.09.	Sze 20.02.05.
436		**Á-1**	**163 nap**	**K 19.07.23.**	**Sze 20.03.04.**
437		Építészeti munkák	20 nap	K 19.07.23.	H 19.08.19.
438		Gépészeti munkák	20 nap	Cs 20.01.09.	Sze 20.02.05.
439		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 20.02.06.	Sze 20.03.04.
440		Telep	**469 nap**	**K 19.02.19.**	**Sze 20.12.02.**
441		Kivitelezési munkák	226 nap	K 19.02.19.	P 20.06.05.
442		Próbaüzem	180 nap	Szo 20.06.06.	Sze 20.12.02.
443		**Cigánd-Tiszakarád**	**229 nap**	**K 19.10.22.**	**Szo 20.09.05.**
444		Telep	**229 nap**	**K 19.10.22.**	**Szo 20.09.05.**
445		Kivitelezési munkák	100 nap	K 19.10.22.	H 20.03.09.
446		Próbaüzem	180 nap	K 20.03.10.	Szo 20.09.05.
447		**Projekt zárása**	28 nap	Cs 20.10.29.	Szo 20.12.05.

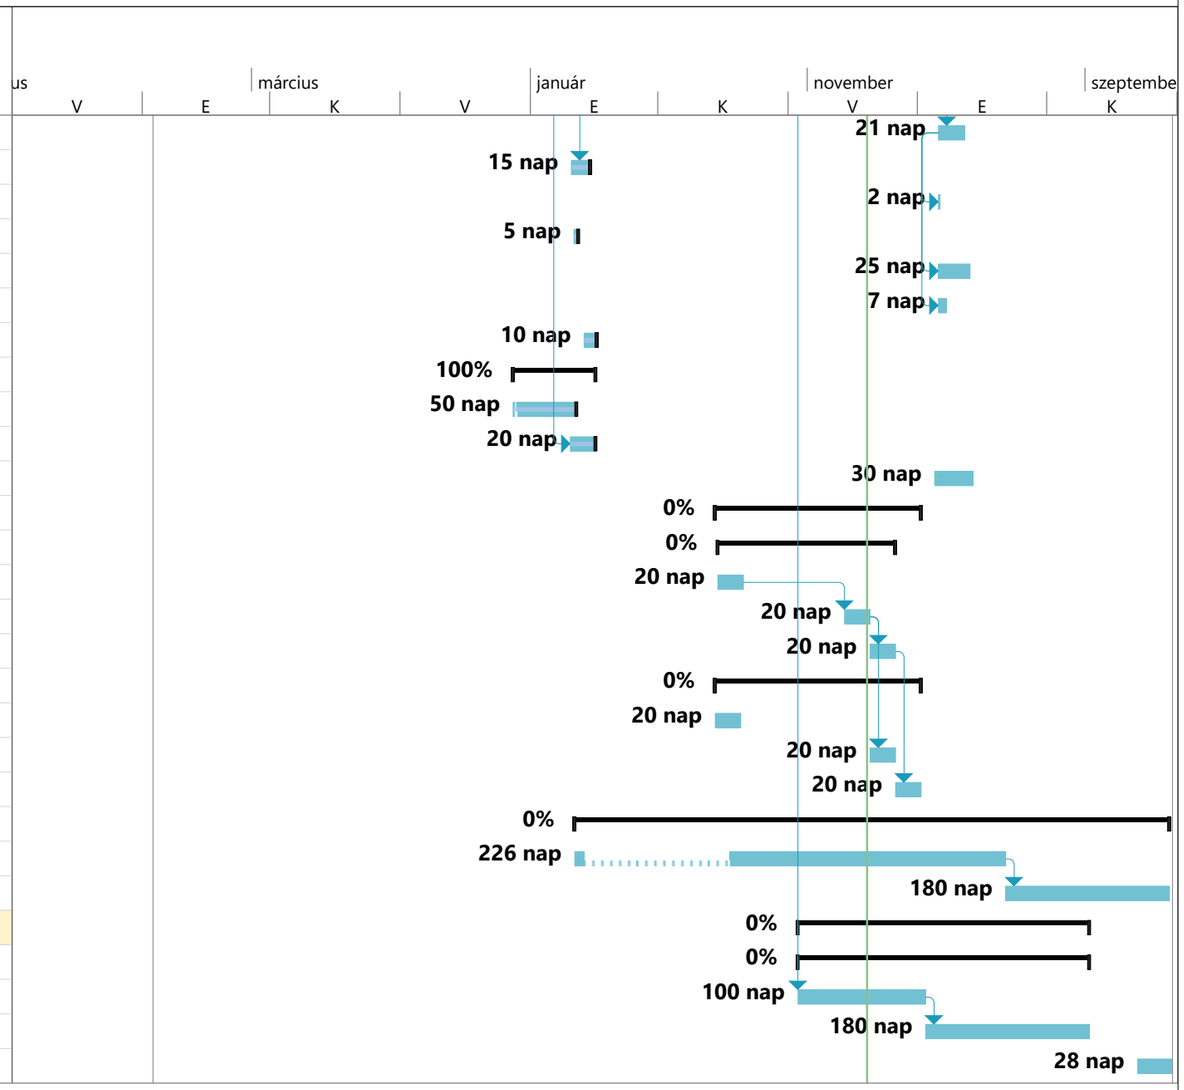

VÁLLALKOZÓ	VEZETŐ MŰSZAKI ELLENŐR	MÉRNÖK
